

Guaymas – Esperanza – Yécora - Chihuahua



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance 2025

Avance Programado: 100.0 %

Avance Real: 78.0 %

Avance Financiero: 50.80 %



Inversión total: 10,228 mdp

- Sonora: 5,935 mdp
- Chihuahua: 4,293 mdp

Meta total: 450 km

- Sonora: 252 km, 4 puentes
- Chihuahua: 198 km



Inversión 2026: 1,491 mdp

- Sonora: 1,491 mdp

Meta 2026: 44 km.

- Sonora: 44 km



Inversión 2025: 450 mdp

- Sonora: 450 mdp

Meta 2025: 10 km.

- Sonora: 10 km



Inicio : 20 de octubre de 2025

Termino: 28 de febrero de 2026

Término meta 2025: 28 de febrero de 2026



669,912 habitantes beneficiados



30,684 empleos generados




Guaymas – Esperanza – Yécora - Chihuahua

Km 17+300 al Km 32+300

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	23-01-26 al 29-01-26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Trabajos preliminares (km)	9.97	9.97	-	-	-	-
Terracerías (km)	9.97	9.97	-	-	-	-
Obras de drenaje (Pza)	23	23	-	-	-	-
Pavimento (km)	9.97	5.10	4.87	0.67	0.0	-
Señalamiento (km)	9.97	-	9.97	-	-	-
Construcción Puente I (Canal alto)	100%	42.86%	57.14%	-	-	-
Construcción Puente II (Agua Caliente)	100%	57.14%	42.86%	25%	7.14%	-
Construcción Puente III (Chinitos I)	100%	42.86%	57.14%	20%	7.15%	-
Construcción Puente IV (Chinitos II)	100%	42.86%	57.14%	20%	14.29%	-

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

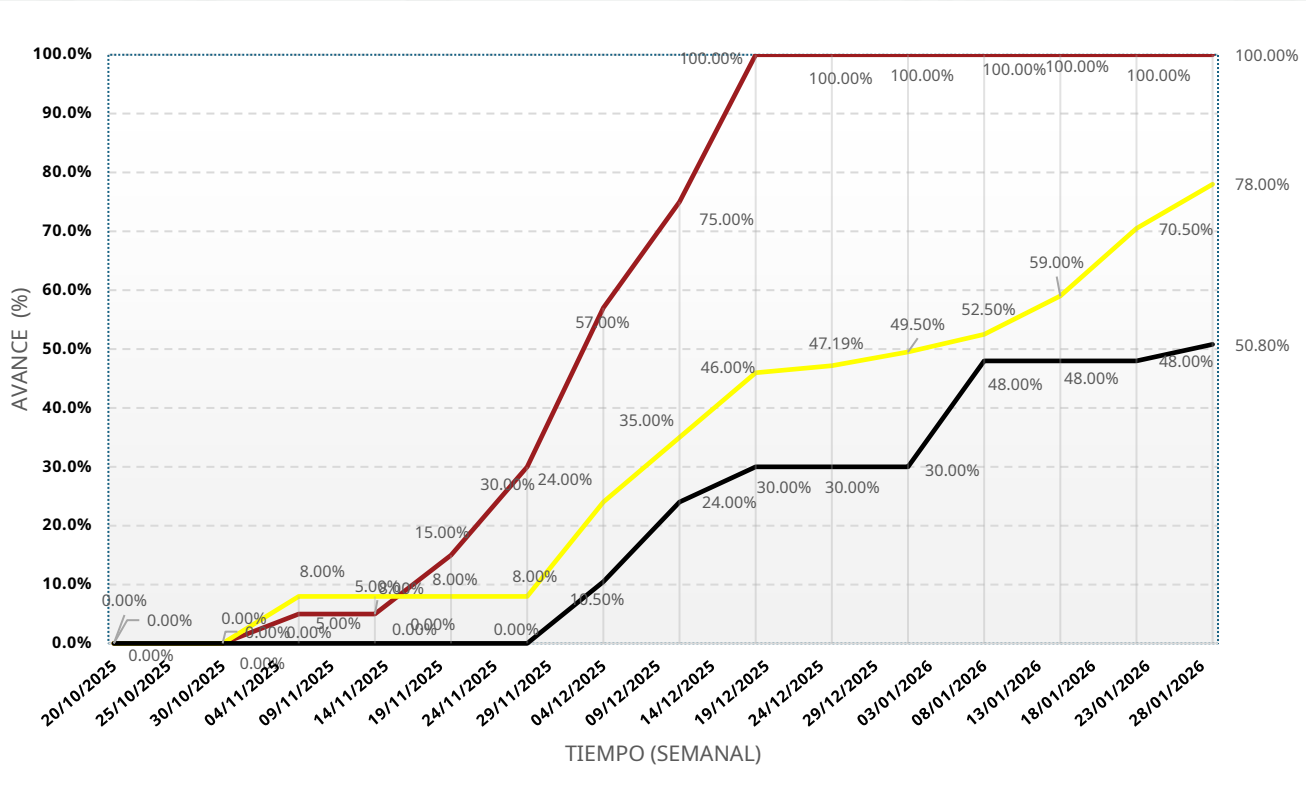

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	16 de enero al 22 de enero 2026	23 de enero al 29 de enero 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	328	328
Maquinaria	110	110
Frentes de trabajo	10	10
