

# Guaymas – Esperanza – Yécora - Chihuahua



**Comunicaciones**

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

## Avance 2025

Avance Programado: 100.00 %

Avance Real: 86.80 %

Avance Financiero: 50.80 %



**Inversión total:** 10,228 mdp

- Sonora: 5,935 mdp
- Chihuahua: 4,293 mdp

**Meta total:** 450 km

- Sonora: 252 km, 4 puentes
- Chihuahua: 198 km



**Inversión 2025:** 450 mdp

- Sonora: 450 mdp
- Meta 2025:** 10 km.
- Sonora: 10 km



**Inversión 2026:** 4,000 mdp

- Sonora: 4,000 mdp
- Meta 2026:** 95 km.
- Sonora: 95 km



**Inicio :** 20 de octubre de 2025

**Termino:** 28 de febrero de 2026

**Término meta 2025:** 28 de febrero de 2026



**30,684** empleos generados



**669,912** habitantes beneficiados

## Beneficios:


- Derrama económica regional.
- Fortalecimiento de exportaciones.
- Impulso al crecimiento turístico.
- Mejora en los puntos de salida para la producción agropecuaria, manufacturera e industrial.



# Guaymas – Esperanza – Yécora - Chihuahua

## Km 17+300 al Km 32+300

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	12-02-26 al 19-02-26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Trabajos preliminares (km)	9.97	9.97	-	-	-	-
Terracerías (km)	9.97	9.97	-	-	-	-
Obras de drenaje (Pza)	23	23	-	-	-	-
Pavimento (km)	9.97	6.69	3.29	1.05	1.05	-
Señalamiento (km)	9.97	-	9.97	-	-	-
Construcción Puente I (Canal alto)	100%	42.86%	57.14%	0.00%	0.00%	-
Construcción Puente II (Agua Caliente)	100%	71.43%	28.57%	33.33%	1.6%	-
Construcción Puente III (Chinitos I)	100%	80.30%	19.70%	31.05%	8.87%	-
Construcción Puente IV (Chinitos II)	100%	71.43%	28.57%	33.33%	33.33%	-

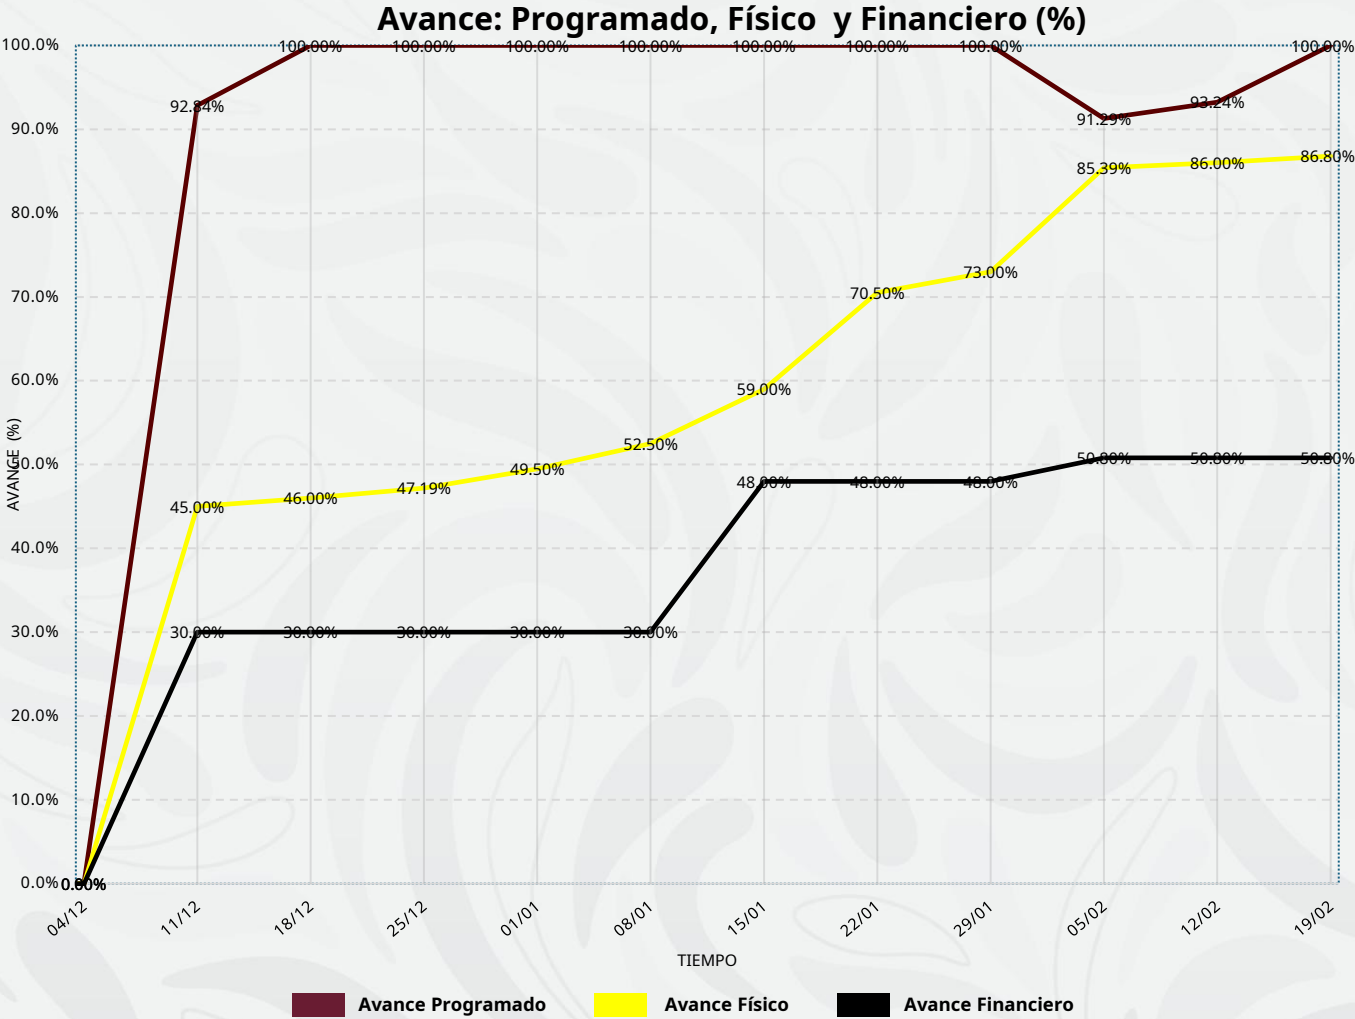

	06 de febrero al 12 de febrero 2026	13 de febrero al 19 de febrero 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	364	364
Maquinaria	110	110
Frentes de trabajo	14	14
