

San Luis Potosí - Hidalgo

Tamazunchale – Huejutla – Pachuca


Avance global

- Programado: 31.25%
- Real: 27.01%
- Semanal: 0.50%
- Financiero: 19.50%

Avance 2025

- Programado: 100%
- Real: 86.42%
- Semanal: 1.60%
- Financiero: 53.28%

Se omitieron 2 puentes en el año 2025 derivado a que no se realizaría ampliación en ese subtramo por problemática social: **Puente "Huitzquililitla" km 3+705 y Puente "La Ceiba" km 10+640**

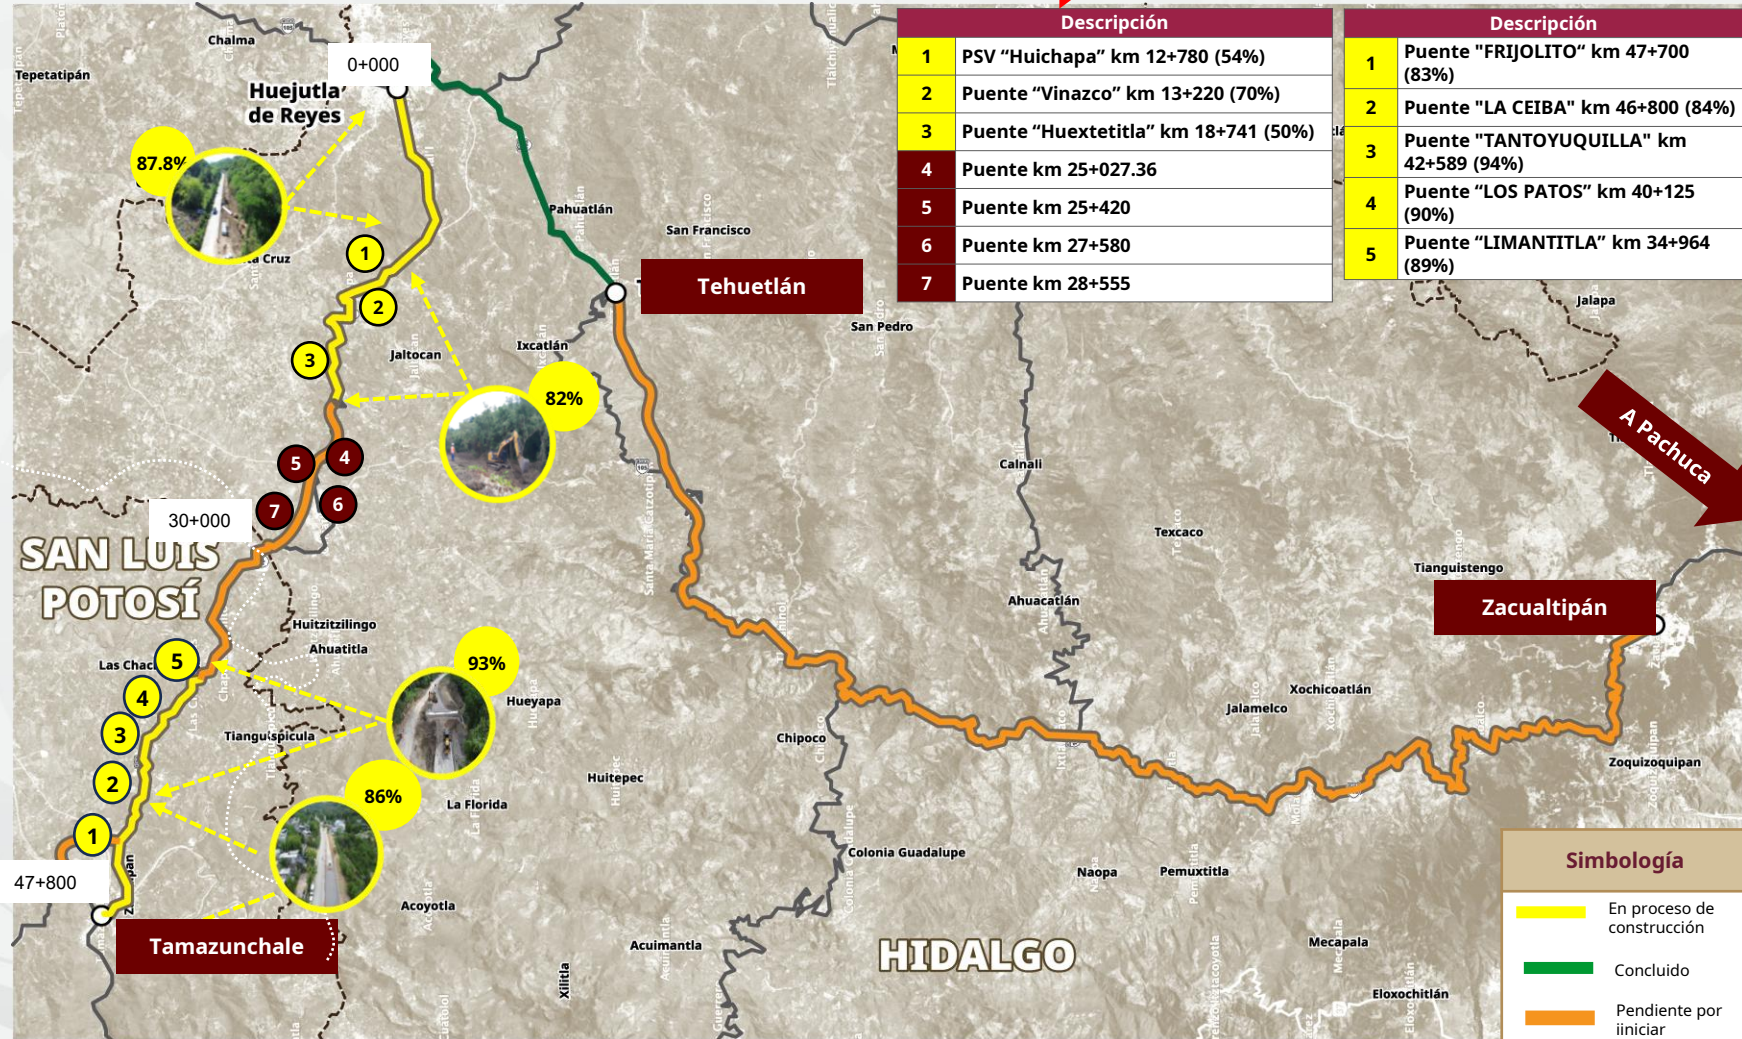

Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Inversión total 2025-2028: 6,675 mdp

- Hidalgo: 3,779 mdp
- SLP: 2,896 mdp

Meta total 2025-2028: 96 km

Hidalgo:

- Ampliación de 30 km A2
- Construcción de 3er carril en 39 km
- Construcción de 7 puentes

San Luis Potosí:

- Ampliación de 17 km A2
- Construcción de 10 km C2
- Construcción de 5 puentes

Por lo que rehabilitación una meta total

Inversión 2026: 1,879 mdp

- Hidalgo: 1,250 mdp
- San Luis Potosí: 629 mdp

Meta 2026: 31 km y 7 puentes

- Hidalgo: 24 km y 4 puentes
- San Luis Potosí: 7 km A2 y 3 puentes

• 10 km Hu
• 14 km T
14+000;
correspo
una reha

Inicio : 28 de abril 2025
Termino: diciembre 2028
Término meta 2025: diciembre 2025

20,025 empleos generados

+395 mil habitantes beneficiados

65 min de ahorro en tiempo

Tramo	Empresas
km 0+000 al km 10+000	<ul style="list-style-type: none"> Contratista: IMAGEN CORPORATIVA ATLANTA, S.A. DE C.V. E INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO INTEGRAL DICSSA, S.A. DE C.V. Supervisión: CONSTRUCTORA SOCOE, S.A. DE C.V.
km 10+000 al km 20+000	<ul style="list-style-type: none"> Contratista: SÁNCHEZ VALDEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. Supervisión: P.A.C.C.S.A. INGENIERÍA, S.A. DE C.V.
km 42+800 al km 38+820 y del km 35+160 al km 34+140	<ul style="list-style-type: none"> Contratista: Sánchez Valdez Construcciones, S.A. de C.V. Supervisión: Servicios de Consultoría en Infraestructura Vial, S.A. de C.V.
km 47+800 al km 42+800	<ul style="list-style-type: none"> Contratista: Convenio Privado de Proposición Conjunta entre la Persona Moral The Fuentes Corporation Mexican Filial, S.A. de C.V. y Constructora Gervisur, S.A. de C.V. Supervisión: Constructora Empresarial MEF, S.A. de C.V.

San Luis Potosí
Tamazunchale – Huejutla


San Luis Potosí

ACTUALIZADA



Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Tamazunchale - Huejutla

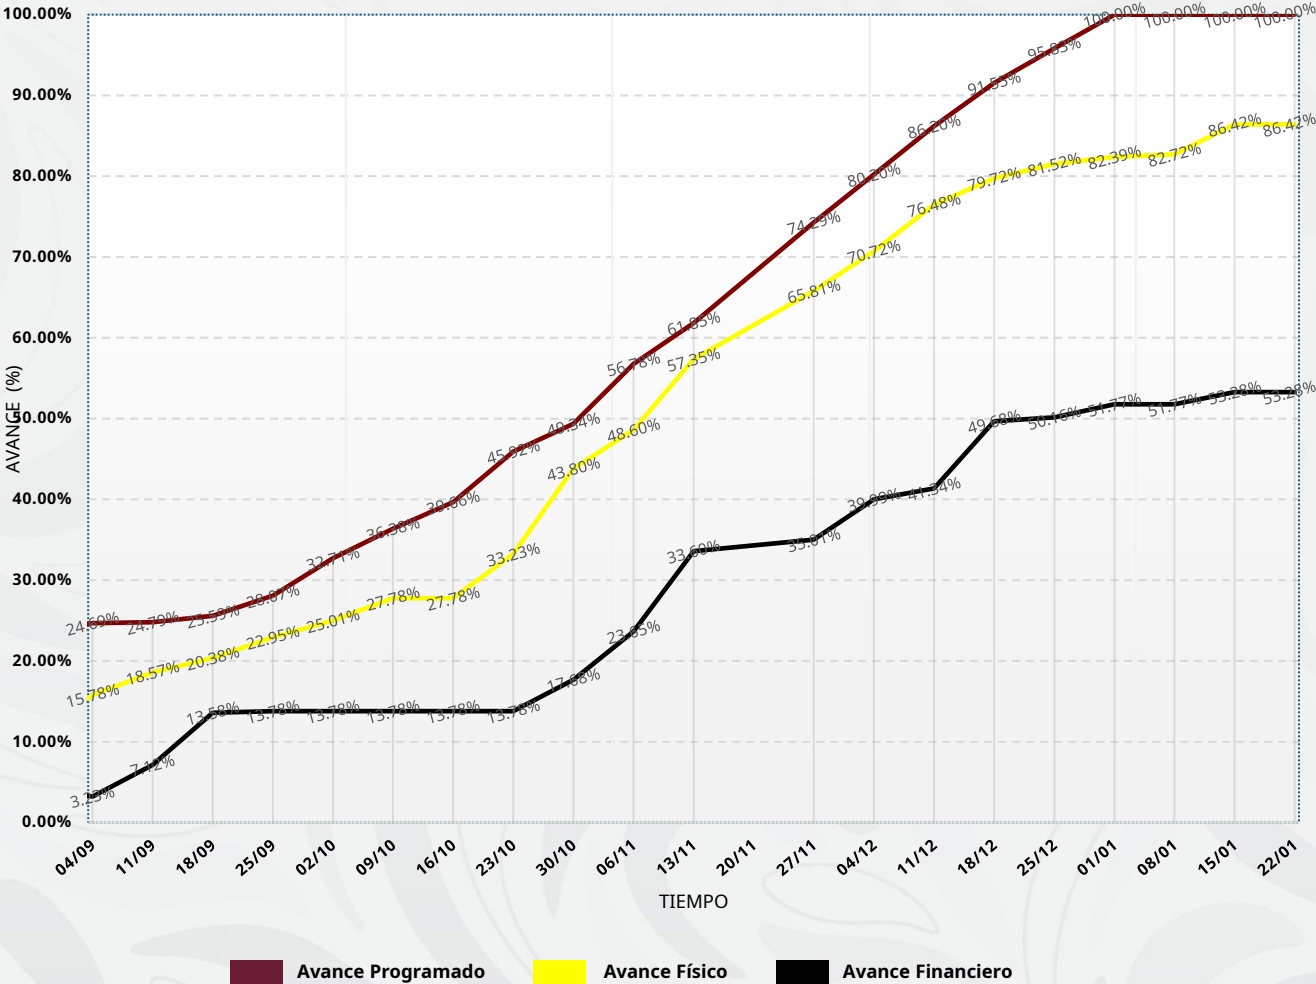

	09 de enero al 15 de enero	16 de enero al 22 de enero
Fuerza de Trabajo (personas)	473	430
Maquinaria	199	192
Frentes	40	40

Elemento	Unidad	Meta	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 16/01/2026 al 22/01/2026		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
TERRACERÍAS								
Despalme	m³	31,718.00	31,718.0	100.00%	0.00	0.0	0.0	Trabajos concluidos
Cortes	m³	249,345.00	247,850.0	99.40%	1,495.00	1,495	2,850.0	
Terraplenes 90%	m³	127,937.00	126,780.0	99.10%	1,157.00	1,157	8,780.0	
Subyacente	m³	31,983.00	28,970.0	90.58%	3,013.00	3,013	0.0	
Subrasante	m³	13,572.00	11,580.0	85.32%	1,992.00	1,992	0.0	
OBRAS DE DRENAJE								
Obras de drenaje Tubería	pza.	11	11	100.00%	0	0	0.0	Trabajos concluidos
Obras de drenaje losa	pza.	2	2	100.00%	0	1	1.0	Trabajos concluidos
Obras de drenaje bóveda	pza.	2	2	100.00%	0	1	1.0	Trabajos concluidos
PAVIMENTOS								
Base hidráulica	m³	14,685.00	10,517.0	71.62%	4,168.00	4,168	152.0	
Base asfáltica	m³	8,667.00	6,173.0	71.22%	2,494.00	2,494	1,673.0	
Carpeta asfáltica	m³	5,616.00	0	0.00%	5,616.00	5,616	0.0	
SEÑALAMIENTO								
Señalamiento definitivo	km	5	0	0.00%	5	5.0	0.0	

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 16/01/2026 al 22/01/2026		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
TERRACERÍAS								
Despalme	m³	26,738	25,950.0	97.05%	788.00	788.00	0.0	Trabajos del km 42+800 al km 43+000 y del km 44+900 al km 45+020
Cortes	m³	189,998.00	189,400.00	99.69%	598.00	598.00	0.0	Trabajos del km 44+900 al km 44+980
Terraplenes 90%	m³	24,931.00	24,600.00	98.67%	331.00	331.00	0.0	Trabajos del km 43+600 al km 43+660
Subyacente	m³	38,781.00	38,250.00	98.63%	531.00	531.00	0.0	Trabajos del km 42+800 al km 47+800
Subrasante	m³	19,107.00	18,713.00	97.94%	394.00	594.00	200.0	Trabajos del km 42+800 al km 47+800
OBRAS DE DRENAJE								
Obras de drenaje Tubería	pza.	10	10	100.0%	0	0	0.0	
Obras de drenaje losa	pza.	2	2	100.0%	0	0	0.0	
Obras de drenaje bóveda	pza.	2	1	50.0%	1	1	0.0	
PAVIMENTOS								
Base hidráulica	m³	14,718.00	13,893.00	94.4%	825.00	1,425	600.0	km 42+800 al km 44+890 del km 45+060 al km 47+800
Base asfáltica	m³	8,667.00	6,650.00	76.7%	2,017.00	3,117	1,100.0	
Carpeta asfáltica	m³	5,616.00	0	0.0%	5,616.00	5,616	0.0	Partida aún no iniciada
SEÑALAMIENTO								
Señalamiento definitivo	km	5	3.6	72.0%	1.40	0.80	0.2	
