

San Luis Potosí - Hidalgo

Tamazunchale – Huejutla – Pachuca

Avance global

• Programado: 31.25%

• Semanal: 0.66%

• Real: 26.51%

• Financiero: 19.29%

Avance 2025

• Programado: 100%

• Semanal: 2.10%

• Real: 84.82%

• Financiero: 52.71%



Inversión total 2025-2028: 6,674 mdp


- Hidalgo: 3,742 mdp

- SLP: 2,932 mdp

Inversión 2025: 1654 mdp

Hidalgo: / 20.0 km y 5 puentes,

San Luis Potosí: / 10.0 km y 5 puentes



Meta total 2025-2028: 96 km

Hidalgo:

• Ampliación de 30 km A2

• Construcción de 3er carril en 39 km


• Construcción de 9 puentes

San Luis Potosí:

• Ampliación de 17 km A2

• Construcción de 10 km C2

• Construcción de 5 puentes




Inicio : 28 de abril 2025


Termino: diciembre 2028

Término meta 2025: 28 de febrero de 2026


20,022 empleos generados



+395 mil habitantes beneficiados



65 min de ahorro en tiempo

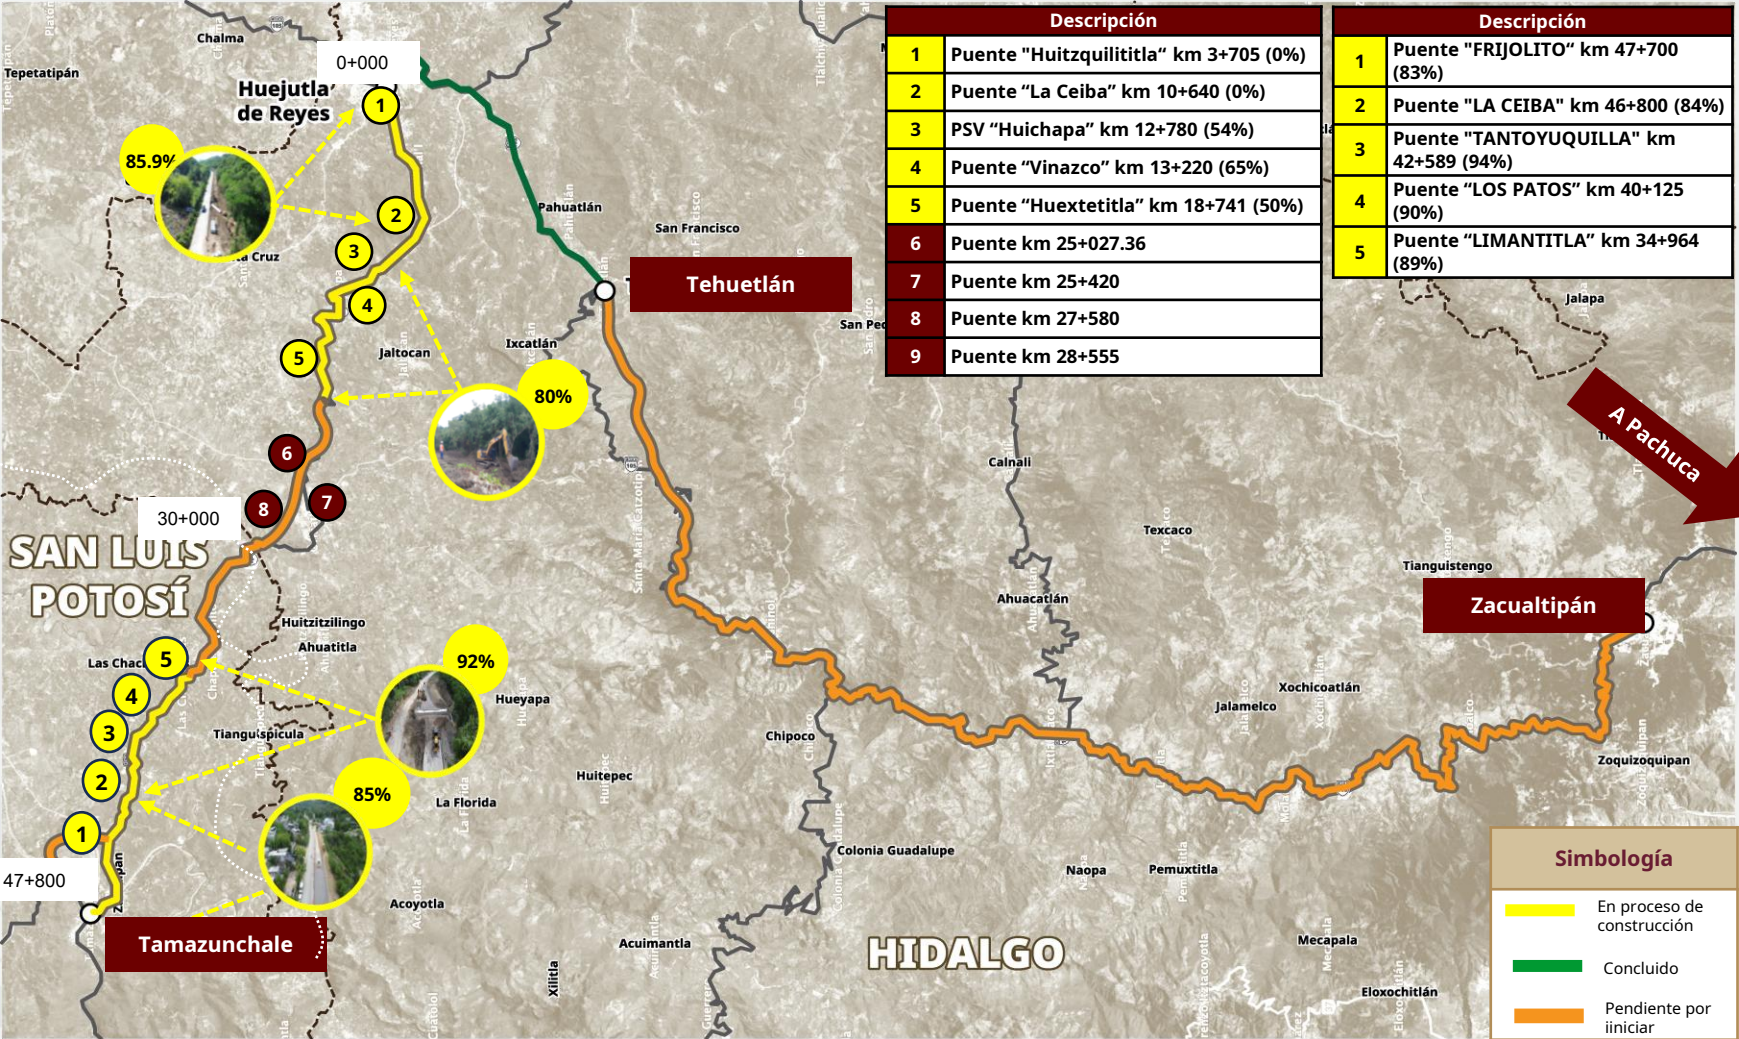

Tramo	Empresas
km 0+000 al km 10+000	<ul style="list-style-type: none">Contratista: IMAGEN CORPORATIVA ATLANTA, S.A. DE C.V. E INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO INTEGRAL DICSSA, S.A. DE C.V.Supervisión: CONSTRUCTORA SOCOE, S.A. DE C.V.
km 10+000 al km 20+000	<ul style="list-style-type: none">Contratista: SÁNCHEZ VALDEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.Supervisión: P.A.C.C.S.A. INGENIERÍA, S.A. DE C.V.
km 42+800 al km 38+820 y del km 35+160 al km 34+140	<ul style="list-style-type: none">Contratista: Sánchez Valdez Construcciones, S.A. de C.V.Supervisión: Servicios de Consultoría en Infraestructura Vial, S.A. de C.V.
km 47+800 al km 42+800	<ul style="list-style-type: none">Contratista: Convenio Privado de Proposición Conjunta entre la Persona Moral The Fuentes Corporation Mexican Filial, S.A. de C.V. y Constructora Gervisur, S.A. de C.V.Supervisión: Constructora Empresarial MEF, S.A. de C.V

San Luis Potosí

Tamazunchale – Huejutla

Km 34+140 al Km 35+160 y del Km 38+820 al Km 42+800

Elemento	Unidad	Meta	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 09/01/2026 al 15/01/2026		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
TERRACERÍAS								
Despalme	m³	31,718.00	31,718.0	100.00%	0.00	0.0	0.0	Trabajos concluidos
Cortes	m³	249,345.00	245,000.0	98.26%	4,345.00	6,845	0.0	
Terraplenes 90%	m³	127,937.00	118,000.0	92.23%	9,937.00	12,937	0.0	
Subyacente	m³	31,983.00	28,970.0	90.58%	3,013.00	8,518	0.0	
Subrasante	m³	13,572.00	11,580.0	85.32%	1,992.00	2,824	0.0	
OBRAS DE DRENAJE								
Obras de drenaje Tubería	pza.	11	11	100.00%	0	0	0.0	
Obras de drenaje losa	pza.	2	1	50.00%	1	1	0.0	
Obras de drenaje bóveda	pza.	2	1	50.00%	1	1	0.0	
PAVIMENTOS								
Base hidráulica	m³	14,685.00	10,365.0	70.58%	4,320.00	6,089	1,365.0	
Base asfáltica	m³	8,667.00	4,500.0	51.92%	4,167.00	5,167	1,000.0	
Carpeta asfáltica	m³	5,616.00	0	0.00%	5,616.00	5,616	0.0	
SEÑALAMIENTO								
Señalamiento definitivo	km	5	0	0.00%	5	5.0	0.0	


Km 42+800 al Km 47+800

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 09/01/2026 al 15/01/2026		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
TERRACERÍAS								
Despalme	m³	26,738	25,950.0	97.05%	788.00	788.00	0.0	Trabajos del km42+800 al km43+000 y del km44+900 al km45+020
Cortes	m³	189,998.00	189,400.00	99.69%	598.00	598.00	0.0	Trabajos del km44+900 al km44+980
Terraplenes 90%	m³	24,931.00	24,600.00	98.67%	331.00	331.00	0.0	Trabajos del km43+600 al km43+660
Subyacente	m³	38,781.00	38,250.00	98.63%	531.00	531.00	0.0	Trabajos del km42+800 al km47+800
Subrasante	m³	19,107.00	18,513.00	96.89%	594.00	594.00	0.0	Trabajos del km42+800 al km47+800
OBRAS DE DRENAJE								
Obras de drenaje Tubería	pza.	10	10	100.0%	0	0	0.0	
Obras de drenaje losa	pza.	2	2	100.0%	0	0	0.0	
Obras de drenaje bóveda	pza.	2	1	50.0%	1	1	0.0	
PAVIMENTOS								
Base hidráulica	m³	14,718.00	13,293.00	90.3%	1,425.00	1,425	0.0	km42+800 al km44+890 del km45+060 al km47+800
Base asfáltica	m³	8,667.00	5,550.00	64.0%	3,117.00	3,117	0.0	
Carpeta asfáltica	m³	5,616.00	0	0.0%	5,616.00	5,616	0.0	Partida aún no iniciada
SEÑALAMIENTO								
Señalamiento definitivo	km	5	3.4	0.0%	5	0.80	0.0	



Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Tamazunchale - Huejutla

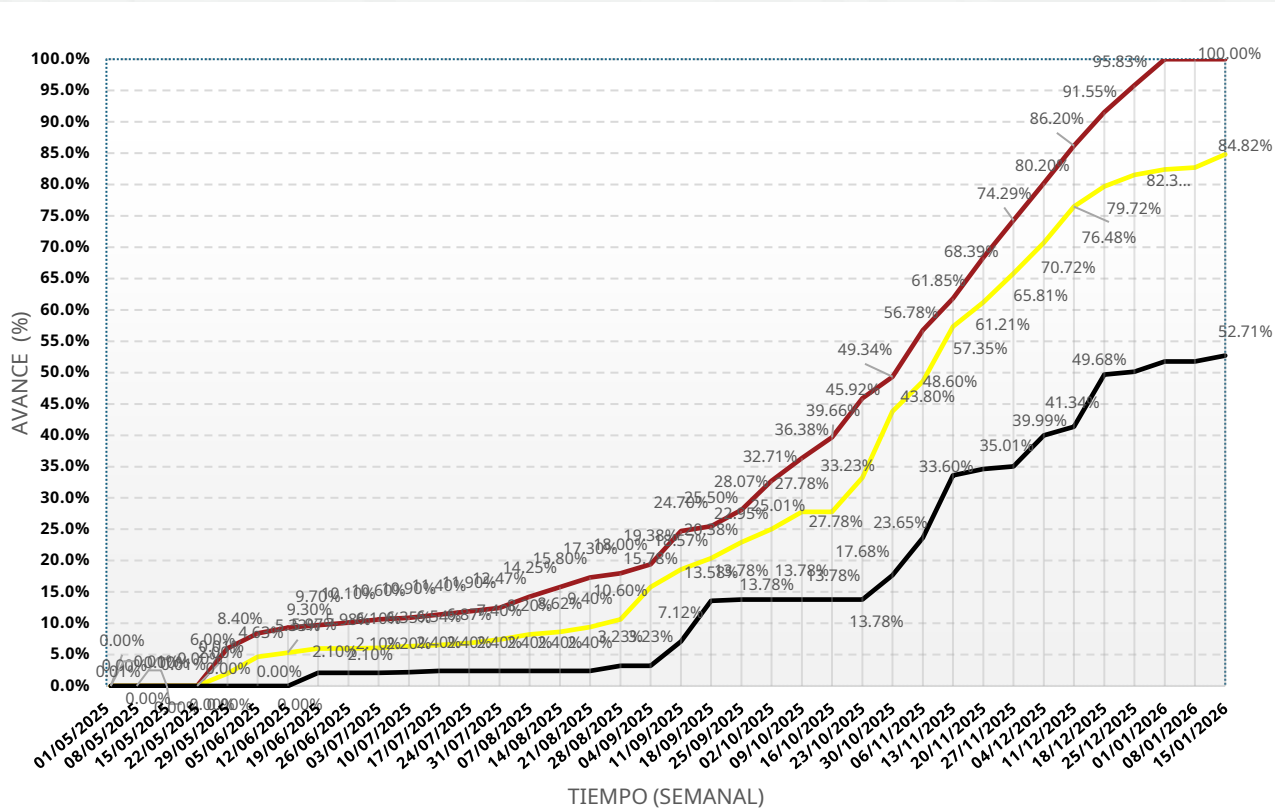

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	02 de enero al 08 de enero	09 de enero al 15 de enero
Fuerza de Trabajo (personas)	475	473
Maquinaria	197	199
Frentes	40	40
