

# San Luis Potosí - Hidalgo

## Tamazunchale – Huejutla – Pachuca

**Avance global**

- Programado: 31.25%
- Semanal: 0.27%
- Real: 25.75%
- Financiero: 18.95%

**Avance 2025**

- Programado: 100%
- Semanal: 0.87%
- Real: 82.39%
- Financiero: 51.77%

**Inversión total 2025-2028:** 6,674 mdp

- Hidalgo: 3,742 mdp
- SLP: 2,932 mdp

**Inversión 2025:** 2,443 mdp

**Hidalgo:** 1,613 mdp / 20.0 km y 5 puentes,

**San Luis Potosí:** 830 mdp / 10.0 km y 5 puentes

**Meta total 2025-2028:** 96 km

**Hidalgo:**

- Ampliación de 30 km A2
- Construcción de 3er carril en 39 km
- Construcción de 9 puentes

**San Luis Potosí:**

- Ampliación de 17 km A2
- Construcción de 10 km C2
- Construcción de 5 puentes

**Inicio :** 28 de abril 2025


**Termino:** diciembre 2028

**Término meta 2025:** diciembre 2025

**20,022** empleos generados

**+395 mil** habitantes beneficiados

**65 min** de ahorro en tiempo

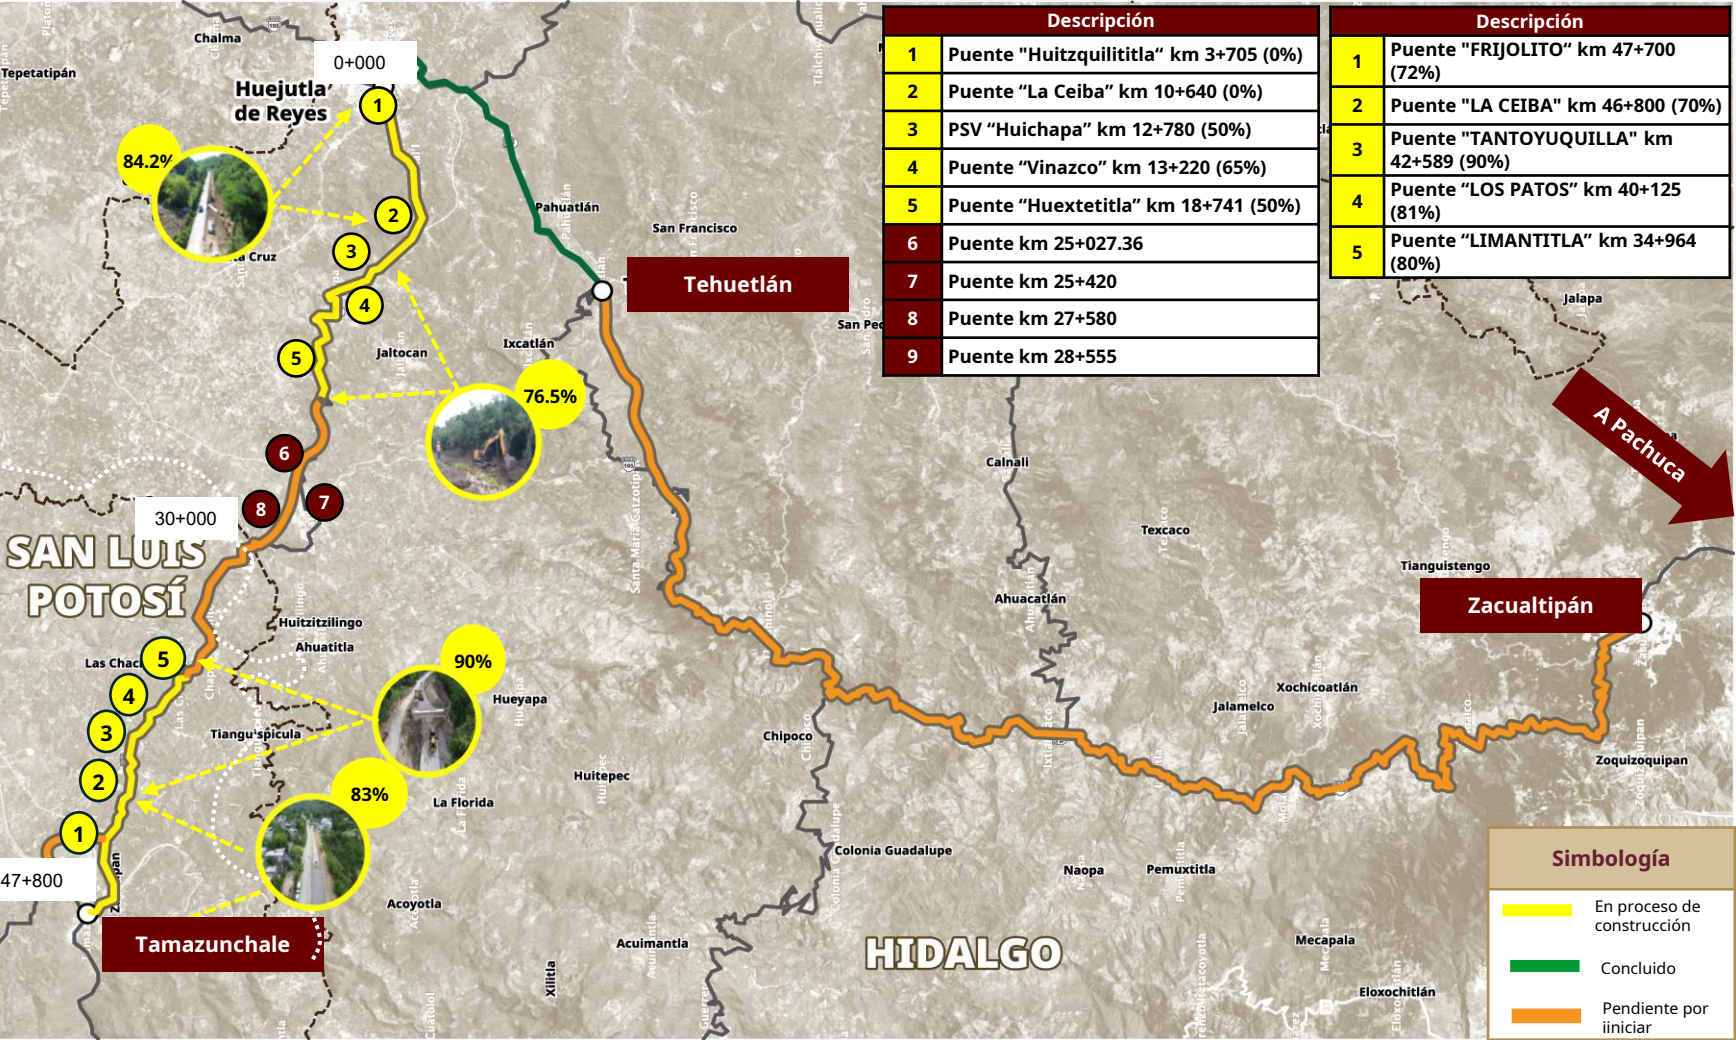

Tramo	Empresas
km 0+000 al km 10+000	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Contratista:</b> IMAGEN CORPORATIVA ATLANTA, S.A. DE C.V. E INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO INTEGRAL DICSSA, S.A. DE C.V.</li><li>• <b>Supervisión:</b> CONSTRUCTORA SOCOE, S.A. DE C.V.</li></ul>
km 10+000 al km 20+000	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Contratista:</b> SÁNCHEZ VALDEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.</li><li>• <b>Supervisión:</b> P.A.C.C.S.A. INGENIERÍA, S.A. DE C.V.</li></ul>
km 42+800 al km 38+820 y del km 35+160 al km 34+140	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Contratista:</b> Sánchez Valdez Construcciones, S.A. de C.V.</li><li>• <b>Supervisión:</b> Servicios de Consultoría en Infraestructura Vial, S.A. de C.V.</li></ul>
km 47+800 al km 42+800	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Contratista:</b> Convenio Privado de Proposición Conjunta entre la Persona Moral The Fuentes Corporation Mexican Filial, S.A. de C.V. y Constructora Gervisur, S.A. de C.V.</li><li>• <b>Supervisión:</b> Constructora Empresarial MEF, S.A. de C.V</li></ul>

# San Luis Potosí

## Tamazunchale – Huejutla

Km 34+140 al Km 35+160 y del Km 38+820 al Km 42+800

Elemento	Unidad	Meta	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 26/12/25 al 01/01/2026		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
TERRACERÍAS								
Despalme	m³	31,718.00	31,718.0	100.00%	0.00	0.0	0.0	Trabajos concluidos
Cortes	m³	249,345.00	242,500.0	97.25%	6,845.00	6,845	47,500.0	
Terraplenes 90%	m³	127,937.00	115,000.0	89.89%	12,937.00	12,937	25,000.0	
Subyacente	m³	31,983.00	23,473.0	73.39%	8,510.00	8,510	0.0	
Subrasante	m³	13,572.00	10,748.0	79.19%	2,824.00	2,424	1,000.0	
OBRAS DE DRENAJE								
Obras de drenaje Tubería	pza.	11	11	100.00%	0	0	0.0	Trabajos concluidos
Obras de drenaje losa	pza.	2	1	50.00%	1	1	0.0	
Obras de drenaje bóveda	pza.	2	1	50.00%	1	1	0.0	
PAVIMENTOS								
Base hidráulica	m³	14,685.00	8,595.9	58.54%	6,089.10	6,089	1,615.9	
Base asfáltica	m³	8,667.00	3,500.0	40.38%	8,667.00	5,167	1,500.0	
Carpeta asfáltica	m³	5,616.00	0	0.00%	5,616.00	5,616	0.0	No iniciada
SEÑALAMIENTO								
Señalamiento definitivo	km	5	0	0.00%	5	5.0	0.0	

Km 42+800 al Km 47+800


Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 26/12/25 al 01/01/2026		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
TERRACERÍAS								
Despalme	m³	26,738	25,950.0	97.05%	788.00	788.00	0.0	Trabajos del km 42+800 al km 43+000 y del km 44+900 al km 45+020
Cortes	m³	189,998.00	189,400.00	99.69%	598.00	598.00	1,000.0	Trabajos del km 44+900 al km 44+980
Terraplenes 90%	m³	24,931.00	24,600.00	98.67%	331.00	331.00	0.0	Trabajos del km 43+600 al km 43+660
Subyacente	m³	38,781.00	38,250.00	98.63%	531.00	531.00	500.0	Trabajos del km 42+800 al km 47+800
Subrasante	m³	19,107.00	18,513.00	96.89%	594.00	594.00	500.0	Trabajos del km 42+800 al km 47+800
OBRAS DE DRENAJE								
Obras de drenaje Tubería	pza.	10	10	100.0%	0	0	0.0	
Obras de drenaje losa	pza.	2	2	100.0%	0	0	0.0	
Obras de drenaje bóveda	pza.	2	1	50.0%	1	1	0.0	
PAVIMENTOS								
Base hidráulica	m³	14,718.00	13,293.00	90.3%	1,425.00	1,425	0.0	km 42+800 al km 44+890 del km 45+060 al km 47+800
Base asfáltica	m³	8,667.00	5,550.00	64.0%	3,117.00	2,926	0.0	
Carpeta asfáltica	m³	5,616.00	0	0.0%	5,616.00	5,474	0.0	Partida aún no iniciada
SEÑALAMIENTO								
Señalamiento definitivo	km	5	3.4	0.0%	5	0.80	0.0	



Gobierno de  
**México**

**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Tamazunchale - Huejutla

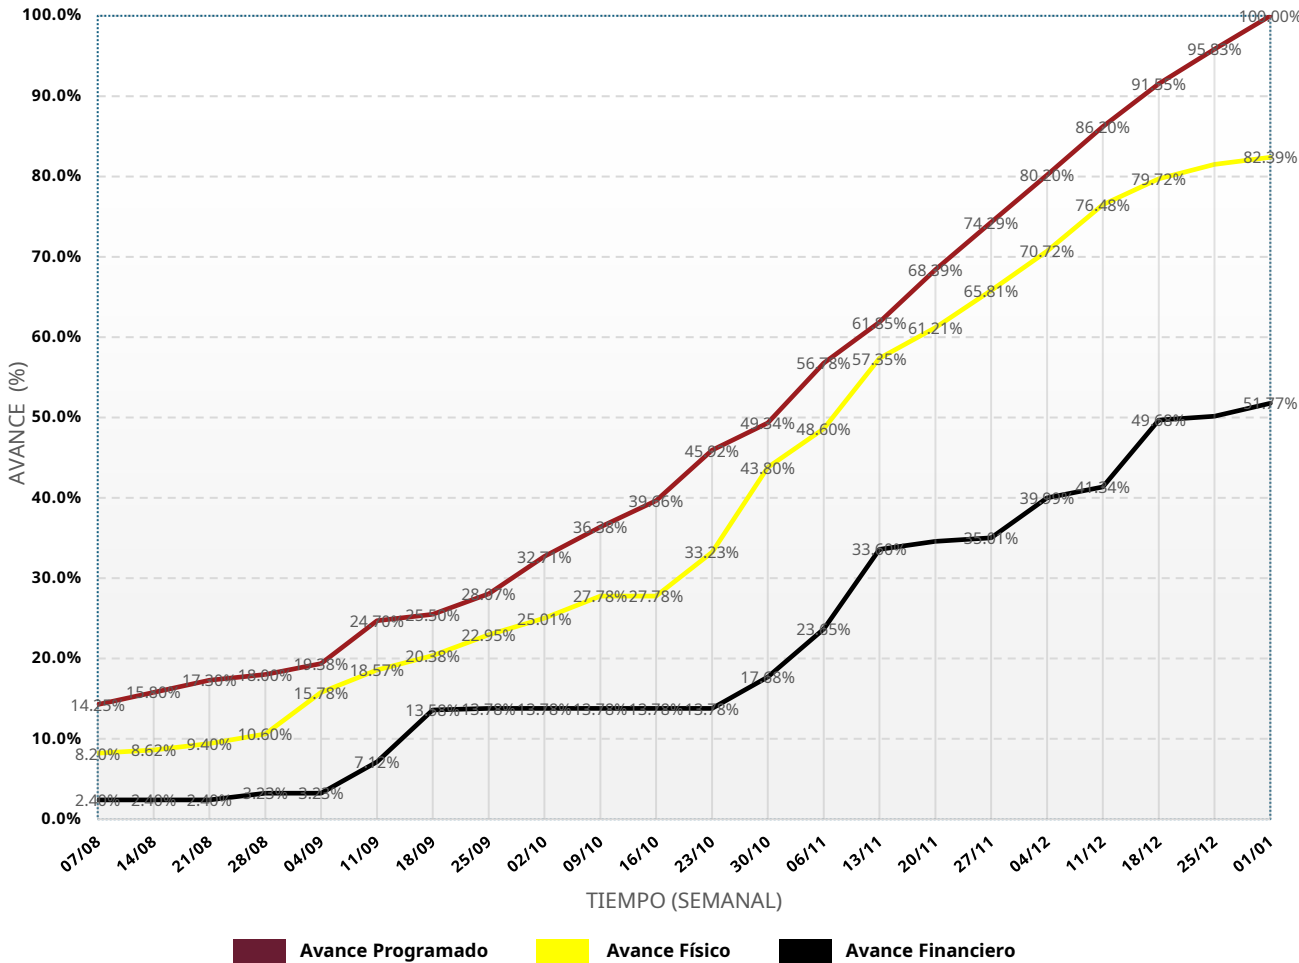

	19 de diciembre al 25 de diciembre	26 de diciembre al 01 de enero
Fuerza de Trabajo (personas)	475	475
Maquinaria	198	197
Frentes	40	40
