

Guaymas – Esperanza – Yécora - Chihuahua



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



2025
Año de
La Mujer
Indígena



Inversión total: 18,491 mdp
Inversión 2025: 450 mdp



Meta total: 349 km
Meta 2025: 10 km, 4 puentes
y 23 obras de drenaje.



Inicio : 20 de octubre de 2025
Termino: por definir
Término meta 2025: 28 de
febrero de 2026



55,473 empleos generados



669,912 habitantes beneficiados




Avance 2025
Avance Programado: 100%
Avance Real: 47.19%
Avance Financiero: 30%

Guaymas – Esperanza – Yécora - Chihuahua

Km 17+300 al Km 32+300

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	19-12-25 al 25-12-25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Trabajos preliminares (km)	9.97	9.97	-	-	-	-
Terracerías (km)	9.97	9.97	-	1.7	1.7	-
Obras de drenaje (Pza)	23	23	-	4	4	-
Pavimento (km)	9.97	2.15	7.82	0.78	0.78	-
Señalamiento (km)	9.97	-	9.97	-	-	-
Construcción Puente I (Canal alto)	100%	39.29%	60.71%	7.14%	3.58%	-
Construcción Puente II (Agua Caliente)	100%	30.95%	69.05%	2.38%	2.38%	-
Construcción Puente III (Chinito I)	100%	35.71%	64.29%	21.43%	21.42%	-
Construcción Puente IV (Chinito II)	100%	25%	75%	25%	10.71%	-

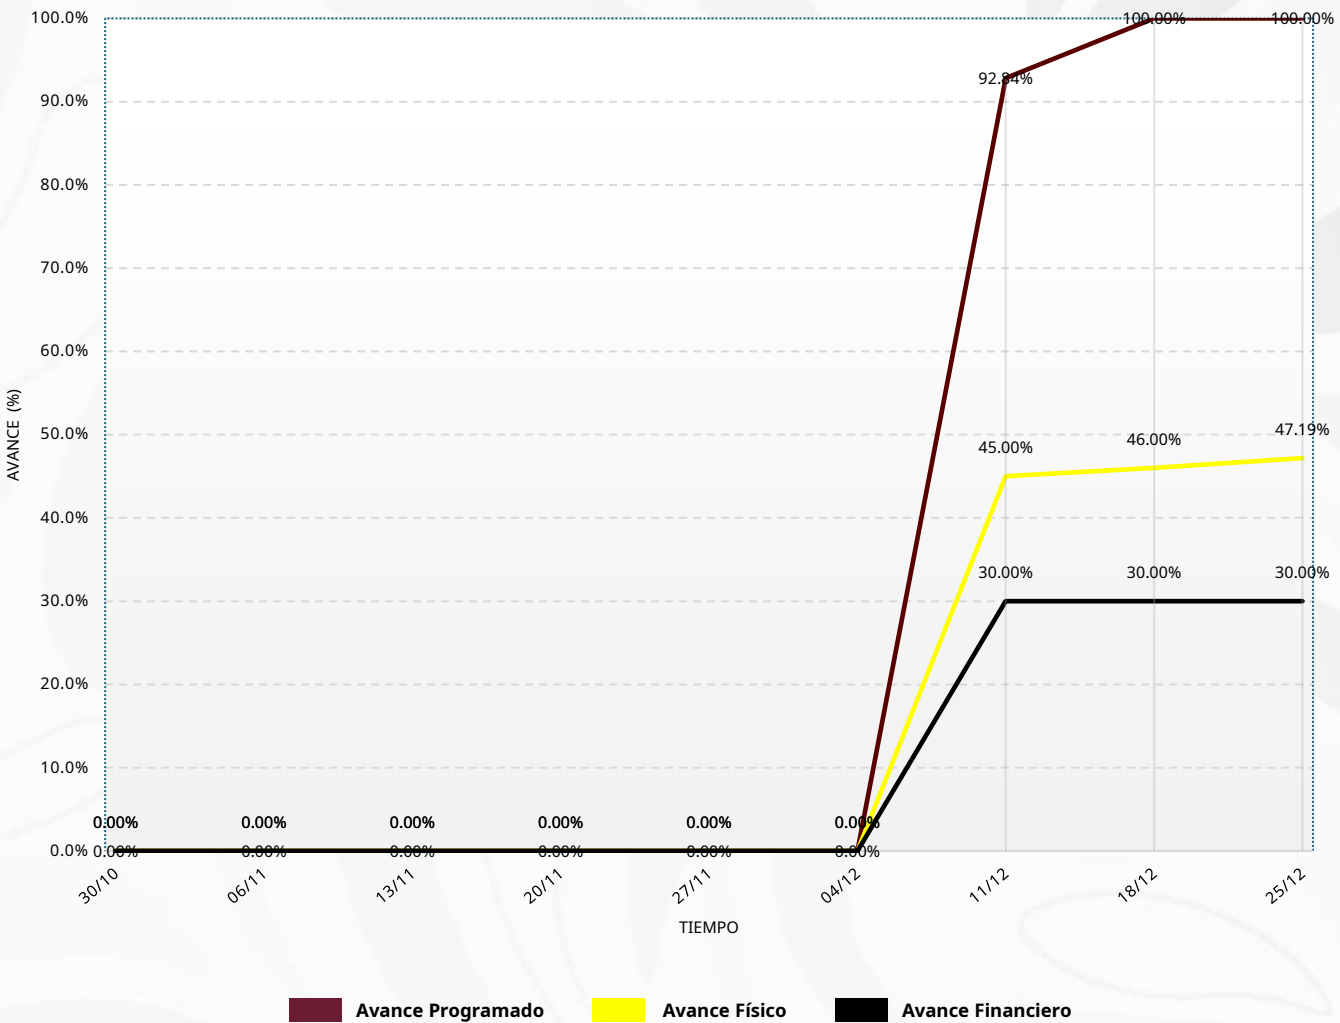

	12 al 18 de diciembre	19 al 25 de diciembre
Fuerza de Trabajo (personas)	200	200
Maquinaria	88	88
Frentes de trabajo	6	6
