

Guerrero - Puebla

Eje Cuautla – Tlapa

Ramal Igualapa – Chilixtlahuaca - Alacatlitzala

Avance global • Programado: 8.87%
• Real: 7.39%


• Semanal: 0.12%
• Financiero: 3.74%

Avance 2025 • Programado: 100.0%
• Real: 83.24%
• Semanal: 1.34%
• Financiero: 82.77%

*El Centro SICT Puebla, realizó una reducción de meta y monto.

*El Centro SICT Guerrero, realizó convenios de incremento de monto

1.- Edificaciones y Obras Civiles Romacal, S.A. de C.V. y Turboasfaltos, S.A. de C.V.
Meta: Km 35+340-km 41+000, incluye 1 puente Inversión: 110.6 MDP C/IVA
2.- Constructora ALICAT, S.A. de C.V., Constructora ERAGT Creación, S.A. de C.V., Construcciones Gracida y Asociados, S.A. de C.V. y CODEMAZATL, S.A. de C.V.
Meta: Km 41+000-km 46+600 km Inversión: 79.8 MDP C/IVA
3.- Construcción de Caminos y Proyectos Interestatales, S.A. de C.V.
Meta: Km 51+400-km 56+000 km Inversión: 71.7 MDP C/IVA
4.- Constructora ERAGT CREACIÓN, S.A. de C.V., Grupo Comercializador EELVA, S.A. de C.V., DAHNA Constructores, S.A. de C.V. y Lizbeth Reyes Villa
Meta: Km 80+800 – km 85+800 Inversión: 82.11 MDP C/IVA
5.- Moisés Martínez Mendoza, Grupos CYRMA MART, S.A. de C.V.
Meta: Km 85+800 – km 90+800 Inversión: 76.41 MDP C/IVA
6.- Puentes e Ingeniería Especializada de Puebla, S.A. de C.V. PIEPSA y Grupo Tauro Ingeniería y Transportes, S.A. de C.V.
Meta: Km 90+800 – km 95+800 Inversión: 57.56 MDP C/IVA
S1.- Grupo CORPCIT, S.A. de C.V.
Meta: Km 35+340 – km 46+000 y Km 51+400 – Km 56+000 Inversión: 6.40 MDP C/IVA

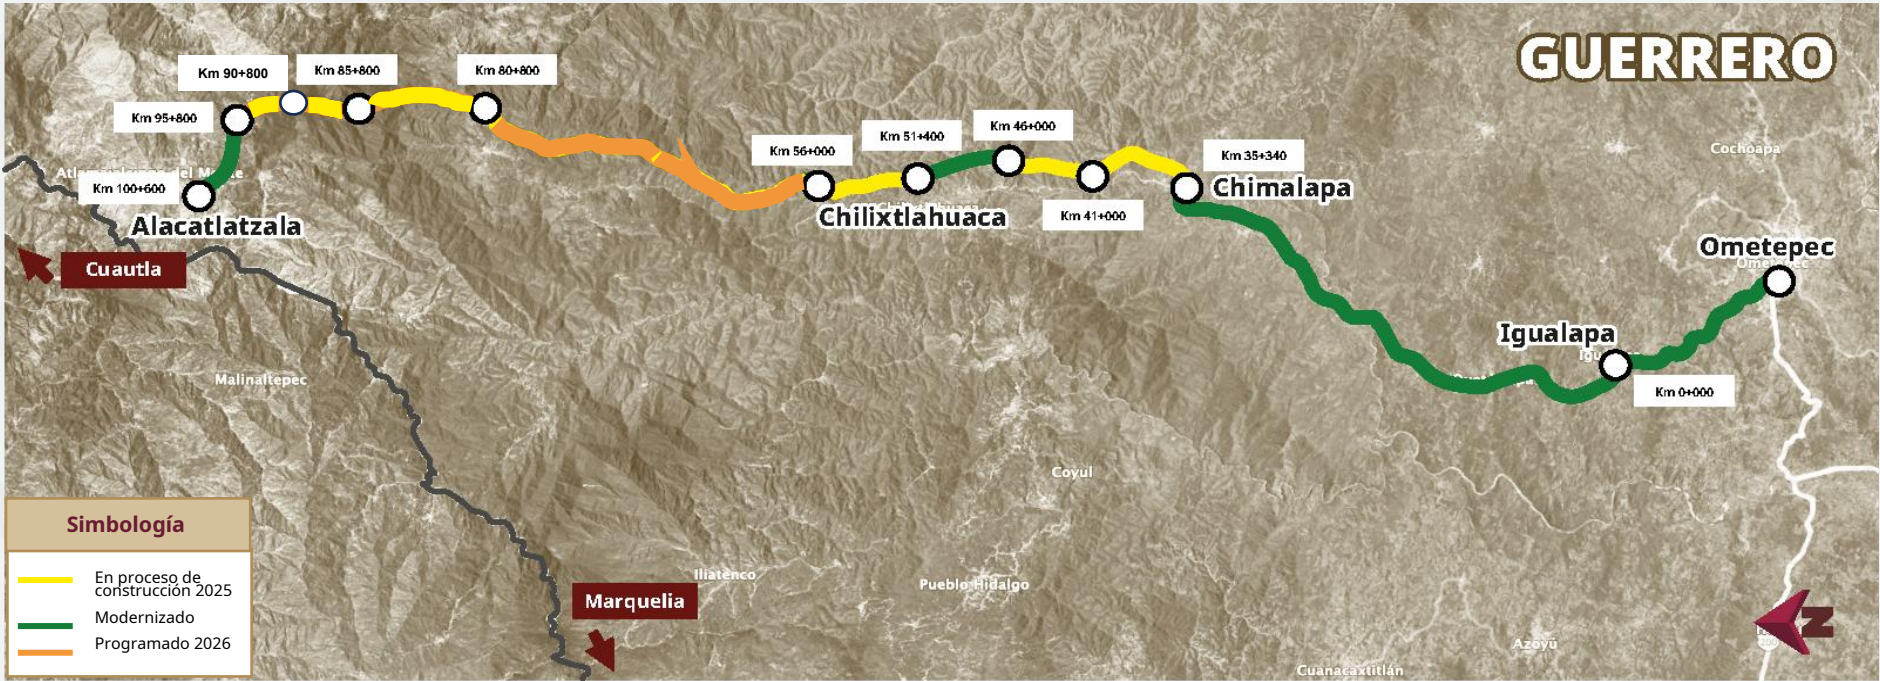

Meta total 2025-2029: 385km

- Morelos: 26 km
- Puebla: 159 km
- Guerrero: 201 km

Meta 2025: 34.2 km



Inversión total 2025-2029: 13.652 mdp.

- Morelos: 527 mdp
- Puebla: 7,669 mdp
- Guerrero: 5,456 mdp



Inicio: 16 de mayo 2025
Término: diciembre 2029
Termino meta 2025: 15 febrero 26



40,956 empleos generados



7,750 habitantes beneficiados



1 hora de ahorro en tiempo



Se beneficiará a una población de 7,750 habitantes de los municipios de Igualapa, Cochoapa el Grande, Metlatonoc y Malinaltepec, reduciendo tiempos de traslado.

S2.- Constructora DEMSA, S.A. de C.V.
Meta: Km 80+800 – km 95+800 Inversión: 5.95 MDP C/IVA


Guerrero - Puebla

Eje Cuautla – Tlapa

Ramal Igualapa – Chilixtlahuaca - Alacatlitzala

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	09-01-26 al 15-01-26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Trabajos preliminares (km)	30.90	0.00	0.0	0.0	0.0	Trabajos de topografía
Terracerías (km)	30.90	29.90	1.0	1.0	0.0	Desmonte -Despalme -Cortes Terraplenes
Obras de drenaje (Pza.)	141	139	2	2	0.0	obras de drenaje
Pavimento (km)	30.9	12.22	18.68	18.68	5.22	Tramos aislados de concreto hidráulico
Señalamient o (km)	30.9	2.5	28.4	28.4	2.5	-

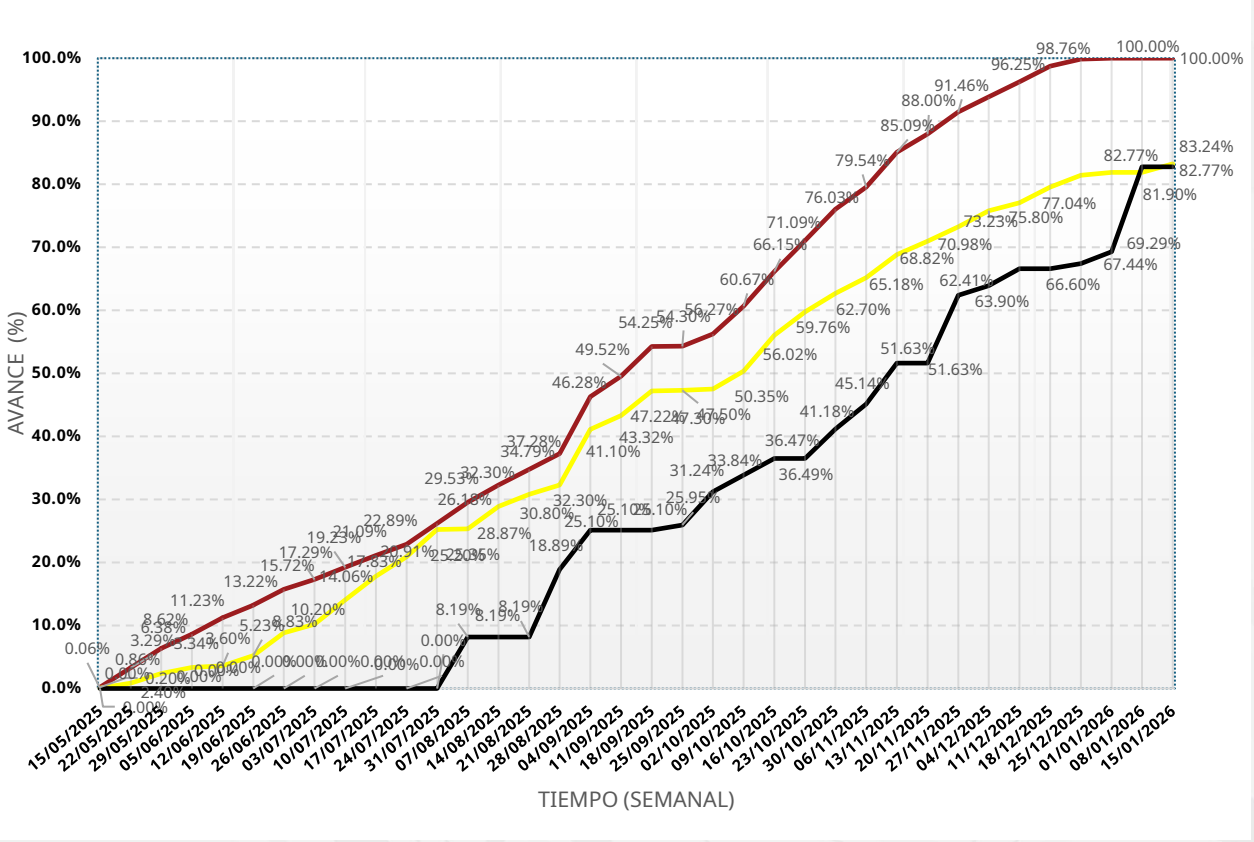

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	02 al 08 de enero	09 al 15 de enero
Fuerza de Trabajo (personas)	0	426
Maquinaria	0	183
Frentes de trabajo	0	26
