

# San Luis Potosí - Hidalgo

## Tamazunchale – Huejutla – Pachuca

**Avance global**

- Programado: 19.33%
- Semanal: 2.73%
- Real: 17.92%
- Financiero: 12.30%

**Avance 2025**

- Programado: 61.85%
- Semanal: 8.75%
- Real: 57.35%
- Financiero: 33.60%

**Inversión total 2025-2028:** 6,674 mdp

- Hidalgo: 3,742 mdp
- SLP: 2,932 mdp

**Inversión 2025:** 2,443 mdp

**Hidalgo:** 1,613 mdp / 20.0 km y 5 puentes,

**San Luis Potosí:** 830 mdp / 10.0 km y 5 puentes

**Meta total 2025-2028:** 96 km

**Hidalgo:**

- Ampliación de 30 km A2
- Construcción de 3er carril en 39 km
- Construcción de 8 puentes

**San Luis Potosí:**

- Ampliación de 17 km A2
- Construcción de 10 km C2
- Construcción de 5 puentes

**Inicio :** 28 de abril 2025


**Termino:** diciembre 2028

**Término meta 2025:** diciembre 2025

**20,022** empleos generados

**+395 mil** habitantes beneficiados

**65 min** de ahorro en tiempo

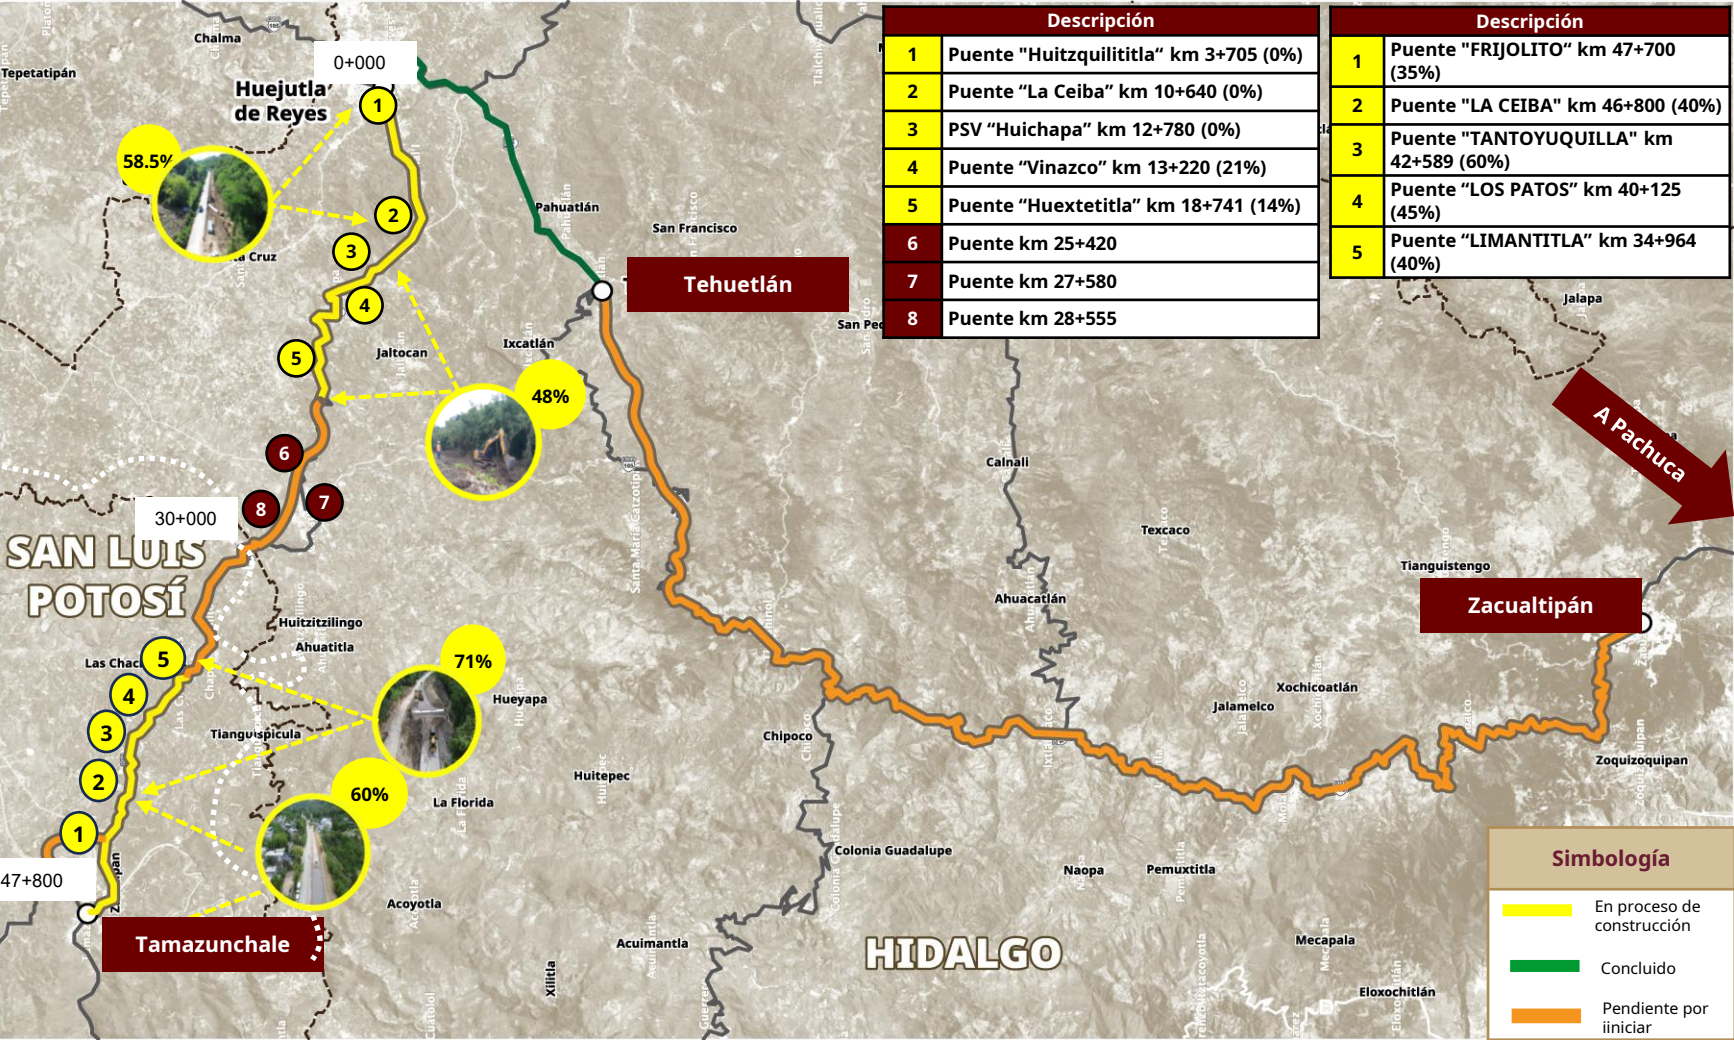

Tramo	Empresas
km 0+000 al km 10+000	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Contratista:</b> IMAGEN CORPORATIVA ATLANTA, S.A. DE C.V. E INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO INTEGRAL DICSSA, S.A. DE C.V.</li><li>• <b>Supervisión:</b> CONSTRUCTORA SOCOE, S.A. DE C.V.</li></ul>
km 10+000 al km 20+000	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Contratista:</b> SÁNCHEZ VALDEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.</li><li>• <b>Supervisión:</b> P.A.C.C.S.A. INGENIERÍA, S.A. DE C.V.</li></ul>
km 42+800 al km 38+820 y del km 35+160 al km 34+140	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Contratista:</b> Sánchez Valdez Construcciones, S.A. de C.V.</li><li>• <b>Supervisión:</b> Servicios de Consultoría en Infraestructura Vial, S.A. de C.V.</li></ul>
km 47+800 al km 42+800	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Contratista:</b> Convenio Privado de Proposición Conjunta entre la Persona Moral The Fuentes Corporation Mexican Filial, S.A. de C.V. y Constructora Gervisur, S.A. de C.V.</li><li>• <b>Supervisión:</b> Constructora Empresarial MEF, S.A. de C.V</li></ul>

# San Luis Potosí

## Tamazunchale – Huejutla

Km 34+140 al Km 35+160 y del Km 38+820 al Km 42+800

Elemento	Unidad	Meta	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 07/11/25 al 13/11/25		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
TERRACERÍAS								
Despalme	m³	31,718.00	31,718.0	100.00%	0.00	0.0	0.0	Trabajos conduidos
Cortes	m³	249,345.00	145,000.0	58.15%	104,345.00	104,345	0.0	
Terraplenes 90%	m³	127,937.00	70,000.0	54.71%	57,937.00	57,937	0.0	
Subyacente	m³	31,983.00	21,300.0	66.60%	10,683.00	10,683	0.0	
Subrasante	m³	13,572.00	8,900.0	65.58%	4,672.00	4,672	0.0	
OBRAS DE DRENAJE								
Obras de drenaje Tubería	pza.	11	5	45.45%	6	6	0	
Obras de drenaje losa	pza.	2	1	50.00%	1	1	0	
Obras de drenaje bóveda	pza.	2	1	50.00%	1	1	0	
PAVIMENTOS								
Base hidráulica	m³	14,685.00	6,980.0	47.53%	7,705.00	7,705	0.00	
Base asfáltica	m³	8,667.00	900.0	10.38%	8,667.00	3,884	0.00	
Carpeta asfáltica	m³	5,616.00	0	0.00%	5,616.00	1,872	0.00	
SEÑALAMIENTO								
Señalamiento definitivo	km	5	0	0.00%	5	2.5	0.00	

Km 42+800 al Km 47+800


Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 07/11/25 al 13/11/25		Observaciones
					Programado	Ejecutado	
TERRACERÍAS							
Despalme	m³	26,738	25,300.00	94.62%	1,438.00	1,438.00	0.00
Cortes	m³	189,998.00	169,900.00	89.42%	20,098.00	2,098.00	0.00
Terraplenes 90%	m³	24,931.00	22,900.00	91.85%	2,031.00	2,031.00	0.00
Subyacente	m³	38,781.00	36,850.00	95.02%	1,931.00	3,950.00	8,460.00
Subrasante	m³	19,107.00	17,613.00	92.18%	1,494.00	3,499.00	3,600.00
OBRAS DE DRENAJE							
Obras de drenaje Tubería	pza.	10	6	60.0%	4	4	0
Obras de drenaje losa	pza.	2	1	50.0%	1	1	0
Obras de drenaje bóveda	pza.	2	1	50.0%	1	1	0
PAVIMENTOS							
Base hidráulica	m³	14,718.00	8,993.00	61.1%	5,725.00	10,718	1,001
Base asfáltica	m³	8,667.00	0	0.0%	8,476.00	8,476	0
Carpeta asfáltica	m³	5,616.00	0	0.0%	5,474.00	2,737	0
SEÑALAMIENTO							
Señalamiento definitivo	km	5	3.4	0.0%	5	0.40	0.00



Gobierno de  
**México**

**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Tamazunchale - Huejutla

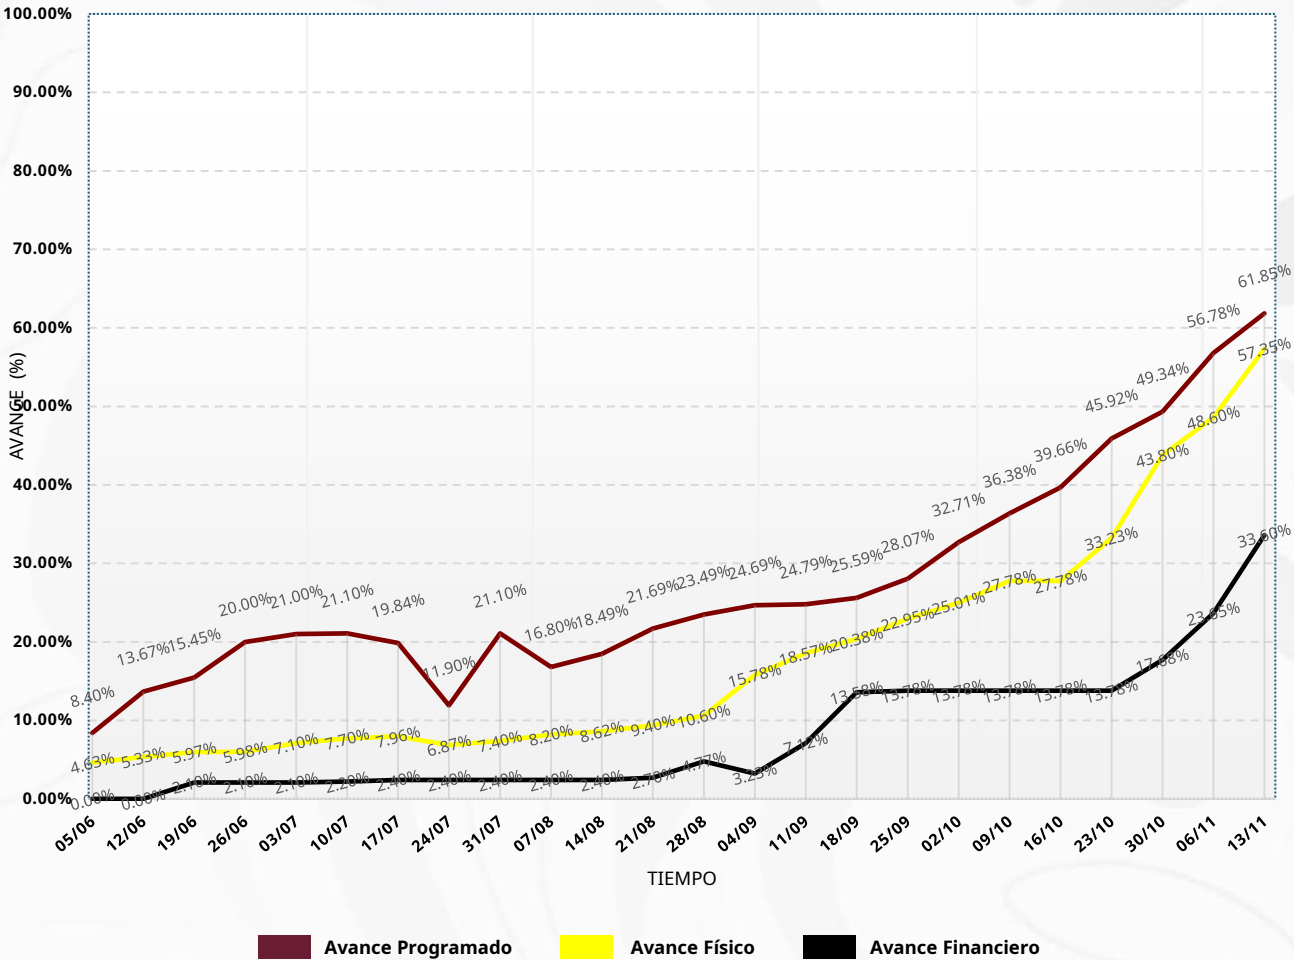

	31 de octubre al 06 de noviembre	07 de noviembre al 13 de noviembre
Fuerza de Trabajo (personas)	361	363
Maquinaria	161	164



# San Luis Potosí - Hidalgo

## Tamazunchale – Huejutla – Pachuca

### km 0+000 al km 10+000

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	07/11/25 al 13/11/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Desmonte (Ha)	20.0	20.0	-	-	-	Concluido
Despalme (m3)	21,500.0	21,500.0	-	-	-	Concluido
Cortes (m3)	183,255.0	175,444.7	7,810.3	6,326.38	7,940.0	
Terraplén (m3)	42,250.0	39,320.0	2,930.0	2,841.62	3,050.0	
Subyacente (m3)	93,012.0	42,194.0	50,818.0	5,086.59	5,713.0	
Subrasante (m3)	36,638.0	22,730.0	13,908.0	2,003.64	2,975.0	
Excavación estructuras y O.D. (m3)	14,264.6	8,317.0	5,947.6	818.46	745.0	
Base hidráulica (m3)	30,000.0	7,500.0	22,500.0	1,810.34	915.0	
Base asfáltica (m3)	16,760.0	3,011.0	13,749.0	1,460.0	386.0	
Carpeta asfáltica (m3)	10,692.0	0.0	10,692.0	822.46	0.0	
Puentes peatonales (pza)	4.0	0.0	4.0	0.33	0.0	
Señalamiento (m)	43,334.0	0.0	43,334.0	0.0	0.0	

### km 10+000 al km 20+000

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	07/11/25 al 13/11/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Desmonte (Ha)	36.0	36.0	-	-	-	Concluido
Despalme (m3)	31,500.0	31,500.0	-	-	-	Concluido
Cortes (m3)	347,581.0	108,850.0	238,731.0	16,215.3	19,000.0	
Terraplén (m3)	251,735.0	56,200.0	195,535.0	11,747.9	18,000.0	
Subyacente (m3)	77,344.0	19,900.0	57,444.0	3,609.2	8,000.0	
Subrasante (m3)	32,248.0	8,800.0	23,448.0	1,505	2,000.0	
Excavación estructuras y O.D. (m3)	133,739.6	33,469.0	100,270.6	7,281.4	12,000.0	
Base hidráulica (m3)	30,000.0	240.0	29,760.0	1,750	40.0	
Base asfáltica (m3)	16,760.0	0.0	16,760.0	1,117.2	0.0	
Carpeta asfáltica (m3)	10,692.0	0.0	10,692.0	1,247.4	0.0	
Puentes peatonales (pza)	5.0	0.0	5.0	0.4	0.0	
Señalamiento (m)	43,334.0	0.0	43,334.0	0.0	0.0	



Avances físicos (San Luis Potosí)



Avances físicos (Hidalgo)
