

San Luis Potosí - Hidalgo

Tamazunchale – Huejutla – Pachuca

Avance global

- Programado: 23.22%
- Semanal: 1.44%
- Real: 20.57%
- Financiero: 12.81%

Avance 2025

- Programado: 74.29%
- Semanal: 4.60%
- Real: 65.81%
- Financiero: 35.01%

Inversión total 2025-2028: 6,674 mdp

- Hidalgo: 3,742 mdp
- SLP: 2,932 mdp

Inversión 2025: 2,443 mdp

Hidalgo: 1,613 mdp / 20.0 km y 5 puentes,

San Luis Potosí: 830 mdp / 10.0 km y 5 puentes

Meta total 2025-2028: 96 km

Hidalgo:

- Ampliación de 30 km A2
- Construcción de 3er carril en 39 km
- Construcción de 8 puentes

San Luis Potosí:

- Ampliación de 17 km A2
- Construcción de 10 km C2
- Construcción de 5 puentes

Inicio : 28 de abril 2025


Termino: diciembre 2028

Término meta 2025: diciembre 2025

20,022 empleos generados

+395 mil habitantes beneficiados

65 min de ahorro en tiempo

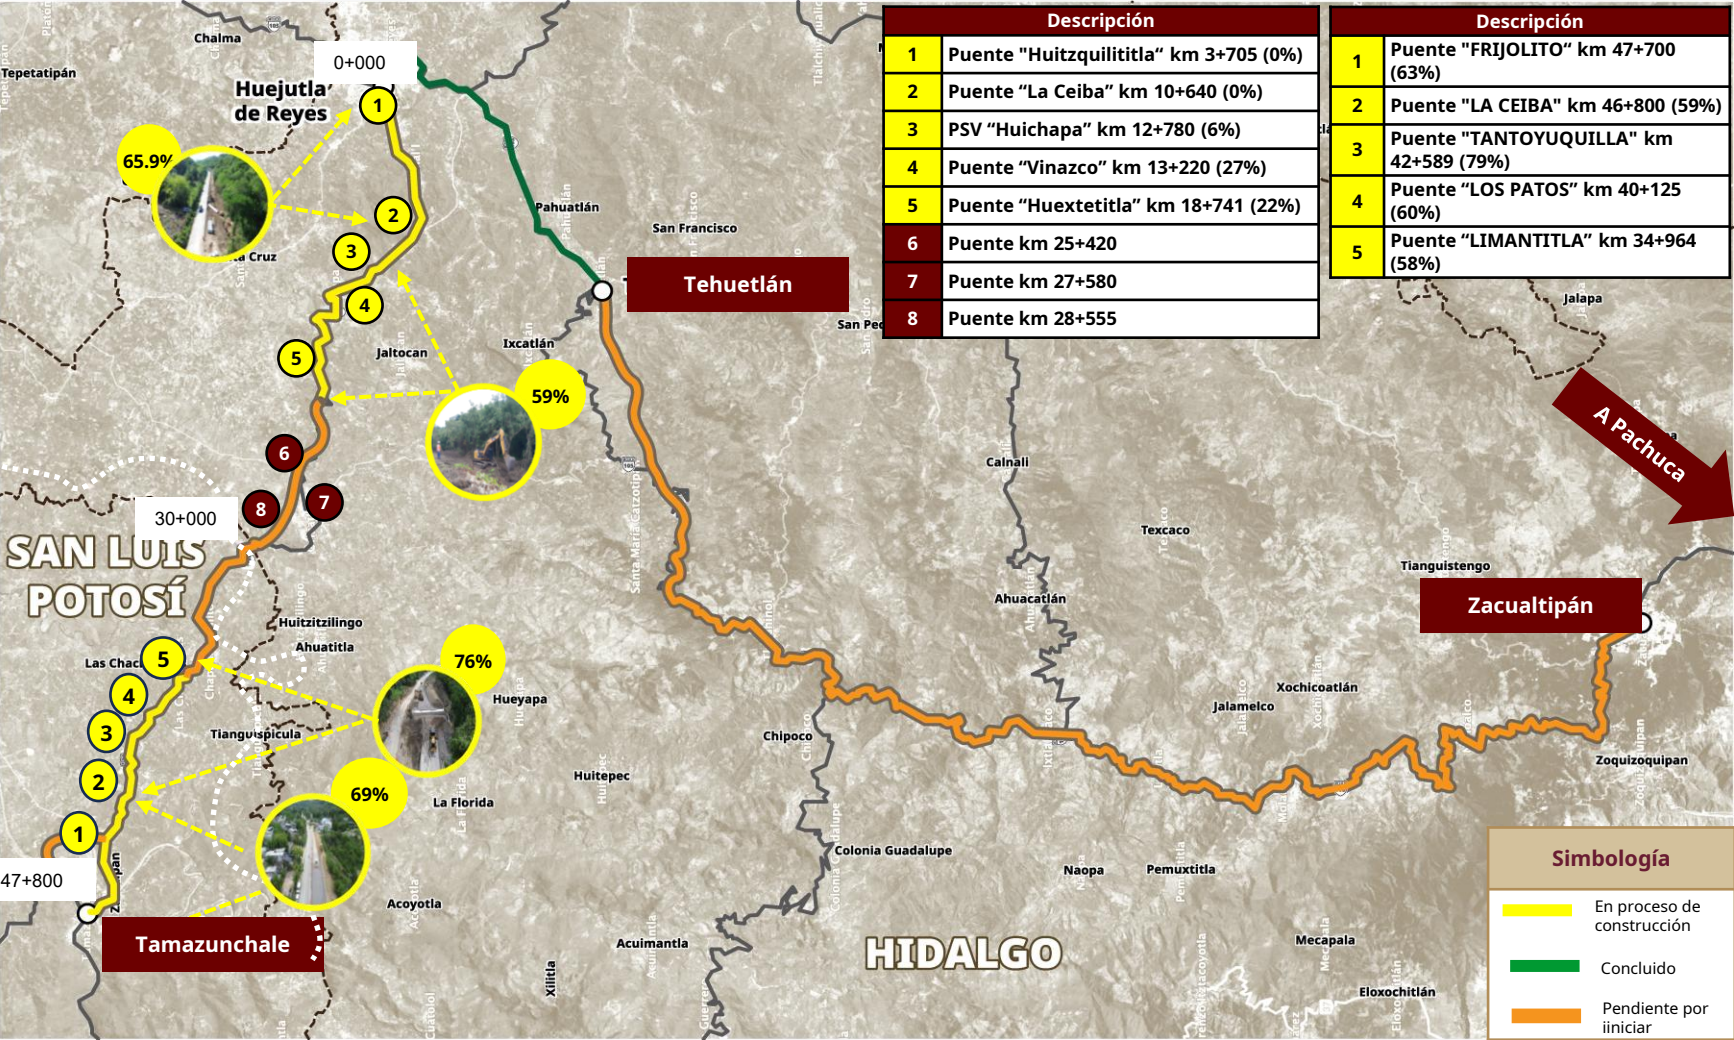

Tramo	Empresas
km 0+000 al km 10+000	<ul style="list-style-type: none">• Contratista: IMAGEN CORPORATIVA ATLANTA, S.A. DE C.V. E INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO INTEGRAL DICSSA, S.A. DE C.V.• Supervisión: CONSTRUCTORA SOCOE, S.A. DE C.V.
km 10+000 al km 20+000	<ul style="list-style-type: none">• Contratista: SÁNCHEZ VALDEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.• Supervisión: P.A.C.C.S.A. INGENIERÍA, S.A. DE C.V.
km 42+800 al km 38+820 y del km 35+160 al km 34+140	<ul style="list-style-type: none">• Contratista: Sánchez Valdez Construcciones, S.A. de C.V.• Supervisión: Servicios de Consultoría en Infraestructura Vial, S.A. de C.V.
km 47+800 al km 42+800	<ul style="list-style-type: none">• Contratista: Convenio Privado de Proposición Conjunta entre la Persona Moral The Fuentes Corporation Mexican Filial, S.A. de C.V. y Constructora Gervisur, S.A. de C.V.• Supervisión: Constructora Empresarial MEF, S.A. de C.V

San Luis Potosí

Tamazunchale – Huejutla

Km 34+140 al Km 35+160 y del Km 38+820 al Km 42+800

Elemento	Unidad	Meta	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 21/11/25 al 27/11/25		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
TERRACERÍAS								
Despalme	m³	31,718.00	31,718.0	100.00%	0.00	0.0	0.0	Trabajos concluidos
Cortes	m³	249,345.00	161,380.0	64.72%	87,965.00	87,965	10,580.0	
Terraplenes 90%	m³	127,937.00	87,420.0	68.33%	40,517.00	40,517	4,740.0	
Subyacente	m³	31,983.00	21,300.0	66.60%	10,683.00	10,683	0.0	
Subrasante	m³	13,572.00	8,900.0	65.58%	4,672.00	4,672	0.0	
OBRAS DE DRENAJE								
Obras de drenaje Tubería	pza.	11	10	90.91%	1	1	0	
Obras de drenaje losa	pza.	2	1	50.00%	1	1	0	
Obras de drenaje bóveda	pza.	2	1	50.00%	1	1	0	
PAVIMENTOS								
Base hidráulica	m³	14,685.00	6,980.0	47.53%	7,705.00	3,853	0.00	
Base asfáltica	m³	8,667.00	1,479.0	17.06%	8,667.00	2,396	0.00	
Carpeta asfáltica	m³	5,616.00	0	0.00%	5,616.00	1,404	0.00	
SEÑALAMIENTO								
Señalamiento definitivo	km	5	0	0.00%	5	1.3	0.00	

Km 42+800 al Km 47+800


Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 21/11/25 al 27/11/25		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
TERRACERÍAS								
Despalme	m³	26,738	25,950.00	97.05%	788.00	788.00	0.0	Trabajos del km 42+800 al km 43+000 y del km 44+900 al km 45+020
Cortes	m³	189,998.00	179,500.00	94.47%	10,498.00	10,498.00	2,500.0	Trabajos del km 42+800 al km 44+890 del km 45+060 al km 47+800
Terraplenes 90%	m³	24,931.00	23,700.00	95.06%	1,231.00	1,231.00	600.0	Trabajos del km 43+600 al km 43+660
Subyacente	m³	38,781.00	37,250.00	96.05%	1,531.00	1,531.00	0.0	Retrabajo 800 m³
Subrasante	m³	19,107.00	18,013.00	94.27%	1,094.00	547.00	200.0	Retrabajos 1200m³
OBRAS DE DRENAJE								
Obras de drenaje Tubería	pza.	10	8	80.0%	2	2	2	
Obras de drenaje losa	pza.	2	1	50.0%	1	1	0	
Obras de drenaje bóveda	pza.	2	1	50.0%	1	1	0	
PAVIMENTOS								
Base hidráulica	m³	14,718.00	11,693.00	79.4%	3,025.00	1,512	1,200	km 42+800 al km 44+890 del km 45+060 al km 47+800
Base asfáltica	m³	8,667.00	2,500.00	28.8%	8,476.00	1,992	1,200	Partida aún no iniciada
Carpeta asfáltica	m³	5,616.00	0	0.0%	5,474.00	1,369	0	Partida aún no iniciada
SEÑALAMIENTO								
Señalamiento definitivo	km	5	3.4	0.0%	5	0.40	0.00	



Gobierno de México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Tamazunchale - Huejutla

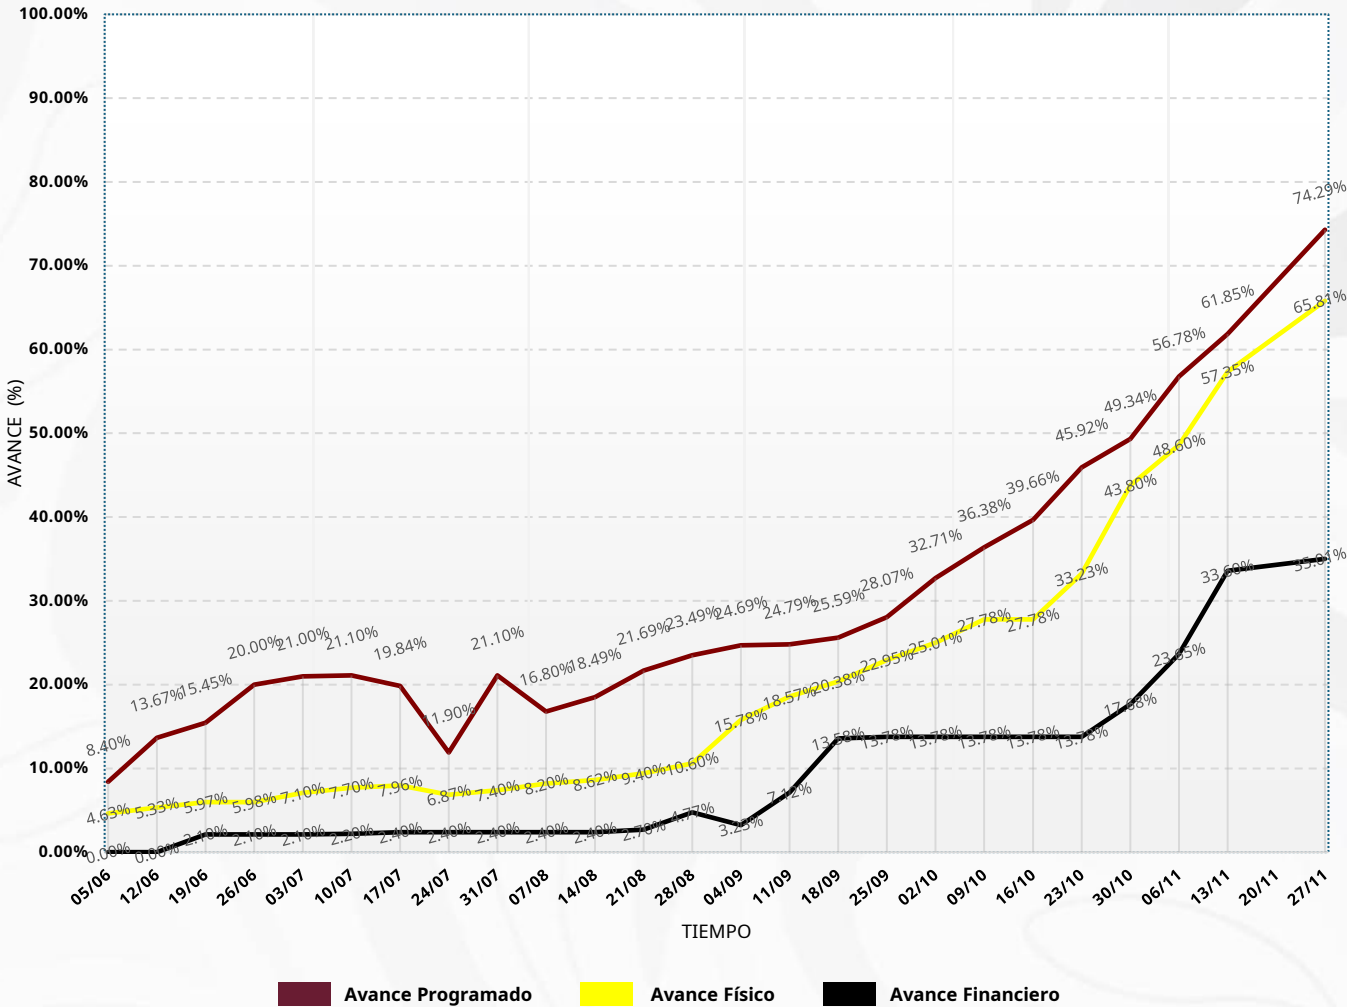

	14 de noviembre al 20 de noviembre	21 de noviembre al 27 de noviembre
Fuerza de Trabajo (personas)	381	389
Maquinaria	170	185
