

San Luis Potosí - Hidalgo

Tamazunchale – Huejutla – Pachuca

Avance global

- Programado: 29.95%
- Semanal: 0.57%
- Real: 25.48%
- Financiero: 18.36%

Avance 2025

- Programado: 95.83%
- Semanal: 1.80%
- Real: 81.52%
- Financiero: 50.16%

Inversión total 2025-2028: 6,674 mdp

- Hidalgo: 3,742 mdp
- SLP: 2,932 mdp

Inversión 2025: 2,443 mdp

Hidalgo: 1,613 mdp / 20.0 km y 5 puentes,

San Luis Potosí: 830 mdp / 10.0 km y 5 puentes

Meta total 2025-2028: 96 km

Hidalgo:

- Ampliación de 30 km A2
- Construcción de 3er carril en 39 km
- Construcción de 9 puentes

San Luis Potosí:

- Ampliación de 17 km A2
- Construcción de 10 km C2
- Construcción de 5 puentes

Inicio : 28 de abril 2025


Termino: diciembre 2028

Término meta 2025: diciembre 2025

20,022 empleos generados

+395 mil habitantes beneficiados

65 min de ahorro en tiempo

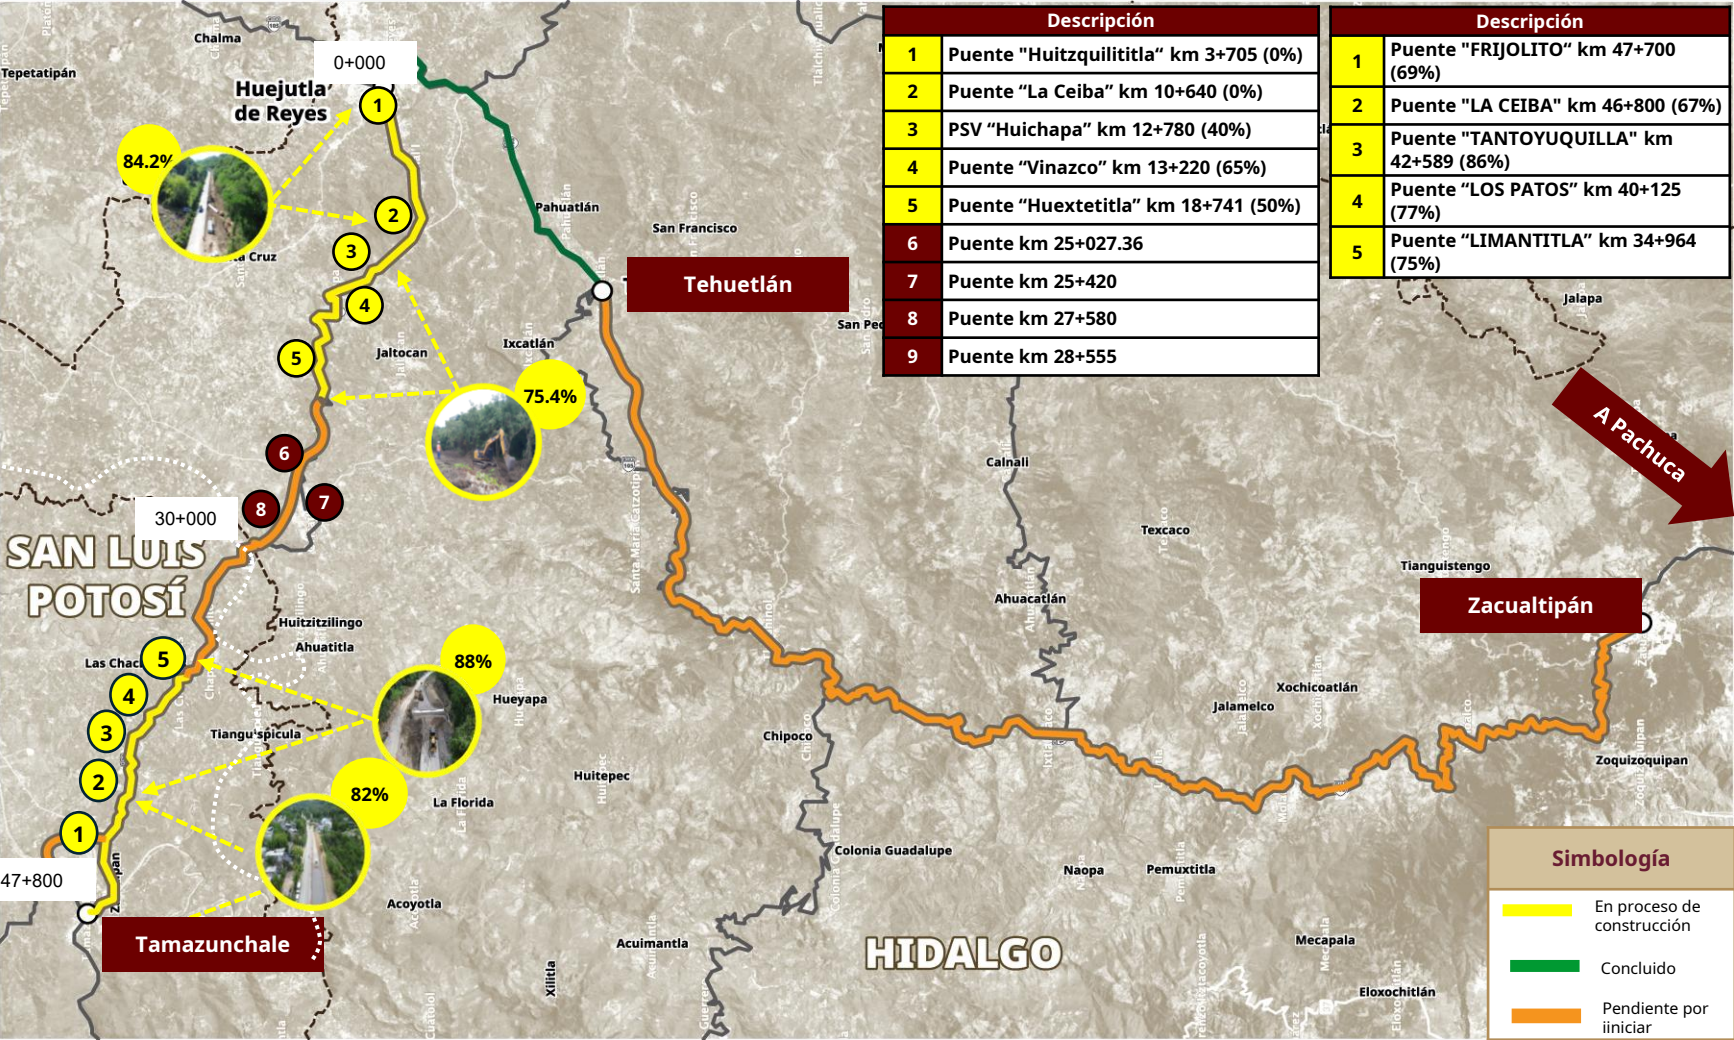

Tramo	Empresas
km 0+000 al km 10+000	<ul style="list-style-type: none">• Contratista: IMAGEN CORPORATIVA ATLANTA, S.A. DE C.V. E INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO INTEGRAL DICSSA, S.A. DE C.V.• Supervisión: CONSTRUCTORA SOCOE, S.A. DE C.V.
km 10+000 al km 20+000	<ul style="list-style-type: none">• Contratista: SÁNCHEZ VALDEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.• Supervisión: P.A.C.C.S.A. INGENIERÍA, S.A. DE C.V.
km 42+800 al km 38+820 y del km 35+160 al km 34+140	<ul style="list-style-type: none">• Contratista: Sánchez Valdez Construcciones, S.A. de C.V.• Supervisión: Servicios de Consultoría en Infraestructura Vial, S.A. de C.V.
km 47+800 al km 42+800	<ul style="list-style-type: none">• Contratista: Convenio Privado de Proposición Conjunta entre la Persona Moral The Fuentes Corporation Mexican Filial, S.A. de C.V. y Constructora Gervisur, S.A. de C.V.• Supervisión: Constructora Empresarial MEF, S.A. de C.V

San Luis Potosí

Tamazunchale – Huejutla

Km 34+140 al Km 35+160 y del Km 38+820 al Km 42+800

Elemento	Unidad	Meta	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 19/12/25 al 25/12/25		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
TERRACERÍAS								
Despalme	m³	31,718.00	31,718.0	100.00%	0.00	0.0	0.0	Trabajos concluidos
Cortes	m³	249,345.00	215,000.0	86.23%	34,345.00	34,345	20,000.0	
Terraplenes 90%	m³	127,937.00	95,000.0	74.26%	32,937.00	32,937	5,000.0	
Subyacente	m³	31,983.00	23,473.0	73.39%	8,510.00	8,510	0.0	
Subrasante	m³	13,572.00	9,748.0	71.82%	3,824.00	3,824	0.0	
OBRAS DE DRENAJE								
Obras de drenaje Tubería	pza.	11	11	100.00%	0	0	1.0	
Obras de drenaje losa	pza.	2	1	50.00%	1	1	0.0	
Obras de drenaje bóveda	pza.	2	1	50.00%	1	1	0.0	
PAVIMENTOS								
Base hidráulica	m³	14,685.00	6,980.0	47.53%	7,705.00	7,705	0.0	
Base asfáltica	m³	8,667.00	2,000.0	23.08%	8,667.00	6,667	0.0	
Carpeta asfáltica	m³	5,616.00	0	0.00%	5,616.00	5,616	0.0	
SEÑALAMIENTO								
Señalamiento definitivo	km	5	0	0.00%	5	2.5	0.0	

Km 42+800 al Km 47+800


Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 19/12/25 al 25/12/25		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
TERRACERÍAS								
Despalme	m²	26,738	25,950.00	97.05%	788.00	788.00	0.0	Trabajos del km 42+800 al km 43+000 y del km 44+900 al km 45+020
Cortes	m³	189,998.00	188,400.00	99.16%	1,598.00	1,598.00	0.0	Trabajos del km 42+800 al km 44+890 del km 45+060 al km 47+800
Terraplenes 90%	m³	24,931.00	24,600.00	98.67%	331.00	331.00	900.0	Trabajos del km 43+600 al km 43+660
Subyacente	m³	38,781.00	37,750.00	97.34%	1,031.00	1,031.00	0.0	Retrabajo 800 m³
Subrasante	m³	19,107.00	18,013.00	94.27%	1,094.00	1,094.00	0.0	Retrabajos 1200m³
OBRAS DE DRENAJE								
Obras de drenaje Tubería	pza.	10	10	100.0%	0	0	1.0	
Obras de drenaje losa	pza.	2	2	100.0%	0	0	1.0	
Obras de drenaje bóveda	pza.	2	1	50.0%	1	1	0.0	
PAVIMENTOS								
Base hidráulica	m³	14,718.00	13,293.00	90.3%	1,425.00	1,425	1,000.0	km 42+800 al km 44+890 del km 45+060 al km 47+800
Base asfáltica	m³	8,667.00	5,550.00	64.0%	3,117.00	2,926	900.0	Partida aún no iniciada
Carpeta asfáltica	m³	5,616.00	0	0.0%	5,616.00	5,474	0.0	Partida aún no iniciada
SEÑALAMIENTO								
Señalamiento definitivo	km	5	3.4	0.0%	5	0.80	0.0	



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Tamazunchale - Huejutla

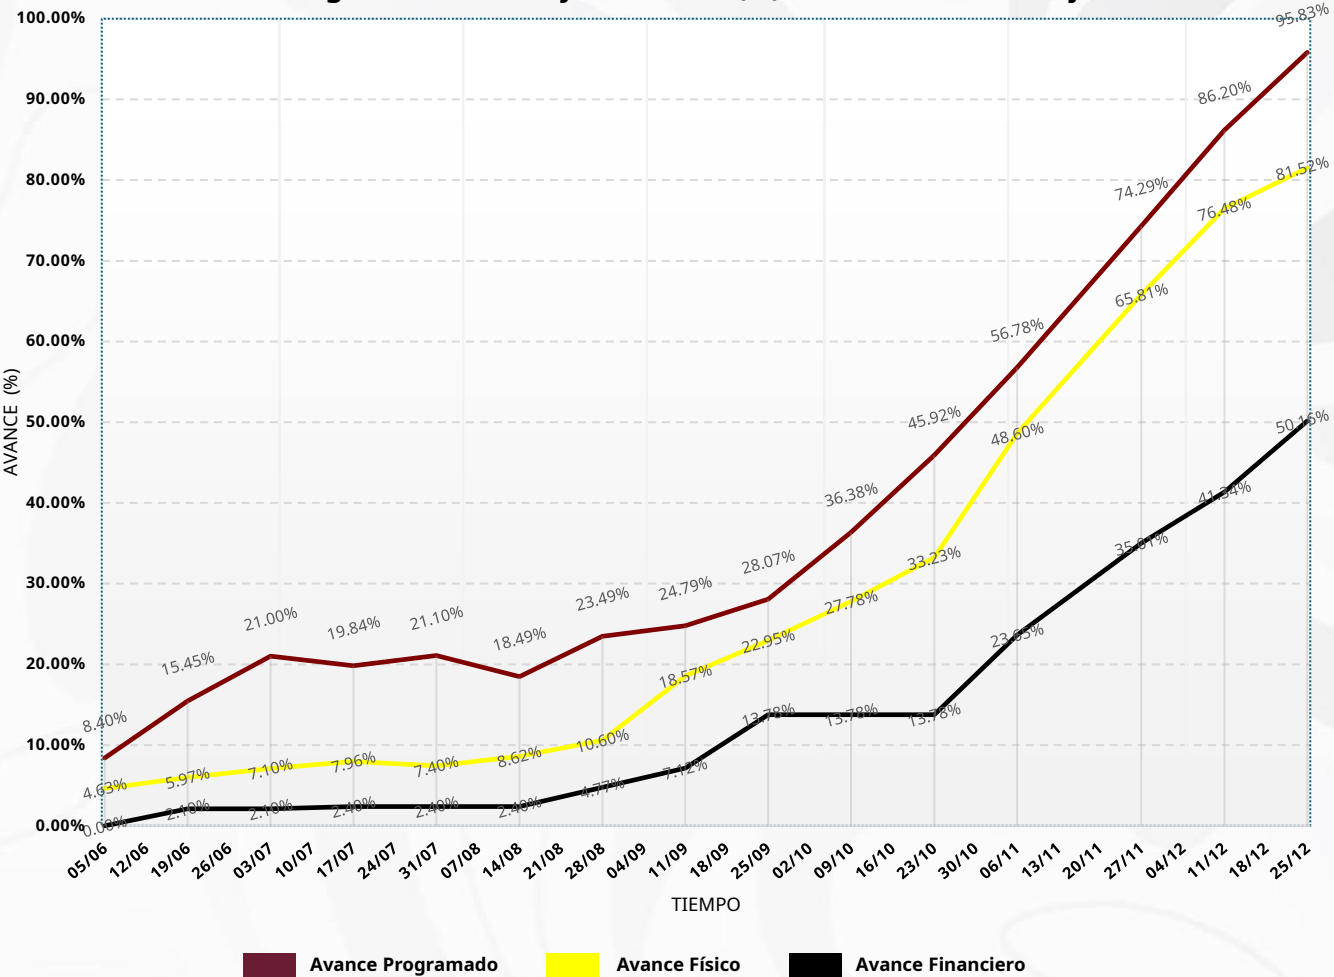

	12 de diciembre al 18 de diciembre	19 de diciembre al 25 de diciembre
Fuerza de Trabajo (personas)	456	475
Maquinaria	194	198
Frentes	39	40

San Luis Potosí - Hidalgo

Tamazunchale – Huejutla – Pachuca

km 0+000 al km 10+000

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	19/12/25 al 25/12/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Desmonte (Ha)	20.0	20.0	-	-	-	Concluido
Despalme (m3)	21,500.0	21,500.0	-	-	-	Concluido
Cortes (m3)	183,255.0	183,255.0	-	-	-	Concluido
Terraplén (m3)	42,250.0	42,250.0	-	-	-	Concluido
Subyacente (m3)	93,012.0	66,826.0	26,186.0	0.0	0.0	
Subrasante (m3)	36,638.0	31,135.0	5,503.0	0.0	0.0	
Excavación estructuras y O.D. (m3)	14,264.6	11,078.0	3,186.6	0.0	0.0	
Base hidráulica (m3)	30,000.0	12,647.0	17,353.0	1,810.34	0.0	
Base asfáltica (m3)	16,760.0	5,413.0	11,347.0	1,460.0	0.0	
Carpeta asfáltica (m3)	10,692.0	0.0	10,692.0	822.46	0.0	
Puentes peatonales (pza)	4.0	0.0	4.0	0.33	0.0	
Señalamiento (m)	43,334.0	0.0	43,334.0	8,666.8	0.0	

Nota: Esta semana no se llevaron a cabo trabajos derivado a bloqueos en la zona de los trabajos por conflictos sociales en el ejido de Chillilco.

km 10+000 al km 20+000

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	19/12/25 al 25/12/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Desmonte (Ha)	36.0	36.0	-	-	-	Concluido
Despalme (m3)	31,500.0	31,500.0	-	-	-	Concluido
Cortes (m3)	347,581.0	163,850.0	183,731.0	-	10,000.0	
Terraplén (m3)	251,735.0	105,700.0	146,035.0	-	9,000.0	
Subyacente (m3)	77,344.0	44,400.0	32,944.0	-	4,000.0	
Subrasante (m3)	32,248.0	22,000.0	10,248.0	-	2,000.0	
Excavación estructuras y O.D. (m3)	133,739.6	50,669.0	83,070.6	-	6,000.0	
Base hidráulica (m3)	30,000.0	3,940.0	26,060.0	1,750.0	400.0	
Base asfáltica (m3)	16,760.0	1,000.0	15,760.0	1,117.2	400.0	
Carpeta asfáltica (m3)	10,692.0	0.0	10,692.0	1,247.4	0.0	
Puentes peatonales (pza)	5.0	0.0	5.0	0.4	0.0	
Señalamiento (m)	43,334.0	0.0	43,334.0	8,666.8	0.0	



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



Avances físicos (San Luis Potosí)



Avances físicos (Hidalgo)
