

San Luis Potosí - Hidalgo

Tamazunchale – Huejutla – Pachuca

Avance global

- Programado: 9.28%
- Semanal: 0.8%
- Real: 7.17%
- Financiero: 3.42%

Avance 2025

- Programado: 28.07%
- Semanal: 2.57%
- Real: 22.95%
- Financiero: 13.78%

Inversión total 2025-2027: 6,674 mdp

- Hidalgo: 3,742 mdp
- SLP: 2,932 mdp

Inversión 2025: 2,443 mdp

Hidalgo: 1,613 mdp / 20.0 km y 5 puentes,

San Luis Potosí: 830 mdp / 10.0 km y 5 puentes

Meta total 2025-2028: 96 km

Hidalgo:

- Ampliación de 30 km A2
- Construcción de 3er carril en 39 km
- Construcción de 8 puentes

San Luis Potosí:

- Ampliación de 17 km A2
- Construcción de 10 km C2
- Construcción de 5 puentes

Inicio : 28 de abril 2025


Termino: diciembre 2028

Término meta 2025: diciembre 2025

20,022 empleos generados

+395 mil habitantes beneficiados

65 min de ahorro en tiempo

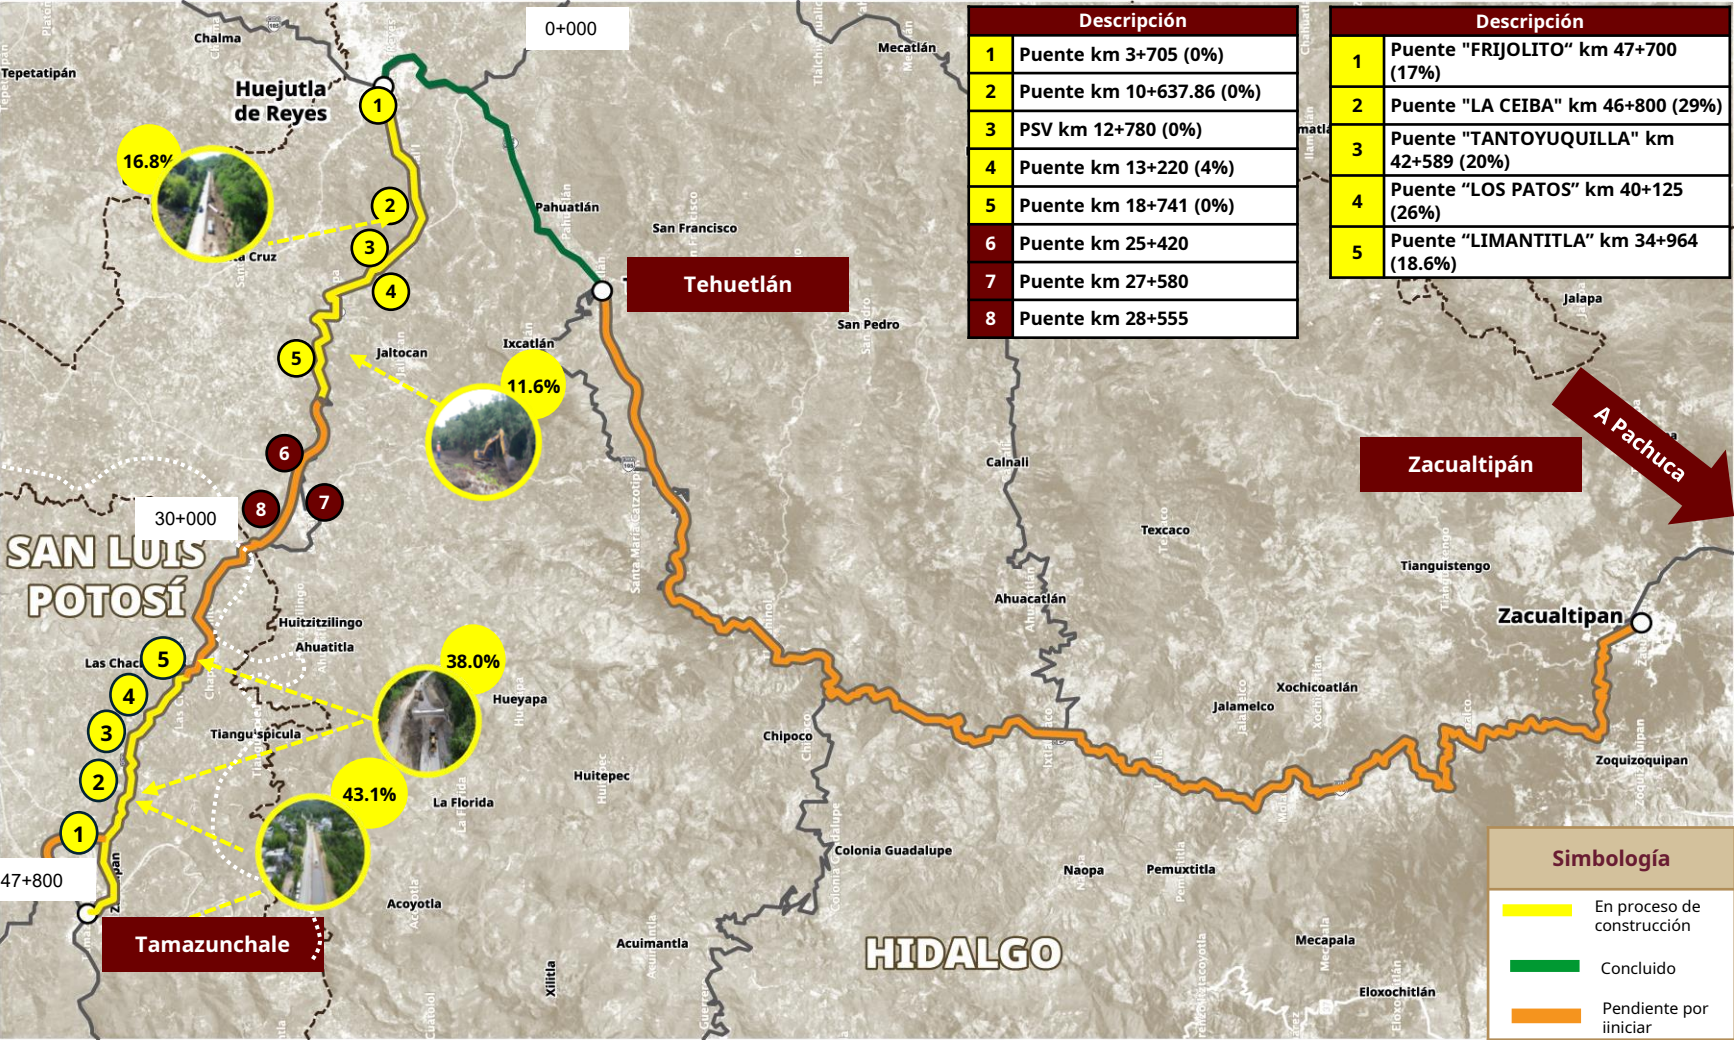

Tramo	Empresas
km 0+000 al km 10+000	<ul style="list-style-type: none">Contratista: IMAGEN CORPORATIVA ATLANTA, S.A. DE C.V. E INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO INTEGRAL DICSSA, S.A. DE C.V.Supervisión: CONSTRUCTORA SOCOE, S.A. DE C.V.
km 10+000 al km 20+000	<ul style="list-style-type: none">Contratista: SÁNCHEZ VALDEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.Supervisión: P.A.C.C.S.A. INGENIERÍA, S.A. DE C.V.
km 42+800 al km 38+820 y del km 35+160 al km 34+140	<ul style="list-style-type: none">Contratista: Sánchez Valdez Construcciones, S.A. de C.V.Supervisión: Servicios de Consultoría en Infraestructura Vial, S.A. de C.V.
km 47+800 al km 42+800	<ul style="list-style-type: none">Contratista: Convenio Privado de Proposición Conjunta entre la Persona Moral The Fuentes Corporation Mexican Filial, S.A. de C.V. y Constructora Gervisur, S.A. de C.V.Supervisión: Constructora Empresarial MEF, S.A. de C.V

San Luis Potosí

Tamazunchale – Huejutla



Km 34+140 al Km 35+160 y del Km 38+820 al Km 42+800


Elemento	Unidad	Meta	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 19/09/25 al 25/09/25		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
TERRACERÍAS								
Despalme	m³	31,718.00	28,061.10	88.47%	3,656.90	3,657	10,467.10	
Cortes	m³	249,345.00	98,237.00	39.40%	151,108.00	37,777	27,960.00	
Terraplenes 90%	m³	127,937.00	44,386.00	34.69%	83,551.00	20,888	9,800.00	
Subyacente	m³	31,983.00	10,455.00	32.69%	21,528.00	5,382	0.00	
Subrasante	m³	13,572.00	4,465.00	32.90%	9,107.00	1,485	0.00	
OBRAS DE DRENAJE								
Obras de drenaje Tubería	pza.	11	2	18.18%	9	2	0.00	
Obras de drenaje losa	pza.	2	1	50.00%	1	1	0.00	
Obras de drenaje bóveda	pza.	2	1	50.00%	1	1	0.00	
PAVIMENTOS								
Base hidráulica	m³	14,685.00	6,980.00	47.53%	7,705.00	1,101	0.00	
Base asfáltica	m³	8,667.00	0	0.00%	8,667.00	1,083	0.00	
Carpeta asfáltica	m³	5,616.00	0	0.00%	5,616.00	624	0.00	
SEÑALAMIENTO								
Señalamiento definitivo	km	5	0	0.00%	5	0	0.00	

Km 42+800 al Km 47+800

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 19/09/25 al 25/09/25		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
TERRACERÍAS								
Despalme	m³	26,738	25,300.00	94.62%	1,438.00	1,438.00	20,862.00	Trabajos del km 42+800 al km 43+487, del km 43+559 al 44+902 y Trabajos del km 42+800 al km 43+487, del km 43+559 al 44+902 y
Cortes	m³	164,998.00	115,900.00	70.24%	49,098.00	49,098.00	82,951.00	Trabajos del km 42+800 al km 43+487, del km 43+559 al 44+902 y
Terraplenes 90%	m³	24,931.00	22,000.00	88.24%	2,931.00	2,931.00	19,535.00	Trabajos del km 42+800 al km 43+487, del km 43+559 al 44+902 y
Subyacente	m³	22,150.00	17,200.00	77.65%	4,950.00	4,950.00	15,263.00	Trabajos del km 42+800 al km 43+487, del km 43+559 al 44+902 y del km 44+935 al km 47+800
Subrasante	m³	12,299.00	7,800.00	63.42%	4,499.00	4,499.00	6,738.20	Trabajos del km 42+800 al km 43+487, del km 43+559 al 44+902 y del km 44+935 al km 47+800
OBRAS DE DRENAJE								
Obras de drenaje Tubería	pza.	10	6	60.0%	4	6	2	Se trabaja en 6 obras de drenaje
Obras de drenaje losa	pza.	2	1	50.0%	1	1	0	
Obras de drenaje bóveda	pza.	2	1	50.0%	1	1	0	
PAVIMENTOS								
Base hidráulica	m³	14,685.00	3,700.00	25.2%	10,985.00	3,672	0	Se inician trabajos en el km 45+720 al km 45+900 y del km 46+820 al km 46+900
Base asfáltica	m³	8,667.00	0	0.0%	8,476.00	1,413	0	Partida aún no iniciada
Carpeta asfáltica	m³	5,616.00	0	0.0%	5,474.00	912	0	Partida aún no iniciada
SEÑALAMIENTO								
Señalamiento definitivo	km	5	0	0.0%	5	0	0	Proyecto recibido parcialmente

Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Tamazunchale - Huejutla

* Ajuste de porcentajes

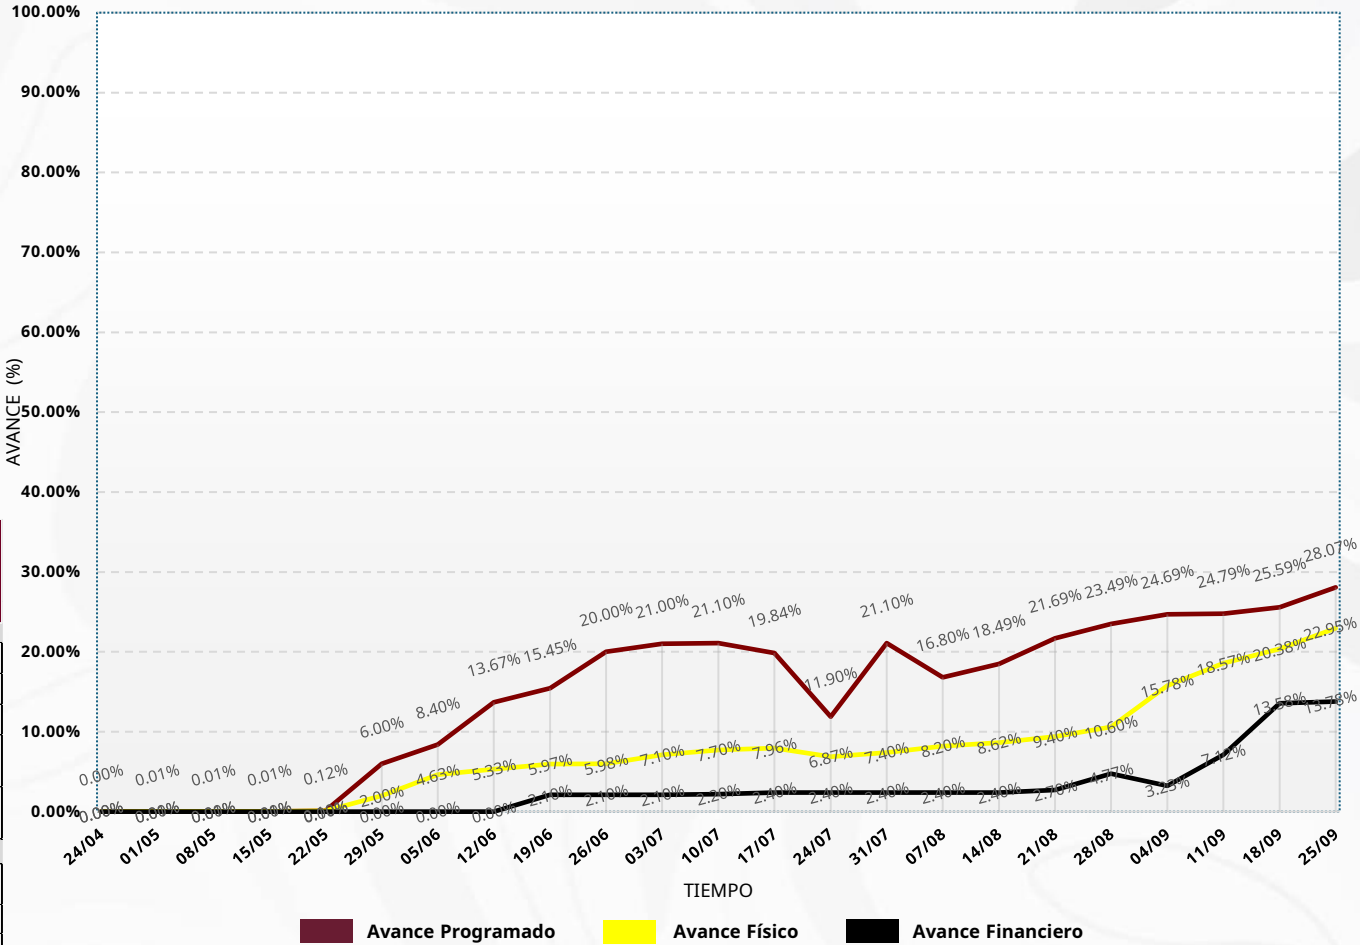

	12 de septiembre al 18 de septiembre	19 de septiembre al 25 de septiembre
Fuerza de Trabajo (personas)	309	318
Maquinaria	134	136

San Luis Potosí - Hidalgo

Tamazunchale – Huejutla – Pachuca

km 0+000 al km 10+000

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	19/09/25 al 25/09/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Desmonte	20 Ha	12.0 Ha	8.0 Ha	1.18 Ha	3.0 Ha	
Despalme	21,443 m3	11,400 m3	10,043 m3	1,261.35 m3	3,500 m3	
Cortes	183,255 m3	99,884.7 m3	83,370.3 m3	6,326.38 m3	35,500 m3	
Terraplén	42,250 m3	15,570 m3	26,680 m3	2,841.62 m3	8,400 m3	
Subyacente	93,012 m3	19,276 m3	73,736 m3	5,086.59 m3	4,150 m3	
Subrasante	36,638 m3	9,880 m3	26,758 m3	2,003.64 m3	3,500 m3	
Excavación estructuras y O.D.	14,264.6 m3	3,776 m3	10,488.6 m3	818.46 m3	1,150 m3	
Base hidráulica	30,000 m3	1,200 m3	28,800 m3	1,810.34 m3	1,200 m3	
Base asfáltica	16,760 m3	0 m3	16,760 m3	0 m3	0 m3	
Carpeta asfáltica	10,692 m3	0 m3	10,692 m3	0 m3	0 m3	
Puentes peatonales	4 pza	0 pza	4 pza	0 pza	0 pza	
Señalamiento	43,334 m	0 m	43,334 m	0 m	0 m	

km 10+000 al km 20+000

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	19/09/25 al 25/09/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Desmonte	36 Ha	17 Ha	19 Ha	0 Ha	3 Ha	
Despalme	31,500 m3	14,167 m3	17,333 m3	1,400 m3	3,200 m3	
Cortes	347,581 m3	37,850 m3	309,731 m3	16,215.3 m3	8,000 m3	
Terraplén	251,735 m3	15,200 m3	236,535 m3	11,747.9 m3	0 m3	
Subyacente	77,344 m3	400 m3	76,944 m3	3,609.2 m3	0 m3	
Subrasante	32,248 m3	0 m3	32,248 m3	1,505 m3	0 m3	
Excavación estructuras y O.D.	133,739.6 m3	569 m3	133,170.6 m3	7,281.4 m3	150 m3	
Base hidráulica	30,000 m3	0 m3	30,000 m3	1,750 m3	0 m3	
Base asfáltica	16,760 m3	0 m3	16,760 m3	1,117.2 m3	0 m3	
Carpeta asfáltica	10,692 m3	0 m3	10,692 m3	0 m3	0 m3	
Puentes peatonales	5 pza	0 pza	5 pza	0 pza	0 pza	
Señalamiento	43,334 m	0 m	43,334 m	0 m	0 m	



Gobierno de
México

ACTUALIZADA
Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



Avances físicos (San Luis Potosí)



Avances físicos (Hidalgo)
