

San Luis Potosí - Hidalgo

Tamazunchale – Huejutla – Pachuca

Avance global

- Programado: 10.22%
- Semanal: 0.65%
- Real: 7.82%
- Financiero: 3.42%

Avance 2025

- Programado: 32.71%
- Semanal: 2.06%
- Real: 25.01%
- Financiero: 13.78%

Inversión total 2025-2028: 6,674 mdp

- Hidalgo: 3,742 mdp
- SLP: 2,932 mdp

Inversión 2025: 2,443 mdp

Hidalgo: 1,613 mdp / 20.0 km y 5 puentes,

San Luis Potosí: 830 mdp / 10.0 km y 5 puentes

Meta total 2025-2028: 96 km

Hidalgo:

- Ampliación de 30 km A2
- Construcción de 3er carril en 39 km
- Construcción de 8 puentes

San Luis Potosí:

- Ampliación de 17 km A2
- Construcción de 10 km C2
- Construcción de 5 puentes

Inicio : 28 de abril 2025


Termino: diciembre 2028

Término meta 2025: diciembre 2025

20,022 empleos generados

+395 mil habitantes beneficiados

65 min de ahorro en tiempo

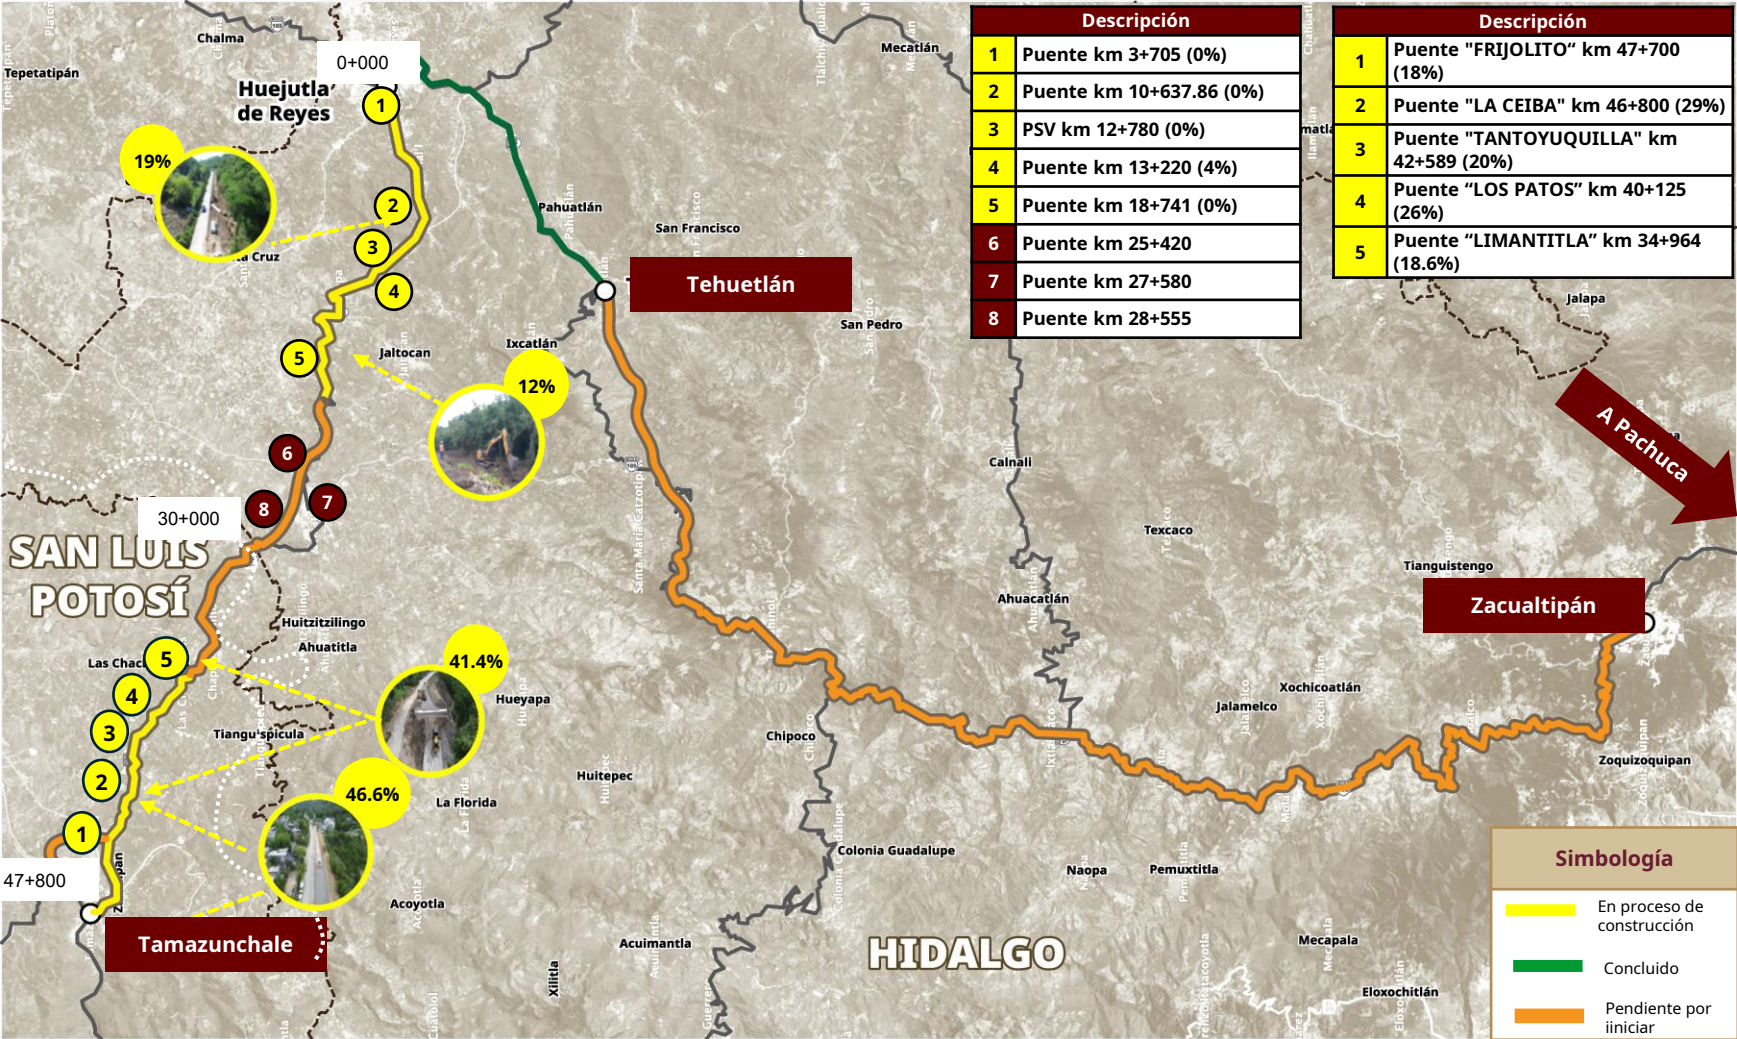

Tramo	Empresas
km 0+000 al km 10+000	<ul style="list-style-type: none">• Contratista: IMAGEN CORPORATIVA ATLANTA, S.A. DE C.V. E INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO INTEGRAL DICSSA, S.A. DE C.V.• Supervisión: CONSTRUCTORA SOCOE, S.A. DE C.V.
km 10+000 al km 20+000	<ul style="list-style-type: none">• Contratista: SÁNCHEZ VALDEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.• Supervisión: P.A.C.C.S.A. INGENIERÍA, S.A. DE C.V.
km 42+800 al km 38+820 y del km 35+160 al km 34+140	<ul style="list-style-type: none">• Contratista: Sánchez Valdez Construcciones, S.A. de C.V.• Supervisión: Servicios de Consultoría en Infraestructura Vial, S.A. de C.V.
km 47+800 al km 42+800	<ul style="list-style-type: none">• Contratista: Convenio Privado de Proposición Conjunta entre la Persona Moral The Fuentes Corporation Mexican Filial, S.A. de C.V. y Constructora Gervisur, S.A. de C.V.• Supervisión: Constructora Empresarial MEF, S.A. de C.V

San Luis Potosí

Tamazunchale – Huejutla


Km 34+140 al Km 35+160 y del Km 38+820 al Km 42+800

					Programado	Ejecutado	
TERRACERÍAS							
Despalme	m³	31,718.00	28,061.10	88.47%	3,656.90	3,657	0.00
Cortes	m³	249,345.00	108,236.00	43.41%	141,109.00	35,277	9,999.00
Terraplenes 90%	m³	127,937.00	54,386.00	42.51%	73,551.00	18,388	10,000.00
Subyacente	m³	31,983.00	10,455.00	32.69%	21,528.00	5,382	0.00
Subrasante	m³	13,572.00	4,465.00	32.90%	9,107.00	1,485	0.00
OBRAS DE DRENAJE							
Obras de drenaje Tubería	pza.	11	2	18.18%	9	2	0
Obras de drenaje losa	pza.	2	1	50.00%	1	1	0
Obras de drenaje bóveda	pza.	2	1	50.00%	1	1	0
PAVIMENTOS							
Base hidráulica	m³	14,685.00	4,242.40	28.89%	10,442.60	1,101	0.00
Base asfáltica	m³	8,667.00	0	0.00%	8,667.00	1,083	0.00
Carpeta asfáltica	m³	5,616.00	0	0.00%	5,616.00	624	0.00
SEÑALAMIENTO							
Señalamiento definitivo	km	5	0	0.00%	5	0	0.00

Km 42+800 al Km 47+800

					Programado	Ejecutado	
TERRACERÍAS							
Despalme	m³	26,738	25,300.00	94.62%	1,438.00	1,438.00	0.00
Cortes	m³	164,998.00	135,900.00	82.36%	29,098.00	29,098.00	20,000.00
Terraplenes 90%	m³	24,931.00	22,900.00	91.85%	2,031.00	2,031.00	900.00
Subyacente	m³	22,150.00	18,200.00	82.17%	3,950.00	3,950.00	1,000.00
Subrasante	m³	12,299.00	8,800.00	71.55%	3,499.00	3,499.00	1,000.00
OBRAS DE DRENAJE							
Obras de drenaje Tubería	pza.	10	6	60.0%	4	6	0
Obras de drenaje losa	pza.	2	1	50.0%	1	1	0
Obras de drenaje bóveda	pza.	2	1	50.0%	1	1	0
PAVIMENTOS							
Base hidráulica	m³	14,685.00	4,000.00	27.2%	10,685.00	3,573	300
Base asfáltica	m³	8,667.00	0	0.0%	8,667.00	1,695	0
Carpeta asfáltica	m³	5,616.00	0	0.0%	5,616.00	912	0
SEÑALAMIENTO							
Señalamiento definitivo	km	5	0	0.0%	5	0	0

Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Tamazunchale - Huejutla

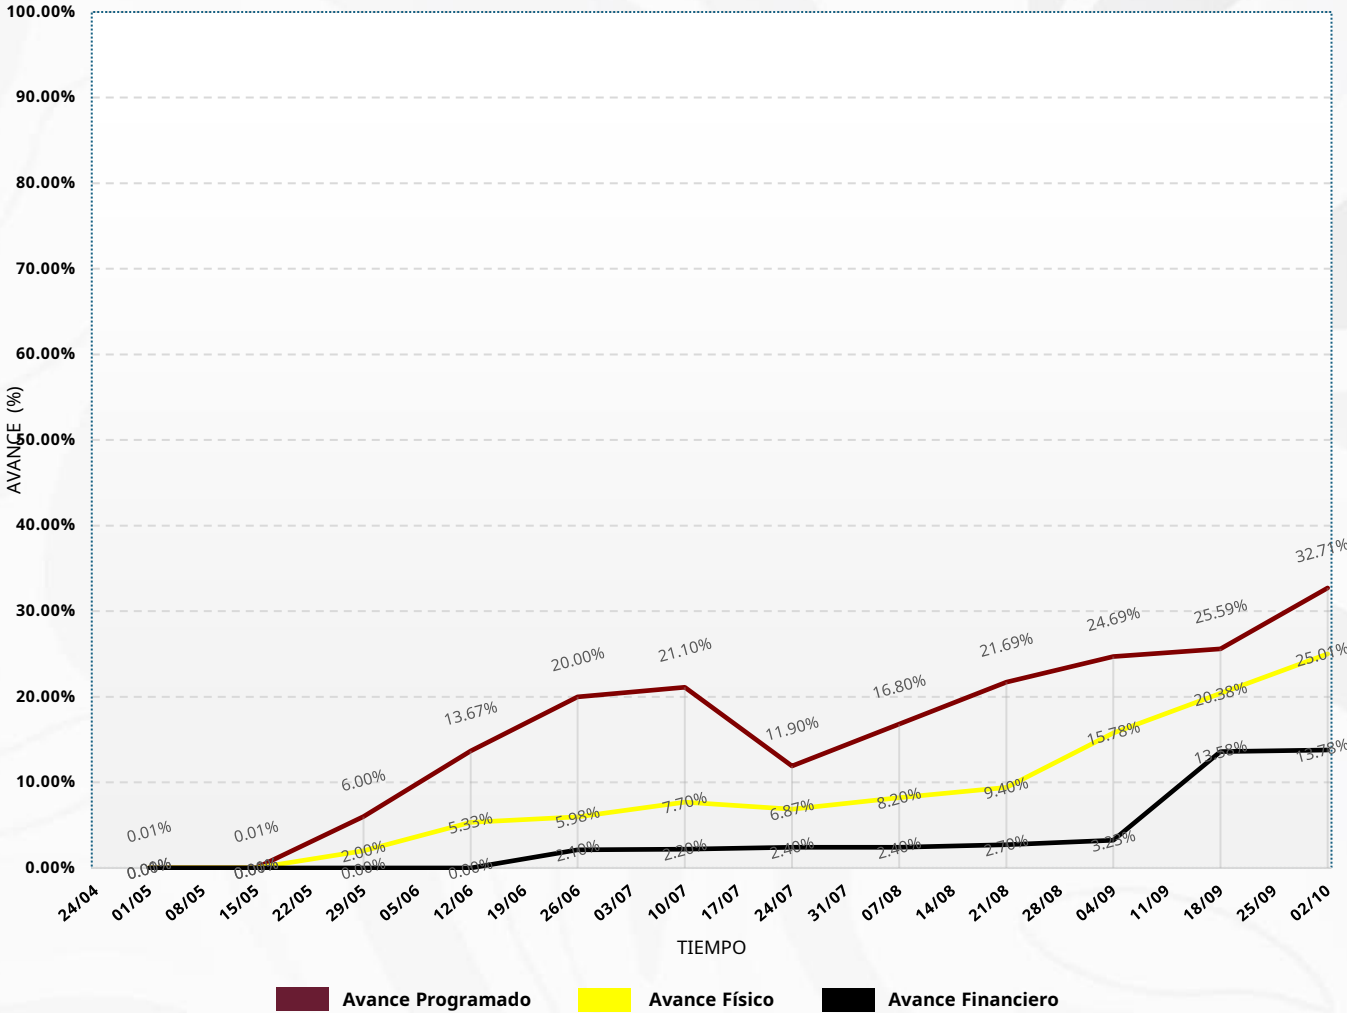

	19 de septiembre al 25 de septiembre	26 de septiembre al 02 de octubre
Fuerza de Trabajo (personas)	318	318
Maquinaria	136	136
