

San Luis Potosí - Hidalgo

Tamazunchale – Huejutla – Pachuca

- Avance global

• Programado: 31.25%

• Semanal: 0.55%

• Real: 28.14%


• Financiero: 19.74%
- Avance 2025

• Programado: 100%

• Semanal: 1.75%

• Real: 90.04%

• Financiero: 53.93%

- 

Inversión total 2025-2028: 6,674 mdp

• Hidalgo: 3,779 mdp


• SLP: 2,895 mdp

Meta total 2025-2028: 158 km

Hidalgo:

• 130 km

San Luis Potosí:

• 28 km
- 

Inversión 2025: 1,654 mdp


• Hidalgo: 826 mdp

• San Luis Potosí: 829 mdp

Meta 2025: 30 km

• Hidalgo: 20 km

• San Luis Potosí: 10 km



Inversión 2026: 1,878 mdp


• Hidalgo: 1,249 mdp

• San Luis Potosí: 629 mdp

Meta 2026: 32 km

• Hidalgo: 24 km


• San Luis Potosí: 7 km



Inicio : 28 de abril 2025

Termino: diciembre 2029

Término meta 2025: 28 de febrero de 2025

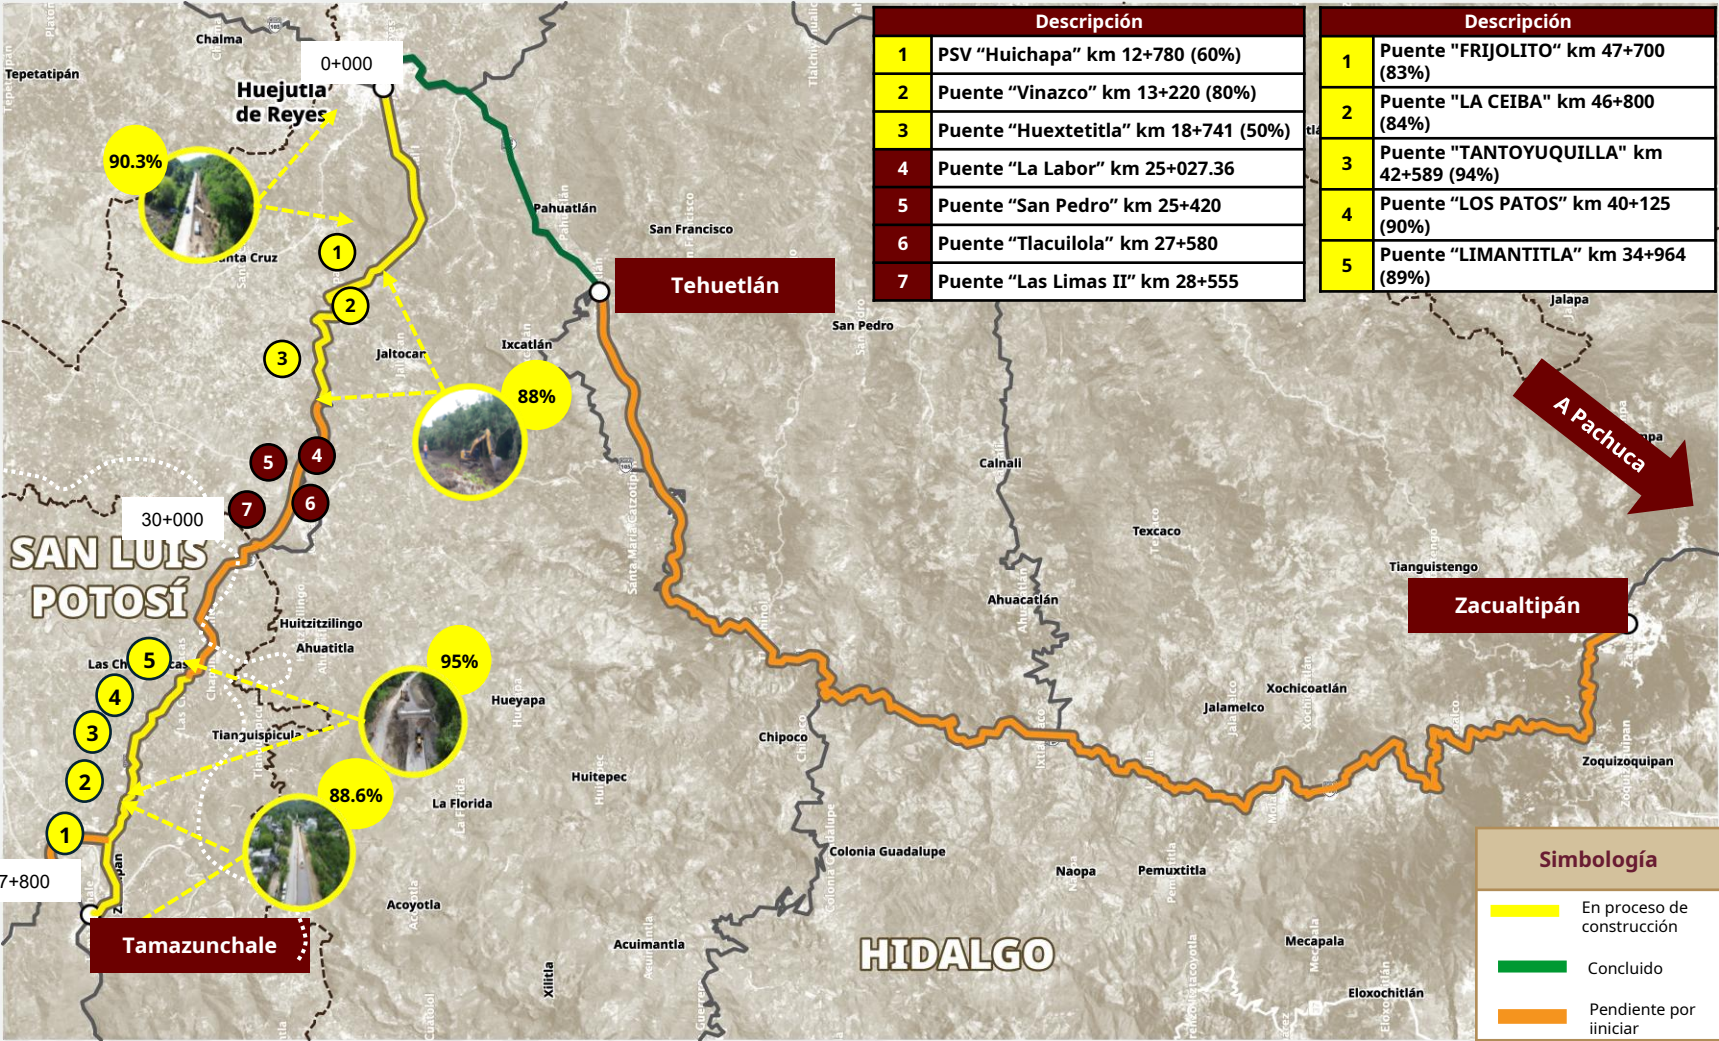


The map illustrates the proposed highway route from Tamazunchale to Pachuca, passing through Huejutla de Reyes and Tehuetlán. The route is color-coded: yellow for sections under construction, green for completed sections, and orange for sections pending start. Key locations marked include Tamazunchale, Huejutla de Reyes, Tehuetlán, Zacualtipán, and Pachuca. The map also shows the state boundaries of San Luis Potosí and Hidalgo. A legend in the bottom right corner explains the color coding: yellow for 'En proceso de construcción', green for 'Concluido', and orange for 'Pendiente por iniciar'.

Descripción	
1	PSV "Huichapa" km 12+780 (60%)
2	Puente "Vinazco" km 13+220 (80%)
3	Puente "Huextetitla" km 18+741 (50%)
4	Puente "La Labor" km 25+027.36
5	Puente "San Pedro" km 25+420
6	Puente "Tlacuilola" km 27+580
7	Puente "Las Limas II" km 28+555


Descripción	
1	Puente "FRIJOLITO" km 47+700 (83%)
2	Puente "LA CEIBA" km 46+800 (84%)
3	Puente "TANTOYUQUILLA" km 42+589 (94%)
4	Puente "LOS PATOS" km 40+125 (90%)
5	Puente "LIMANTITLA" km 34+964 (89%)

Simbología


 - En proceso de construcción
 - Concluido
 - Pendiente por iniciar



20,022 empleos generados



+395 mil habitantes beneficiados




65 min de ahorro en tiempo

San Luis Potosí

Tamazunchale – Huejutla

San Luis Potosí

Avance: Programado Físico Financiero (%): Pachuca - Huejutla

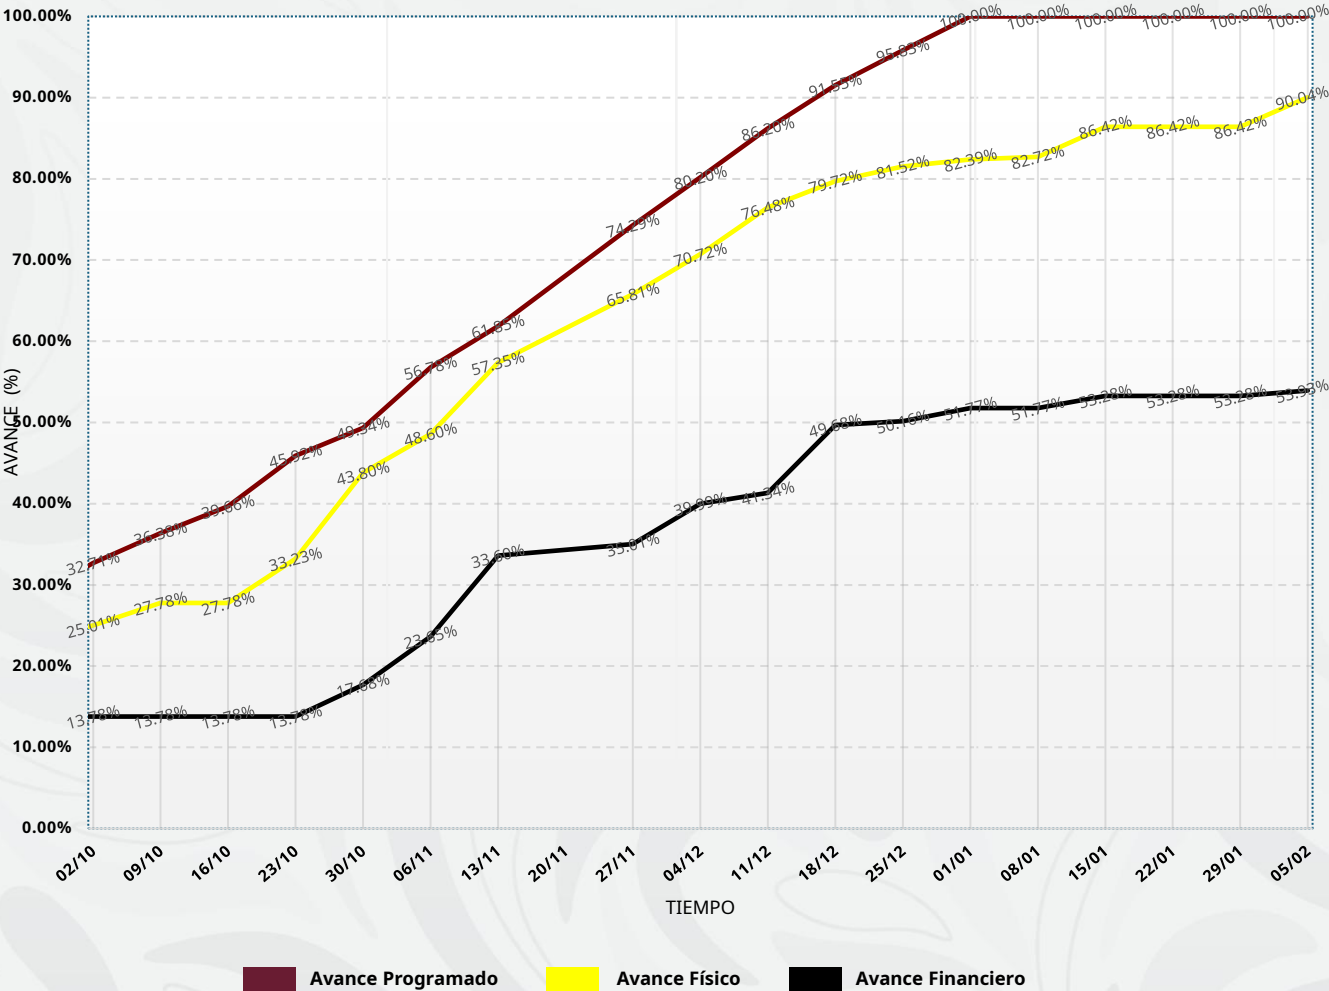

Km 34+140 al Km 35+160 y del Km 38+820 al Km 42+800								
Elemento	Unidad	Meta	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 30/01/2026 al 05/02/2026		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
TERRACERÍAS								
Despalme	m³	31,718.00	31,718.0	100.00%	0.00	0.0	0.0	Trabajos concluidos
Cortes	m³	249,345.00	249,345.0	100.00%	0.00	0	0.0	Trabajos concluidos
Terraplenes 90%	m³	127,937.00	127,937.0	100.00%	0.00	0	0.0	Trabajos concluidos
Subyacente	m³	31,983.00	31,983.0	100.00%	0.00	0	0.0	Trabajos concluidos
Subrasante	m³	13,572.00	13,572.0	100.00%	0.00	0	0.0	Trabajos concluidos
OBRAS DE DRENAJE								
Obras de drenaje Tubería	pza.	11	11	100.00%	0	0	0.0	Trabajos concluidos
Obras de drenaje losa	pza.	2	2	100.00%	0	0	0.0	Trabajos concluidos
Obras de drenaje bóveda	pza.	2	2	100.00%	0	0	0.0	Trabajos concluidos
PAVIMENTOS								
Base hidráulica	m³	14,685.00	14,685.0	100.00%	0.00	2,905	2,905.0	
Base asfáltica	m³	8,667.00	7,500.0	86.54%	1,167.00	2,167	1,000.0	
Carpeta asfáltica	m³	5,616.00	0	0.00%	5,616.00	5,616	0.0	
SEÑALAMIENTO								
Señalamiento definitivo	km	5	0	0.00%	5	5.0	0.0	

Km 42+800 al Km 47+800

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 30/01/2026 al 05/02/2026		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
TERRACERÍAS								
Despalme	m³	26,738	26,738.0	100.00%	0.00	0.00	0.0	Concluido
Cortes	m³	189,998.00	189,400.00	99.69%	598.00	598.00	0.0	Trabajos del km 44+900 al km 44+980
Terraplenes 90%	m³	24,931.00	24,600.00	98.67%	331.00	331.00	0.0	Trabajos del km 43+600 al km 43+660
Subyacente	m³	38,781.00	38,781.00	100.00%	0.00	531.00	531.0	Trabajos del km 42+800 al km 47+800
Subrasante	m³	19,107.00	18,713.00	97.94%	394.00	394.00	0.0	Trabajos del km 42+800 al km 47+800
OBRAS DE DRENAJE								
Obras de drenaje Tubería	pza.	10	10	100.0%	0	0	0.0	Concluido
Obras de drenaje losa	pza.	2	2	100.0%	0	0	0.0	Concluido
Obras de drenaje bóveda	pza.	2	2	100.0%	0	0	0.0	Concluido
PAVIMENTOS								
Base hidráulica	m³	14,718.00	14,293.00	97.1%	425.00	425	400.0	km 42+800 al km 44+890 del km 45+060 al km 47+800
Base asfáltica	m³	8,667.00	8,050.00	92.9%	617.00	426	400.0	Trabajos del km 42+800 al km 47+800
Carpeta asfáltica	m³	5,474.00	0	0.0%	5,474.00	5,474	0.0	Partida aún no iniciada
SEÑALAMIENTO								
Señalamiento definitivo	km	5	3.6	72.0%	1.40	0.80	0.0	Partida aún no iniciada

	23 de enero al 29 de enero	30 de enero al 05 de febrero
Fuerza de Trabajo (personas)	450	424
Maquinaria	199	194
Frentes	43	43

San Luis Potosí - Hidalgo

Tamazunchale – Huejutla – Pachuca

km 0+000 al km 10+000

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	30/01/26 al 05/02/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Desmonte (Ha)	20.0	20.0	-	-	-	Concluido
Despalme (m3)	21,500.0	21,500.0	-	-	-	Concluido
Cortes (m3)	183,255.0	183,255.0	-	-	-	Concluido
Terraplén (m3)	42,250.0	42,250.0	-	-	-	Concluido
Subyacente (m3)	93,012.0	84,252.0	8,760.0	0.0	6,930.0	
Subrasante (m3)	36,638.0	34,568.4	2,069.6	0.0	730.8	
Excavación estructuras y O.D. (m3)	14,264.6	12,927.5	1,337.1	0.0	661.5	
Base hidráulica (m3)	30,000.0	21,151.2	8,848.8	0.0	4,065.0	
Base asfáltica (m3)	16,760.0	10,223.2	6,536.8	0.0	2,307.0	
Carpeta asfáltica (m3)	10,692.0	1,221.6	9,470.4	0.0	0.0	
Puentes peatonales (pza)	4.0	0.5	3.5	0.0	0.2	
Señalamiento (m)	43,334.0	0.0	43,334.0	0.0	0.0	



Avances físicos (San Luis Potosí)

km 10+000 al km 20+000

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	30/01/26 al 05/02/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Desmonte (Ha)	36.0	36.0	-	-	-	Concluido
Despalme (m3)	31,500.0	31,500.0	-	-	-	Concluido
Cortes (m3)	347,581.0	225,850.0	121,731.0	0.0	15,000.0	
Terraplén (m3)	251,735.0	153,700.0	98,035.0	0.0	14,000.0	
Subyacente (m3)	77,344.0	61,400.0	15,944.0	0.0	3,000.0	
Subrasante (m3)	32,248.0	26,800.0	5,448.0	0.0	800.0	
Excavación estructuras y O.D. (m3)	133,739.6	87,669.0	46,070.6	0.0	12,000.0	
Base hidráulica (m3)	30,000.0	17,140.0	12,860.0	0.0	2,500.0	
Base asfáltica (m3)	16,760.0	7,600.0	9,160.0	0.0	2,000.0	
Carpeta asfáltica (m3)	10,692.0	0.0	10,692.0	0.0	0.0	
Puentes peatonales (pza)	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	
Señalamiento (m)	43,334.0	0.0	43,334.0	0.0	0.0	



Avances físicos (Hidalgo)
