

Guaymas – Esperanza – Yécora - Chihuahua



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



Inversión total: 10,228 mdp
Inversión 2025: 450mdp



Inicio : 20 de octubre de 2025
Termino: 28 de febrero de 2026
Término meta 2025: 28 de febrero de 2026



669,912 habitantes beneficiados



Meta total: 349 km
Meta 2025: 10 km, 4 puentes y 23 obras de drenaje.



55,473 empleos generados



Avance 2025

Avance Programado: 100.0 %
Avance Real: 59%
Avance Financiero: 48.0 %




Guaymas – Esperanza – Yécora - Chihuahua

Km 17+300 al Km 32+300

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	09-01-26 al 12-01-26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Trabajos preliminares (km)	9.97	9.97	-	-	-	-
Terracerías (km)	9.97	9.97	-	-	-	-
Obras de drenaje (Pza)	23	23	-	-	-	-
Pavimento (km)	9.97	3.48	6.49	0.65	0.65	-
Señalamiento (km)	9.97	-	9.97	-	-	-
Construcción Puente I (Canal alto)	100%	42.86%	57.14%	-	-	-
Construcción Puente II (Agua Caliente)	100%	38.10%	61.9%	3.33%	2.39%	-
Construcción Puente III (Chinito I)	100%	35.71%	64.29%	-	-	-
Construcción Puente IV (Chinito II)	100%	28.57%	71.43%	4.17%	3.57%	-

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

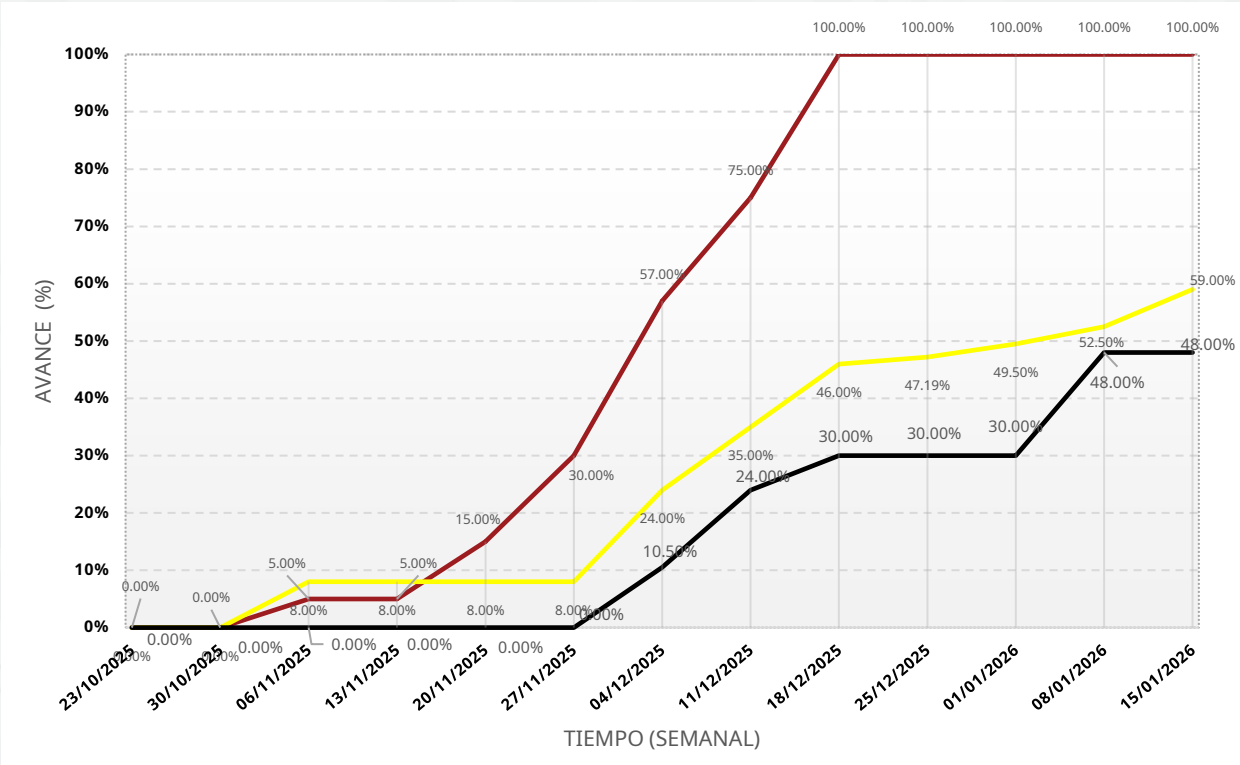

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	02 de enero al 08 de enero 2026	09 de enero al 15 de enero 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	328	328
Maquinaria	110	110
Frentes de trabajo	10	10
