

# Guaymas – Esperanza – Yécora - Chihuahua



Gobierno de  
**México**

**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



**2025**  
Año de  
La Mujer  
Indígena



**Inversión total:** 18,491 mdp  
**Inversión 2025:** 450 mdp



**Meta total:** 349 km  
**Meta 2025:** 10 km, 4 puentes  
y 23 obras de drenaje.



**Inicio :** 20 de octubre de 2025  
**Termino:** por definir  
**Término meta 2025:** diciembre  
de 2025



**55,473** empleos generados



**669,912** habitantes beneficiados



**Avance 2025**  
Avance Programado: 92.84%  
Avance Real: 45%  
Avance Financiero: 30%



# Guaymas – Esperanza – Yécora - Chihuahua

Km 17+300 al Km 32+300




Gobierno de  
**México**

**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

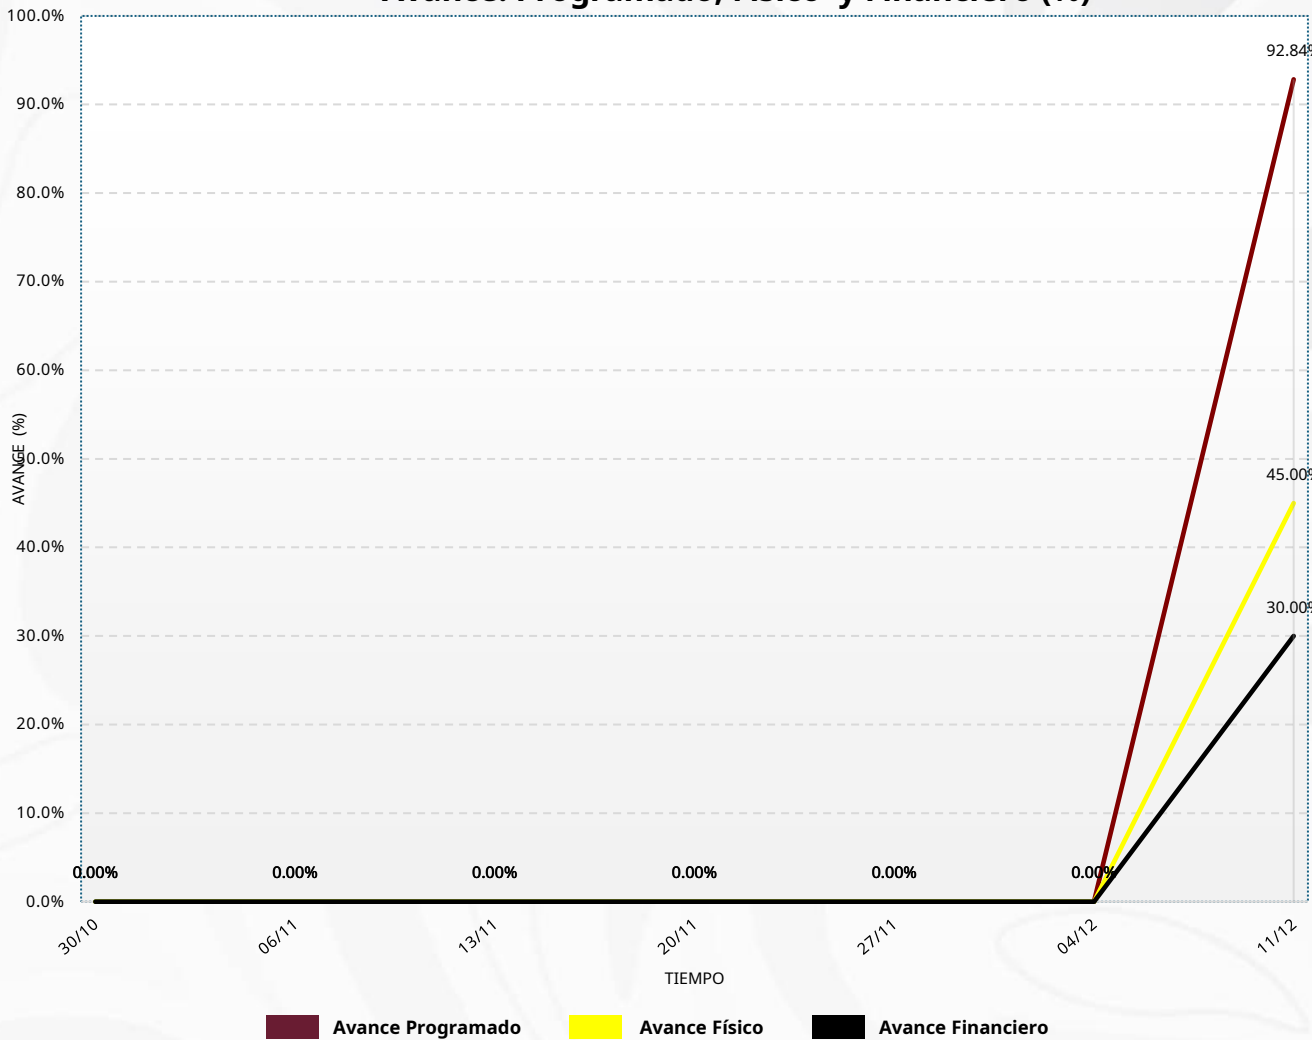

	05 de diciembre al 11 de diciembre
Fuerza de Trabajo (personas)	334
Maquinaria	110
Frentes de trabajo	10
