



Guerrero - Puebla

Eje Cuautla – Tlapa

Ramal Igualapa – Chilixtlahuaca - Alacatlitzala

1.- Edificaciones y Obras Civiles Romacal, S.A. de C.V. y Turboasfaltos, S.A. de C.V.

Meta: Km 35+340-km 41+000, incluye 1 puente
Inversión: 110.6 MDP C/IVA

2.- Constructora ALICAT, S.A. de C.V., Constructora ERAGT Creación, S.A. de C.V., Construcciones Gracida y Asociados, S.A. de C.V. y CODEMAZATL, S.A. de C.V.

Meta: Km 41+000-km 46+600 km
Inversión: 79.8 MDP C/IVA

3.- Construcción de Caminos y Proyectos Interestatales, S.A. de C.V.

Meta: Km 51+400-km 56+000 km
Inversión: 71.7 MDP C/IVA

4.- Constructora ERAGT CREACIÓN, S.A. de C.V., Grupo Comercializador EDELVA, S.A. de C.V., DAHNA Constructores, S.A. de C.V. y Lizbeth Reyes Villa

Meta: Km 80+800 – km 85+800
Inversión: 82.11 MDP C/IVA

5.- Moisés Martínez Mendoza, Grupos CYRMA MART, S.A. de C.V.

Meta: Km 85+800 – km 90+800
Inversión: 76.41 MDP C/IVA

6.- Puentes e Ingeniería Especializada de Puebla, S.A. de C.V. PIEPSA y Grupo Tauro Ingeniería y Transportes, S.A. de C.V.

Meta: Km 90+800 – km 95+800
Inversión: 57.56 MDP C/IVA

S1.- Grupo CORPCIT, S.A. de C.V.

Meta: Km 35+340 – km 46+000 y Km 51+400 – Km 56+000
Inversión: 6.40 MDP C/IVA

S2.- Constructora DEMSA, S.A. de C.V.

Meta: Km 80+800 – km 95+800
Inversión: 5.95 MDP C/IVA

Avance global

- Programado: 8.87%
- Real: 7.61%
- Semanal: 0.22%
- Financiero: 3.74%

Avance 2025

- Programado: 100.0%
- Real: 85.80%
- Semanal: 2.56%
- Financiero: 82.77%



Inversión total 2025-2029: 13,652 mdp

- Morelos: 529 mdp
- Puebla: 7,728 mdp
- Guerrero: 5,395 mdp



Meta total 2025-2029: 385 km

- Morelos: 26 km
- Puebla: 159 km
- Guerrero: 201 km



Inversión 2026: 3,148 mdp

- Guerrero: 750 mdp
- Puebla: 2,398 mdp



Meta 2026: 112 km

- Guerrero: 63 km
- Puebla: 49 km



Inicio: 16 de mayo 2025

Término: diciembre 2029

Termino meta 2025: 15 de febrero de 2026



40,956 empleos generados



7,750 habitantes beneficiados



1 hora de ahorro en tiempo



Se beneficiará a una población de 7,750 habitantes de los municipios de Igualapa, Cochoapa el Grande, Metlatonoc y Malinaltepec, reduciendo tiempos de traslado.




Guerrero - Puebla

Eje Cuautla – Tlapa

Ramal Igualapa – Chilixtlahuaca - Alacatlitzala

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	16-01-26 al 22-01-26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Trabajos preliminares (km)	30.90	0.00	0.0	0.0	0.0	Trabajos de topografía
Terracerías (km)	30.90	29.90	1.0	1.0	0.0	Desmonte -Despalme -Cortes Terraplenes
Obras de drenaje (Pza.)	141.0	141.0	0.0	2.0	2.0	obras de drenaje
Pavimento (km)	30.9	12.6	18.3	18.3	0.4	Tramos aislados de concreto hidráulico
Señalamient o (km)	30.9	3.0	27.9	27.9	0.5	

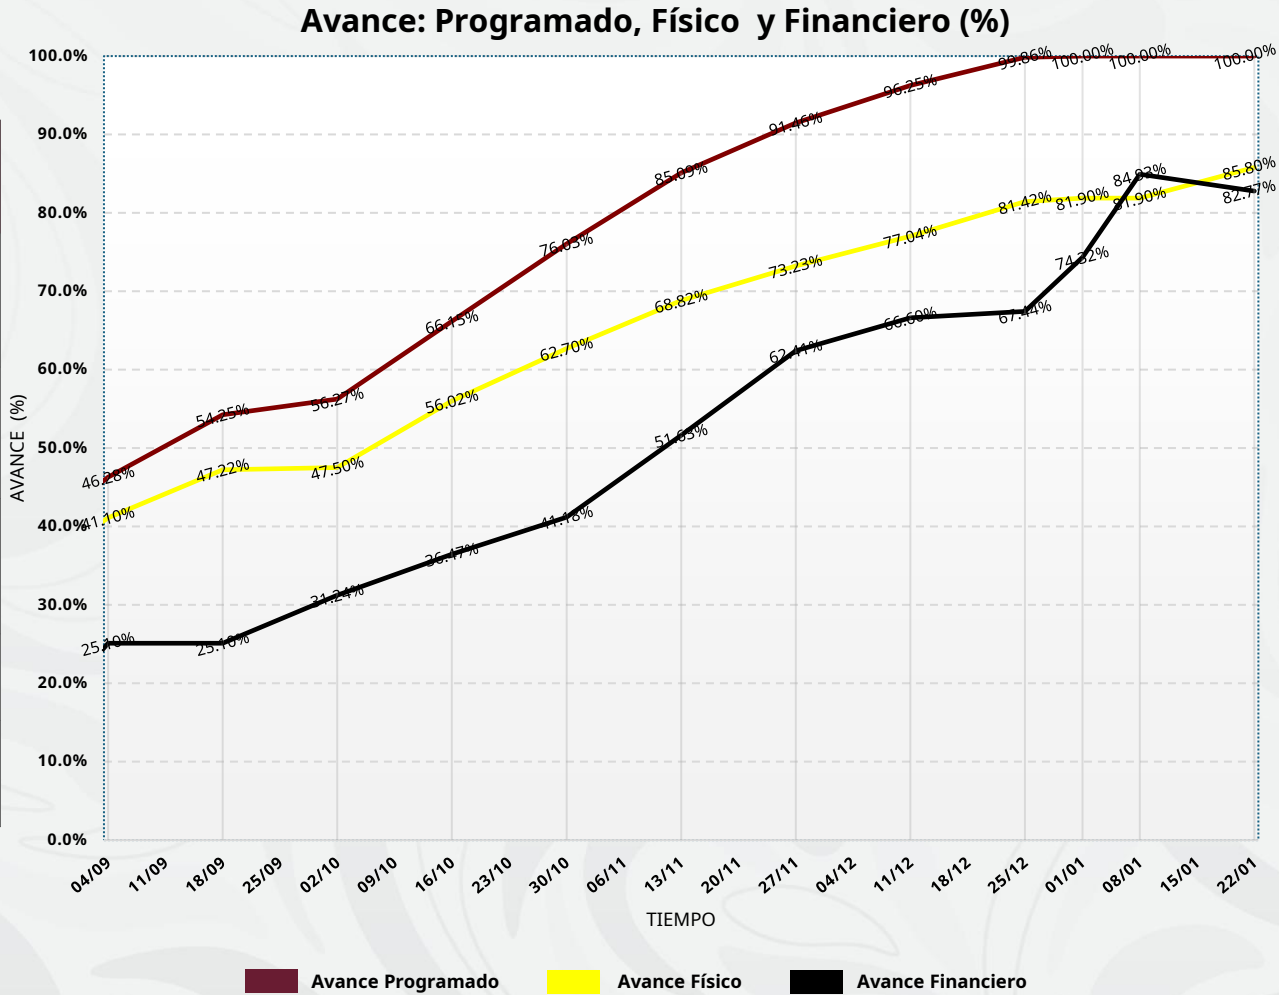

	09 al 15 de enero	16 al 22 de enero
Fuerza de Trabajo (personas)	426	327
Maquinaria	183	159
Frentes de trabajo	26	23
