

San Luis Potosí - Hidalgo

Tamazunchale – Huejutla – Pachuca

Avance global

• Programado: 24.78%

• Semanal: 0.38%

• Real: 23.20%

• Financiero: 20.40%


Avance 2025

• Programado: 100%

• Semanal: 1.53%

• Real: 93.62%

• Financiero: 82.31%



Inversión total 2025-2028: 6,674 mdp

• Hidalgo: 3,779 mdp

• SLP: 2,895 mdp

Meta total 2025-2028: 158 km

Hidalgo:

• 130 km

San Luis Potosí:

• 28 km



Inversión 2025: 1,654 mdp

• Hidalgo: 824 mdp

• San Luis Potosí: 830 mdp

Meta 2025: 30 km

• Hidalgo: 20 km

• San Luis Potosí: 10 km



Inversión 2026: 1,878 mdp


• Hidalgo: 1,249 mdp

• San Luis Potosí: 629 mdp

Meta 2026: 31 km

• Hidalgo: 24 km


• San Luis Potosí: 7 km




Inicio : 28 de abril 2025

Termino: diciembre 2029

Término meta 2025: 28 de febrero de 2025



20,022 empleos generados

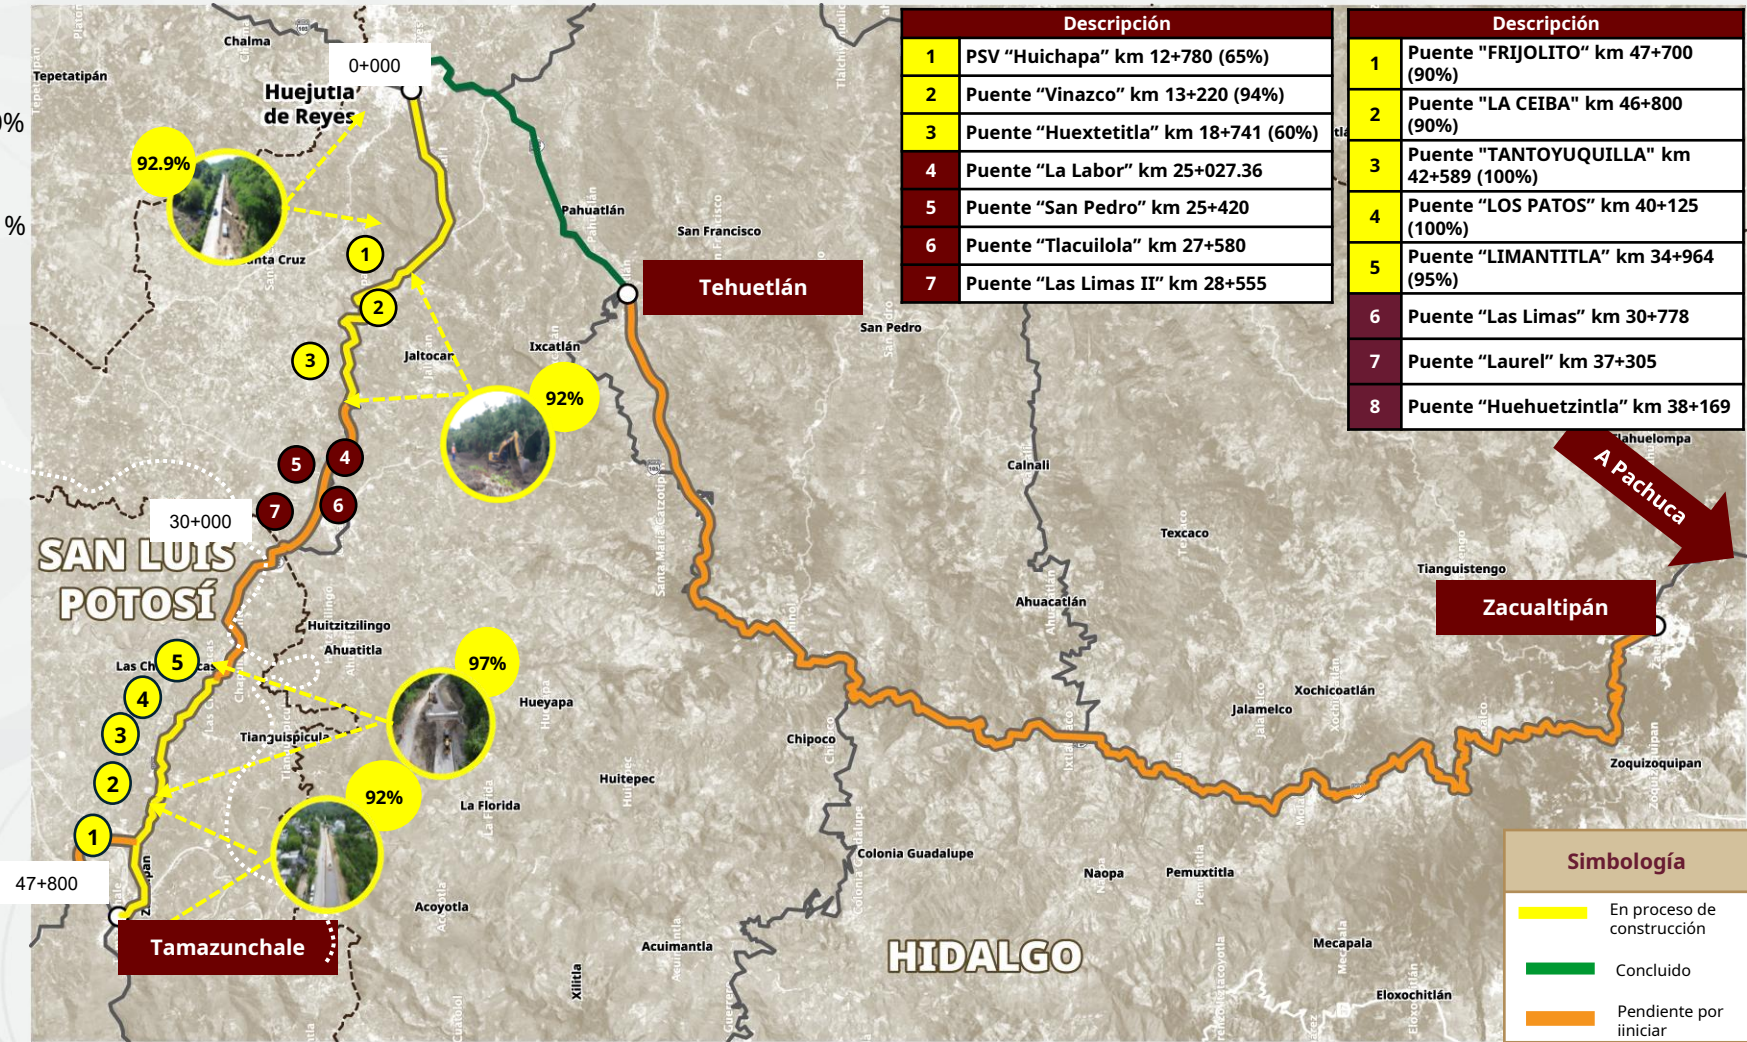

TDPA: 17,318 Veh/hr

+395 mil habitantes beneficiados en los municipios de Huejutla de Reyes, Jaltocán, Lolotla, Metztitlán, Molango de Escamilla, San Felipe Orizatlán, Tlanchinol, Xochicoatlán y Zacualtipán de Ángeles en Hidalgo y Tamazunchale, en San Luis Potosí.

65 min de ahorro en tiempo

Beneficios: Conecta de manera eficiente y segura el centro del país con la Sierra Hidalguense y la Huasteca Potosina.

San Luis Potosí

Tamazunchale – Huejutla


Km 34+140 al Km 35+160 y del Km 38+820 al Km 42+800

Elemento	Unidad	Meta	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 13/02/2026 al 19/02/2026		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
TERRACERÍAS								
Despalme	m³	31,718.00	31,718.0	100.00%	0.00	0.0	0.0	Trabajos concluidos
Cortes	m³	249,345.00	249,345.0	100.00%	0.00	0	0.0	Trabajos concluidos
Terraplenes 90%	m³	127,937.00	127,937.0	100.00%	0.00	0	0.0	Trabajos concluidos
Subyacente	m³	31,983.00	31,983.0	100.00%	0.00	0	0.0	Trabajos concluidos
Subrasante	m³	13,572.00	13,572.0	100.00%	0.00	0	0.0	Trabajos concluidos
OBRAS DE DRENAJE								
Obras de drenaje Tubería	pza.	11	11	100.00%	0	0	0.0	Trabajos concluidos
Obras de drenaje losa	pza.	2	2	100.00%	0	0	0.0	Trabajos concluidos
Obras de drenaje bóveda	pza.	2	2	100.00%	0	0	0.0	Trabajos concluidos
PAVIMENTOS								
Base hidráulica	m³	14,685.00	14,685.0	100.00%	0.00	0	0.0	Trabajos concluidos
Base asfáltica	m³	8,667.00	8,667.0	100.00%	0.00	0	0.0	Trabajos concluidos
Carpeta asfáltica	m³	5,616.00	550	9.79%	5,066.00	5,066	550.0	
SEÑALAMIENTO								
Señalamiento definitivo	km	5	0	0.00%	5	5.0	0.0	

Km 42+800 al Km 47+800

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 13/02/2026 al 19/02/2026		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
TERRACERÍAS								
Despalme	m³	26,738	26,738.0	100.00%	0.00	0.00	0.0	Concluido
Cortes	m³	189,998.00	189,998.00	100.00%	0.00	0.00	0.0	Concluido
Terraplenes 90%	m³	24,931.00	24,931.00	100.00%	0.00	0.00	331.0	Concluido
Subyacente	m³	38,781.00	38,781.00	100.00%	0.00	531.00	0.0	Concluido
Subrasante	m³	19,107.00	18,713.00	97.94%	394.00	394.00	0.0	Trabajos del km 42+800 al km 47+800
OBRAS DE DRENAJE								
Obras de drenaje Tubería	pza.	10	10	100.0%	0	0	0.0	Concluido
Obras de drenaje losa	pza.	2	2	100.0%	0	0	0.0	Concluido
Obras de drenaje bóveda	pza.	2	1.8	90.0%	0.2	0	0.2	Concluido
PAVIMENTOS								
Base hidráulica	m³	14,718.00	14,593.00	99.2%	125.00	125	300.0	km 42+800 al km 44+890 del km 45+060 al km 47+800
Base asfáltica	m³	8,667.00	8,350.00	96.3%	317.00	126	300.0	Trabajos del km 42+800 al km 47+800
Carpeta asfáltica	m³	5,474.00	1,580.00	28.9%	3,894.00	5,474	1,580.0	Partida aún no iniciada
SEÑALAMIENTO								
Señalamiento definitivo	km	5	3.6	72.0%	1.40	1.40	0.0	Partida aún no iniciada

Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Tamazunchale - Huejutla

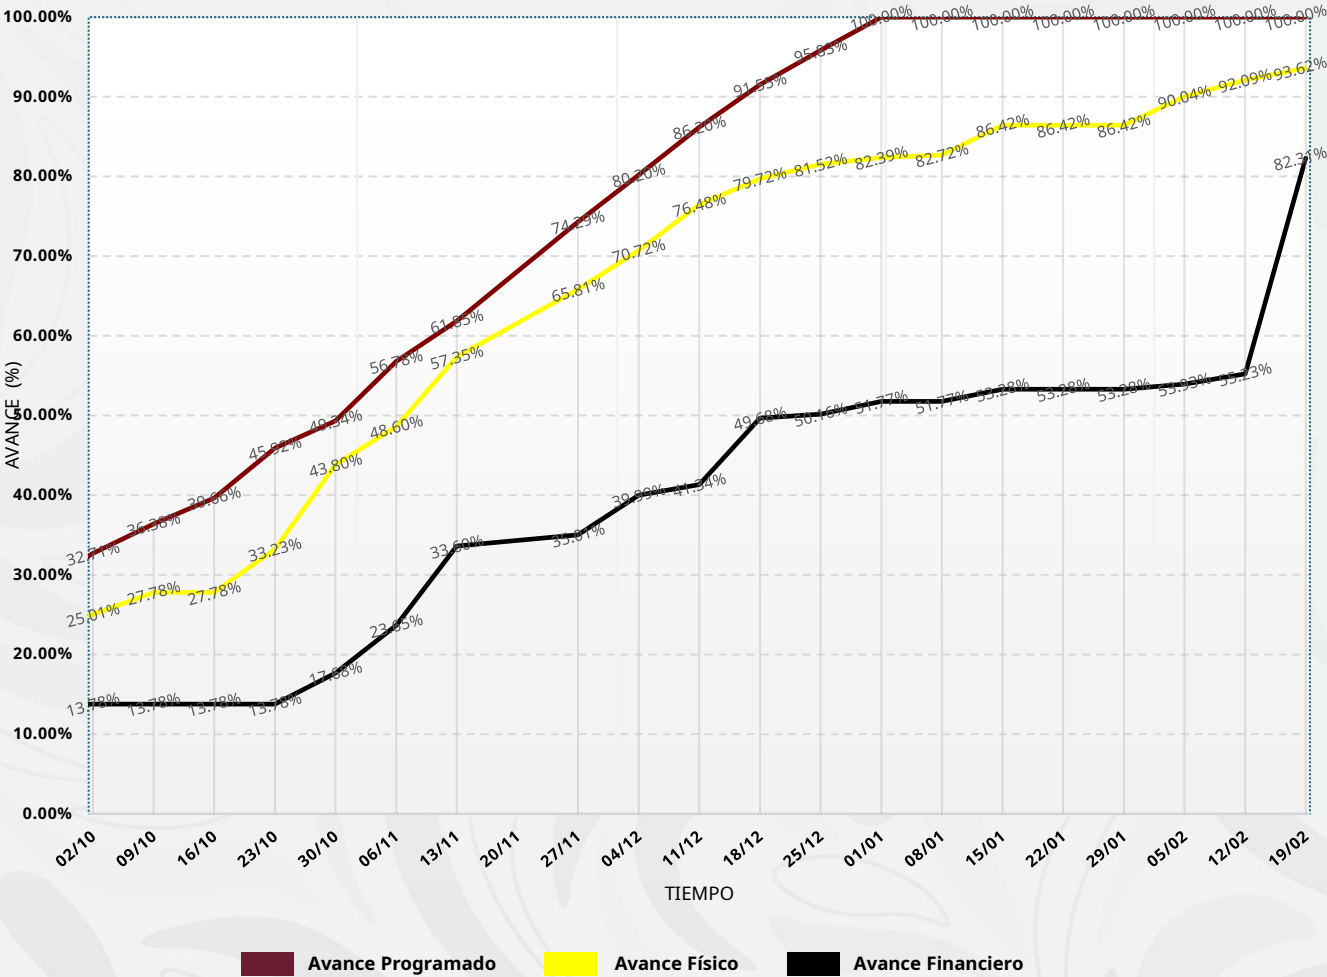

	06 de febrero al 12 de febrero	13 de febrero al 19 de febrero
Fuerza de Trabajo (personas)	425	432
Maquinaria	194	205
Frentes	44	44
