

Guerrero - Puebla

Eje Cuautla – Tlapa

Ramal Igualapa – Chilixtlahuaca - Alacatlatzala



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

*El Centro SICT Puebla, realizó una reducción de meta y monto.

Avance global

- Programado: 8.97%
- Real: 7.27%

1.- Edificaciones y Obras Civiles Romacal, S.A. de C.V. y Turboasfaltos, S.A. de C.V.

Meta: Km 35+340-km 41+000, incluye 1 puente
Inversión: 110.6 MDP C/IVA

2.- Constructora ALICAT, S.A. de C.V., Constructora ERAGT Creación, S.A. de C.V., Construcciones Gracida y Asociados, S.A. de C.V. y CODEMAZATL, S.A. de C.V.

Meta: Km 41+000-km 46+600 km
Inversión: 79.8 MDP C/IVA

3.- Construcción de Caminos y Proyectos Interestatales, S.A. de C.V.

Meta: Km 51+400-km 56+000 km
Inversión: 71.7 MDP C/IVA

4.- Constructora ERAGT CREACIÓN, S.A. de C.V., Grupo Comercializador ELELVA, S.A. de C.V., DAHNA Constructores, S.A. de C.V. y Lizbeth Reyes Villa

Meta: Km 80+800 – km 85+800
Inversión: 82.11 MDP C/IVA

5.- Moisés Martínez Mendoza, Grupos CYRMA MART, S.A. de C.V.

Meta: Km 85+800 – km 90+800
Inversión: 76.41 MDP C/IVA

6.- Puentes e Ingeniería Especializada de Puebla, S.A. de C.V. PIEPSA y Grupo Tauro Ingeniería y Transportes, S.A. de C.V.

Meta: Km 90+800 – km 95+800
Inversión: 57.56 MDP C/IVA

S1.- Grupo CORPCIT, S.A. de C.V.

Meta: Km 35+340 – km 46+000 y Km 51+400 – Km 56+000
Inversión: 6.40 MDP C/IVA

S2.- Constructora DEMSA, S.A. de C.V.

Meta: Km 80+800 – km 95+800
Inversión: 5.95 MDP C/IVA

Avance 2025

- Semanal: 0.27%
- Financiero: 3.27%

Avance 2025

- Programado: 100.0%
- Real: 81.90%
- Financiero: 74.32%



Meta total 2025-2029: 385km

- Morelos: 26 km
- Puebla: 159 km
- Guerrero: 201 km

Meta 2025: 34.2 km

Inversión total 2025-2029:

- 13,652 mdp.
- Morelos: 527 mdp
- Puebla: 7,669 mdp
- Guerrero: 5,456 mdp

Inicio: 16 de mayo 2025

Término: diciembre 2029
Termino meta 2025: diciembre

40,956 empleos generados

7,750 habitantes beneficiados

GUERRERO

1 hora de ahorro en tiempo

Se beneficiará a una población de 7,750 habitantes de los municipios de Igualapa, Cochoapa el Grande, Metlatonoc y Malinaltepec, reduciendo tiempos de traslado.

Guerrero - Puebla

Eje Cuautla – Tlapa


Ramal Igualapa – Chilixtlahuaca - Alacatlatzala



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	26-12-25 al 01-01-26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Trabajos preliminares (km)	30.90	0.00	0.0	0.0	0.0	Trabajos de topografía
Terracerías (km)	30.90	29.90	1.0	1.0	0	Desmonte -Despalme -Cortes Terraplenes
Obras de drenaje (Pza.)	141	139	2	2	0	obras de drenaje
Pavimento (km)	30.9	7.0	23.90	23.90	0	Tramos aislados de concreto hidráulico
Señalamiento (km)	30.9	0	30.9	30.90	0	-

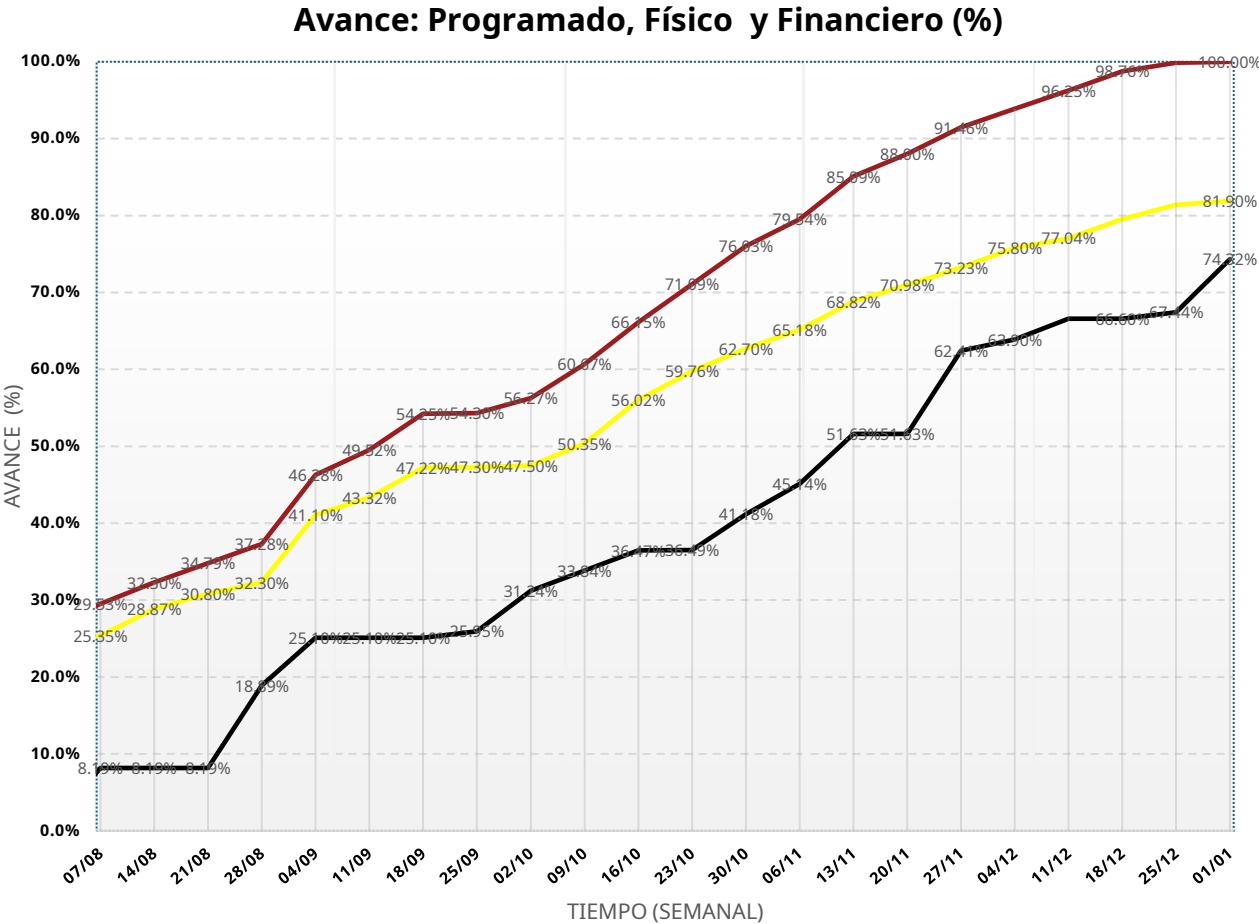

■ Avance Programado ■ Avance Físico ■ Avance Financiero

	19 al 25 de diciembre	26 de dic al 01 de enero
Fuerza de Trabajo (personas)	416	402
Maquinaria	168	162
Frentes de trabajo	27	22
