

# Sonora/Chihuahua

## Camino Límite Estados Chihuahua/Sonora-Pancho Villa-E.C. (Janos-Monte Verde)



Gobierno de  
México

Comunicaciones  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

<b>1.- Constructora URBATRAC, S.A. de C.V.</b>
Meta: Km 0+000-km 11+000, incluye entronque km 0+000 Inversión: 324.6 MDP C/IVA

<b>2.- ESMA Instalaciones, S.A. de C.V.</b>
Meta: Km 11+000-km 18+093 km Inversión: 306.2 MDP C/IVA

<b>3.- INNOVACIONES INTELIGENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN,S.A DE C.V Y CMCO,S.A DE C.V</b>
F. Km 6+900 Puente I, 122.0 m G. Km 14+700 Puente II, 61.5 m

<b>4.- CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PROYECTOS INTERESTATALES,S.A DE C.V</b>
Por modernizar a nivel de pavimento a 7.0 m Meta: Km 18+093 – km 29+093


<b>5.- La CIMA Terraceros, S.A. de C.V. y Estructuras y Excavaciones JM, S.A. de C.V.</b>
Meta: Km 29+093-KM 47+233 Inversión: 193.9 MDP C/IVA

<b>6.- MERP Edificaciones y Terracerías, S.A. de C.V.</b>
Meta: Km 47+233-Km 59+823 y Km 66+422-Km 66+829, incluye Boulevard y entronque a nivel. Inversión: 179.4 MDP C/IVA

<b>7.- Asfaltos y Triturados EL PUJAL, S.A. de C.V.</b>
<b>En proceso de construcción de 5 puentes:</b> A. Km 22+758 El Papalote, 30.0 m B. Km 25+758 Los Pilares, 40.0 m C. Km 33+832 Las Profesoras, 40.0 m D. Km 36+682 La Enramada, 30.0 m E. Km 38+362 La Pila, 120.0 m <b>Inversión:</b> 122.5 MDP C/IVA

### Avance físico

- Programado: 83%
- Real: 80.0%
- Semanal: 6.0%
- Financiero: 65.2%

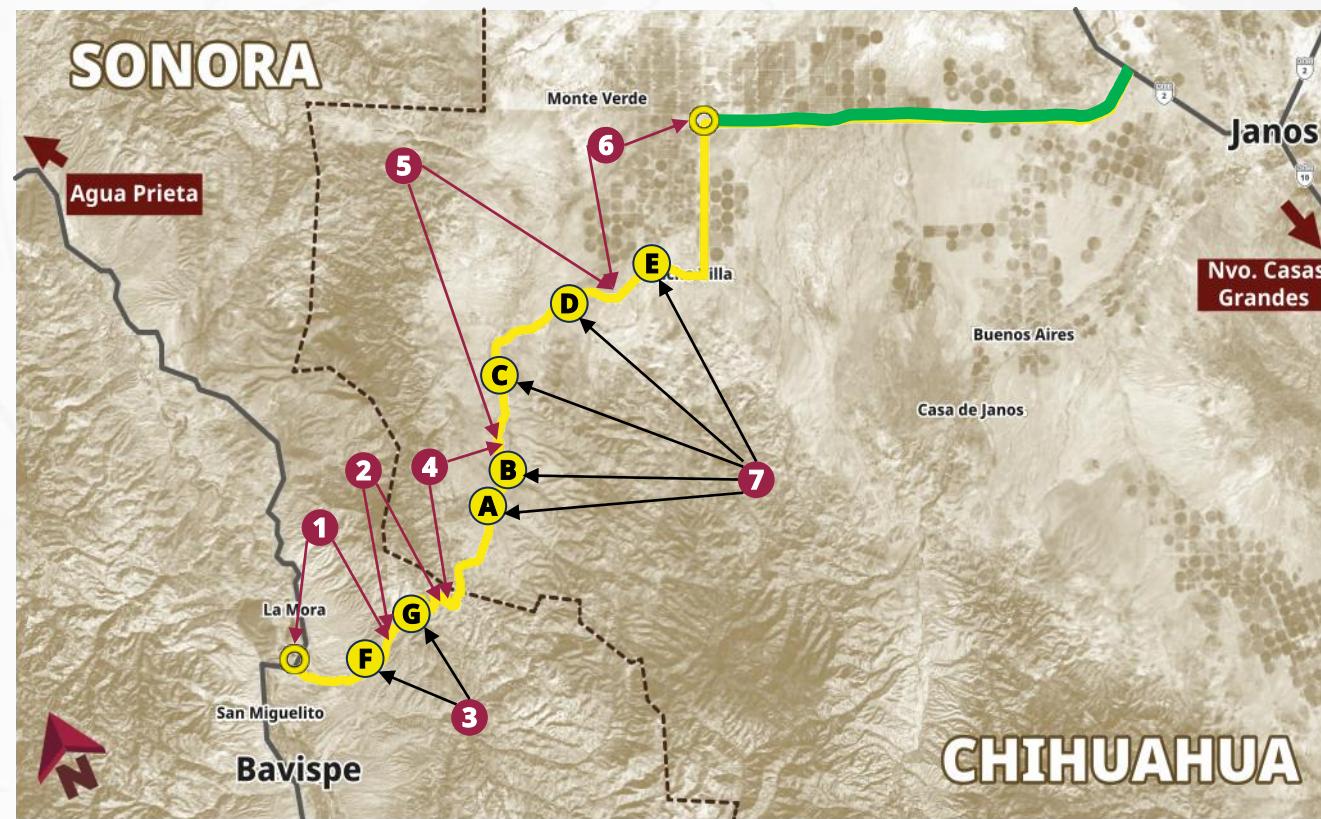

**Inversión total:** 1,859 mdp  
Sonora: 774.5 mdp  
Chihuahua: 1,084.5 mdp

**Inicio:** marzo, 2025  
**Término:** 30 Enero de 2026

**Meta total:** 67 km y 7 puentes  
• 6.6 km modernizados C,  
Chihuahua (se requiere  
trabajos complementarios)

**Meta pendiente:** 60.2 km y 7 puentes  
Sonora

- 18.1 km, ampliación C
- 2 puentes (184 m)

**Chihuahua**

- 42.1 km, ampliación C
- 5 puentes (320 m)

**5,577** empleos generados

**4,713** habitantes beneficiados

**90 minutos** de ahorro en tiempo

### S1.- CLAMI INGENIEROS, S.C

**Tramo:** del km 0+000 al km 11+000, puente Sonora I en el km 6+900  
**Inversión:** 6.1 MDP C/IVA

### S2.- NEDOX, S.A DE C.V

**Tramo:** del km 11+000 al km 18+093, puente Sonora II en el km 14+700  
**Inversión:** 6.8 MDP C/IVA

### S3.- JIDASA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V

**Tramo:** tramo del km 18+093 al km 29+093, 5 puentes Chihuahua  
**Inversión:** 7.5 MDP C/IVA

### S4.- GSM SUPERVISIÓN, PROYECTO E IMPACTO AMBIENTAL, S.A DE C.V

**Tramo:** tramo del km 29+093 al km 59+822, del km 66+422 al km 66+828  
**Inversión:** 7.5 MDP C/IVA

### S5.- GRUPO SELOME, S.A. DE C.V

**Tramo:** Manifestación de Impacto Ambiental y de Cambio de Uso de Suelo Forestal, Chihuahua  
**Inversión:** 6.7 MDP C/IVA

### S6.- PROVEEDORA DE INGENIERIA, INSTALACION E INFRAESTRUCTURA, S.A DE C.V

**Tramo:** implementación y ejecución de medidas de mitigación de la Manifestación de Impacto Ambiental, Sonora  
**Inversión:** 14.0 MDP C/IVA

### S7.- GRUPO CORPOSIIA, S.A. DE C.V.

**Tramo:** implementación y ejecución de medidas de mitigación de la Manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad regional, Sonora  
**Inversión:** 10.5 MDP C/IVA

# Sonora/Chihuahua

E.C. (Agua Prieta-Bavispe)-Pancho Villa-E.C.  
(Janos-Monte Verde)


Elemento44.9	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	05-12-25 al 11-12-25	
				Programado	Ejecutado
Ampliación: Tramo Sonora	18	75.30%	24.70%	0.31%	4.03%
Ampliación: Tramo Chihuahua	42	76.00%	31.19%	3.51%	7.19%
Construcción Puentes (Chihuahua)	5	48.62%	52.75%	2.42%	1.37%
Construcción Puentes (Sonora)	2	57.4%	42.6%	1.62%	5.8%



Gobierno de  
México

Comunicaciones  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance: Programado Físico Financiero (%) Bavispe

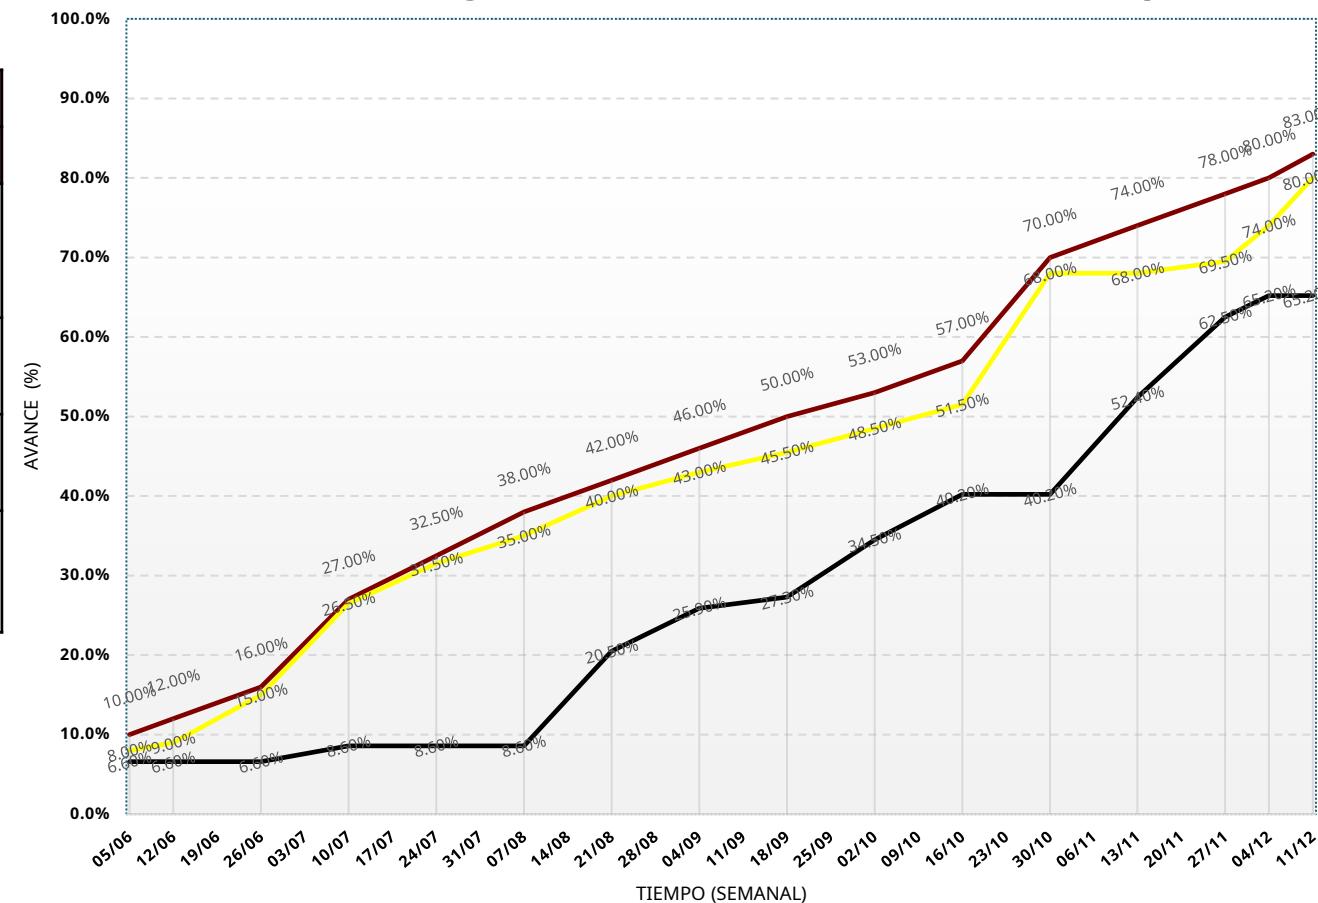

■ Avance Programado ■ Avance Físico ■ Avance Financiero

	28 de noviembre al 04 de diciembre	05 de diciembre al 11 de diciembre
Fuerza de Trabajo (personas)	840	840
Maquinaria	448	448
Frentes de trabajo	92	84
