

Guerrero - Puebla

Eje Cuautla – Tlapa

Ramal Igualapa – Chilixtlahuaca - Alacatlatzala



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance global

- Programado: 7.96%
- Real: 6.20%

- Semanal: 0.21%
- Financiero: 2.33%

1.- Edificaciones y Obras Civiles Romacal, S.A. de C.V. y Turboasfaltos, S.A. de C.V.

Meta: Km 35+340-km 41+000, incluye 1 puente
Inversión: 110.6 MDP C/IVA

2.- Constructora ALICAT, S.A. de C.V., Constructora ERAGT Creación, S.A. de C.V., Construcciones Gracida y Asociados, S.A. de C.V. y CODEMAZATL, S.A. de C.V.

Meta: Km 41+000-km 46+600 km
Inversión: 79.8 MDP C/IVA

3.- Construcción de Caminos y Proyectos Interestatales, S.A. de C.V.

Meta: Km 51+400-km 56+000 km
Inversión: 71.7 MDP C/IVA

4.- Constructora ERAGT CREACIÓN, S.A. de C.V., Grupo Comercializador ELELVA, S.A. de C.V., DAHNA Constructores, S.A. de C.V. y Lizbeth Reyes Villa

Meta: Km 80+800 – km 85+800
Inversión: 82.11 MDP C/IVA

5.- Moisés Martínez Mendoza, Grupos CYRMA MART, S.A. de C.V.

Meta: Km 85+800 – km 90+800
Inversión: 76.41 MDP C/IVA

6.- Puentes e Ingeniería Especializada de Puebla, S.A. de C.V. PIEPSA y Grupo Tauro Ingeniería y Transportes, S.A. de C.V.

Meta: Km 90+800 – km 95+800
Inversión: 57.56 MDP C/IVA

S1.- Grupo CORPCIT, S.A. de C.V.

Meta: Km 35+340 – km 46+000 y Km 51+400 – Km 56+000
Inversión: 6.40 MDP C/IVA

Avance 2025

- Programado: 88.00%
- Real: 70.98%

- Semanal: 2.16%
- Financiero: 51.63%



Meta total 2025-2029: 385km

- Morelos: 25.60 km
- Puebla: 158.70 km
- Guerrero: 201.16 km

Meta 2025: 33 km

Inversión total 2025-2029:

- 13.652 mdp.
- Morelos: 527 mdp
 - Puebla: 7,669 mdp
 - Guerrero: 5,456 mdp

Inicio: 16 de mayo 2025

Término: diciembre 2029

Termino meta 2025: diciembre

40,956 empleos generados

7,750 habitantes beneficiados

1 hora de ahorro en tiempo

Se beneficiará a una población de 7,750 habitantes de los municipios de Igualapa, Cochoapa el Grande, Metlatonoc y Malinaltepec, reduciendo tiempos de traslado.

S2.- Constructora DEMSA, S.A. de C.V.

Meta: Km 80+800 – km 95+800
Inversión: 5.95 MDP C/IVA

Guerrero - Puebla

Eje Cuautla – Tlapa


Ramal Igualapa – Chilixtlahuaca - Alacatlatzala



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	14-11-25 al 20-11-25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Trabajos preliminares (km)	30.90	0.00	0.0	0.0	0.0	Trabajos de topografía
Terracerías (km)	30.90	23.18	7.70	1.0	0.0	Desmonte -Despalme -Cortes Terraplenes
Obras de drenaje (Pza)	133	59	74	10	0.0	obras de drenaje
Pavimento (km)	30.9	0.1	30.8	0.5	0.0	-
Señalamiento (km)	30.9	0	30.9	0	0	-

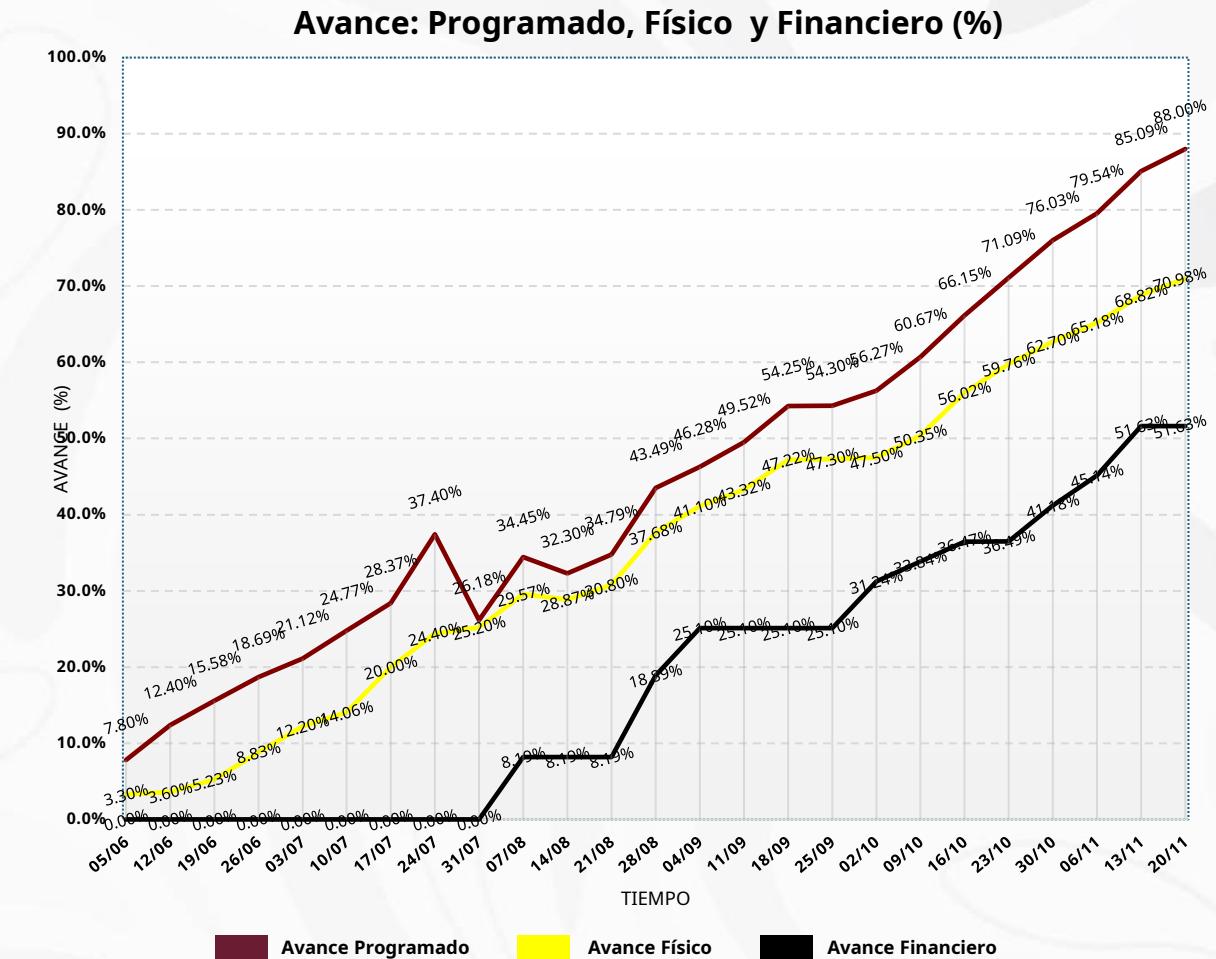

Avance Programado

Avance Físico

Avance Financiero

	07 al 13 de noviembre	14 de noviembre al 20 de noviembre
Fuerza de Trabajo (personas)	352	375
Maquinaria	173	179
