

Guaymas – Esperanza – Yécora - Chihuahua



Inversión total: 18,491 mdp
Inversión 2025: 450 mdp



Inicio : 20 de octubre de 2025
Termino: por definir
Término meta 2025: 28 de febrero de 2026



Meta total: 349 km
Meta 2025: 10 km, 4 puentes y 23 obras de drenaje.



55,473 empleos generados



669,912 habitantes beneficiados



Avance 2025
Avance Programado: 100.0 %
Avance Real: 52.5%
Avance Financiero: 30.0 %




Guaymas – Esperanza – Yécora - Chihuahua

Km 17+300 al Km 32+300



Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	02-01-26 al 08-01-26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Trabajos preliminares (km)	9.97	9.97	-	-	-	-
Terracerías (km)	9.97	9.97	-	-	-	-
Obras de drenaje (Pza)	23	23	-	-	-	-
Pavimento (km)	9.97	2.83	7.14	0.30	0.43	-
Señalamiento (km)	9.97	-	9.97	-	-	-
Construcción Puente I (Canal alto)	100%	42.86%	57.14%	0.00%	0.00%	-
Construcción Puente II (Agua Caliente)	100%	35.71%	64.29%	0.00%	0.00%	-
Construcción Puente III (Chinito I)	100%	35.71%	64.29%	0.00%	0.00%	-
Construcción Puente IV (Chinito II)	100%	25.00%	75.00%	0.00%	0.00%	-

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

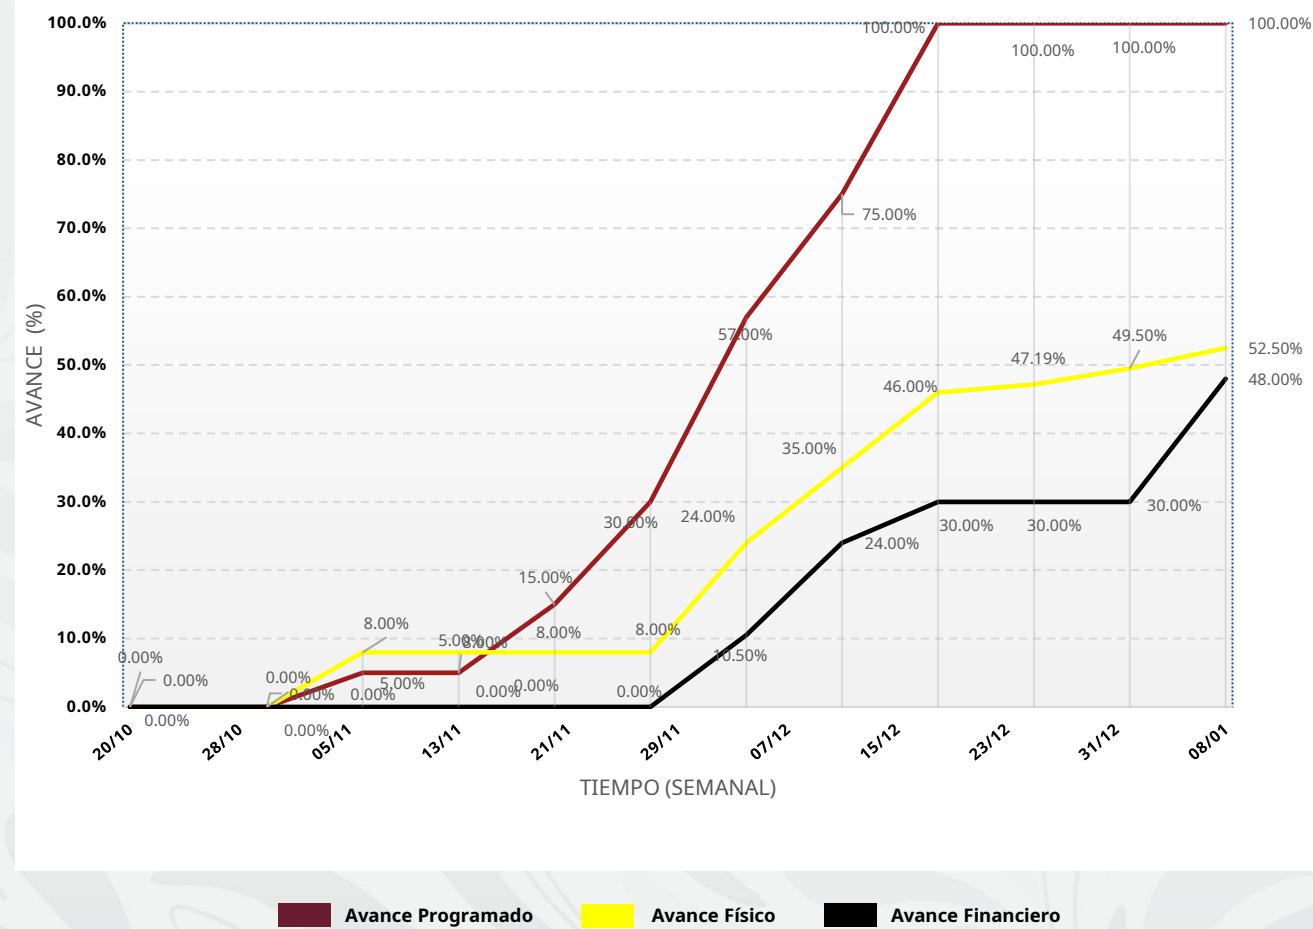

	26 de diciembre al 01 de enero	02 de enero al 08 de enero 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	328	328
Maquinaria	110	110
Frentes de trabajo	10	10
