

Tabasco-Campeche

Macuspana-Escárcega (Carretera Federal 186)

Tramo Tabasco

Km 48+000 – km 60+000 y km 293+000 al 297+000


Elemento	Intervención	Unidad	Ejecutado	Faltante	28/11/25 al 04/12/25	
			acumulado		Programado	Ejecutado
Desmonte	22.16	ha	21.65	0.51	0.50	0.13
Despalme	52,429.31	m³	50,703.31	1,726.00	1,500.00	910.00
Cortes	293,324.73	m³	290,339.14	2,985.59	3,126.00	3,517.00
Pedraplén	118,371.92	m³	116,737.08	1,634.84	1,428.00	4,790.00
Terraplén	328,912.88	m³	314,945.46	13,967.42	5,185.20	588.80
Subyacente	210,880.17	m³	208,668.57	2,211.60	5,403.74	5,886.00
Subrasante	111,198.40	m³	109,178.66	2,019.74	5,550.40	3,429.00
Base Hidráulica	123,271.69	m³	110,357.83	12,913.86	8,690.81	5,055.83
Base Asfáltica	53,105.32	m³	46,266.03	6,839.29	4,279.80	2,646.37
Carpeta Asfáltica	40,454.83	m³	23,370.52	17,084.31	2,832.71	3,441.00
Obras de drenaje	65.00	pza	63.00	2.00	3.80	1.00
Obras complementarias	24.00	km	16.80	7.20	3.50	2.45
Barrera central	9.16	km	6.02	3.14	0.20	1.94
Diafragmas	128.00	pza	128.00	0.00	7.20	28.00
Losa	8.00	pza	8.00	0.00	2.00	1.00
Guarnición	255.40	m	237.05	18.35	65.00	17.00
Parapeto	255.40	m	229.70	25.70	64.50	102.00



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Macuspana - Escárcega

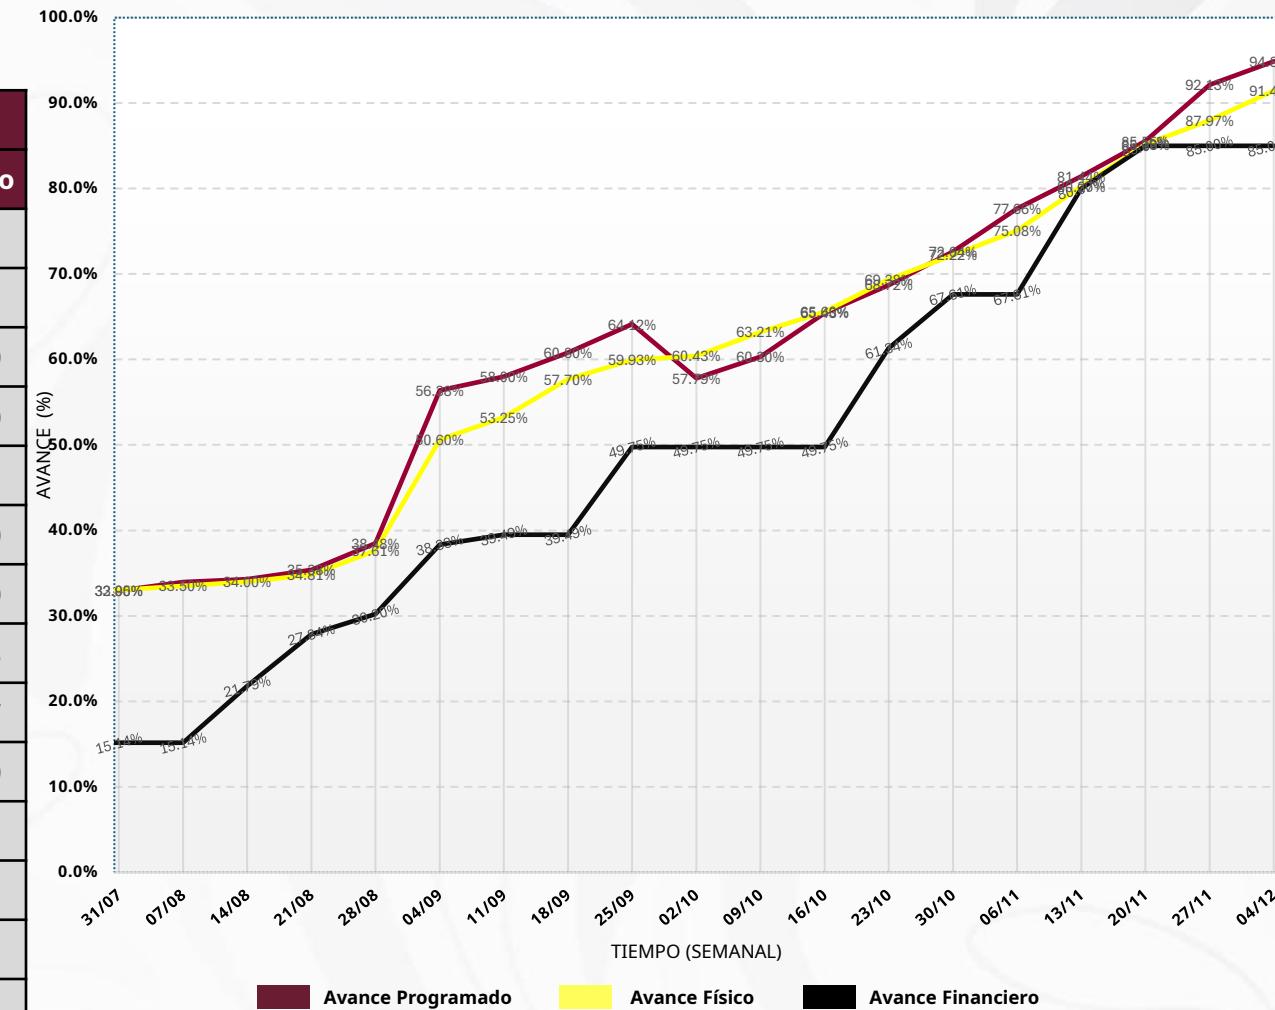

	21 de noviembre al 27 de noviembre	28 de noviembre al 04 de diciembre
Fuerza de Trabajo (personas)	553	545
Maquinaria	163	170
Frentes de trabajo	39	42
