

San Luis Potosí - Hidalgo

Tamazunchale – Huejutla – Pachuca



Avance global

- Programado: 24.78%
- Real: 22.82%
- Semanal: 0.36%
- Financiero: 20.22%

Los cambios en los avances globales surgen por la modificación de la meta total (**Antes 96 km**)

Avance 2025

- Programado: 100%
- Real: 92.09%
- Semanal: 2.05%
- Financiero: 55.23%

Inversión total 2025-2028: 6,674 mdp

- Hidalgo: 3,779 mdp
- SLP: 2,895 mdp

Mata total 2025-2028: 158 km

Hidalgo:

- 130 km

San Luis Potosí:

- 28 km

Inversión 2025: 1,654 mdp

- Hidalgo: 824 mdp
- San Luis Potosí: 830 mdp

Mata 2025: 30 km

- Hidalgo: 20 km
- San Luis Potosí: 10 km

Inversión 2026: 1,878 mdp

- Hidalgo: 1,249 mdp
- San Luis Potosí: 629 mdp

Mata 2026: 31 km


- Hidalgo: 24 km
- San Luis Potosí: 7 km

Inicio : 28 de abril 2025

Termino: diciembre 2029

Término meta 2025: 28 de febrero de 2025

20,022 empleos generados

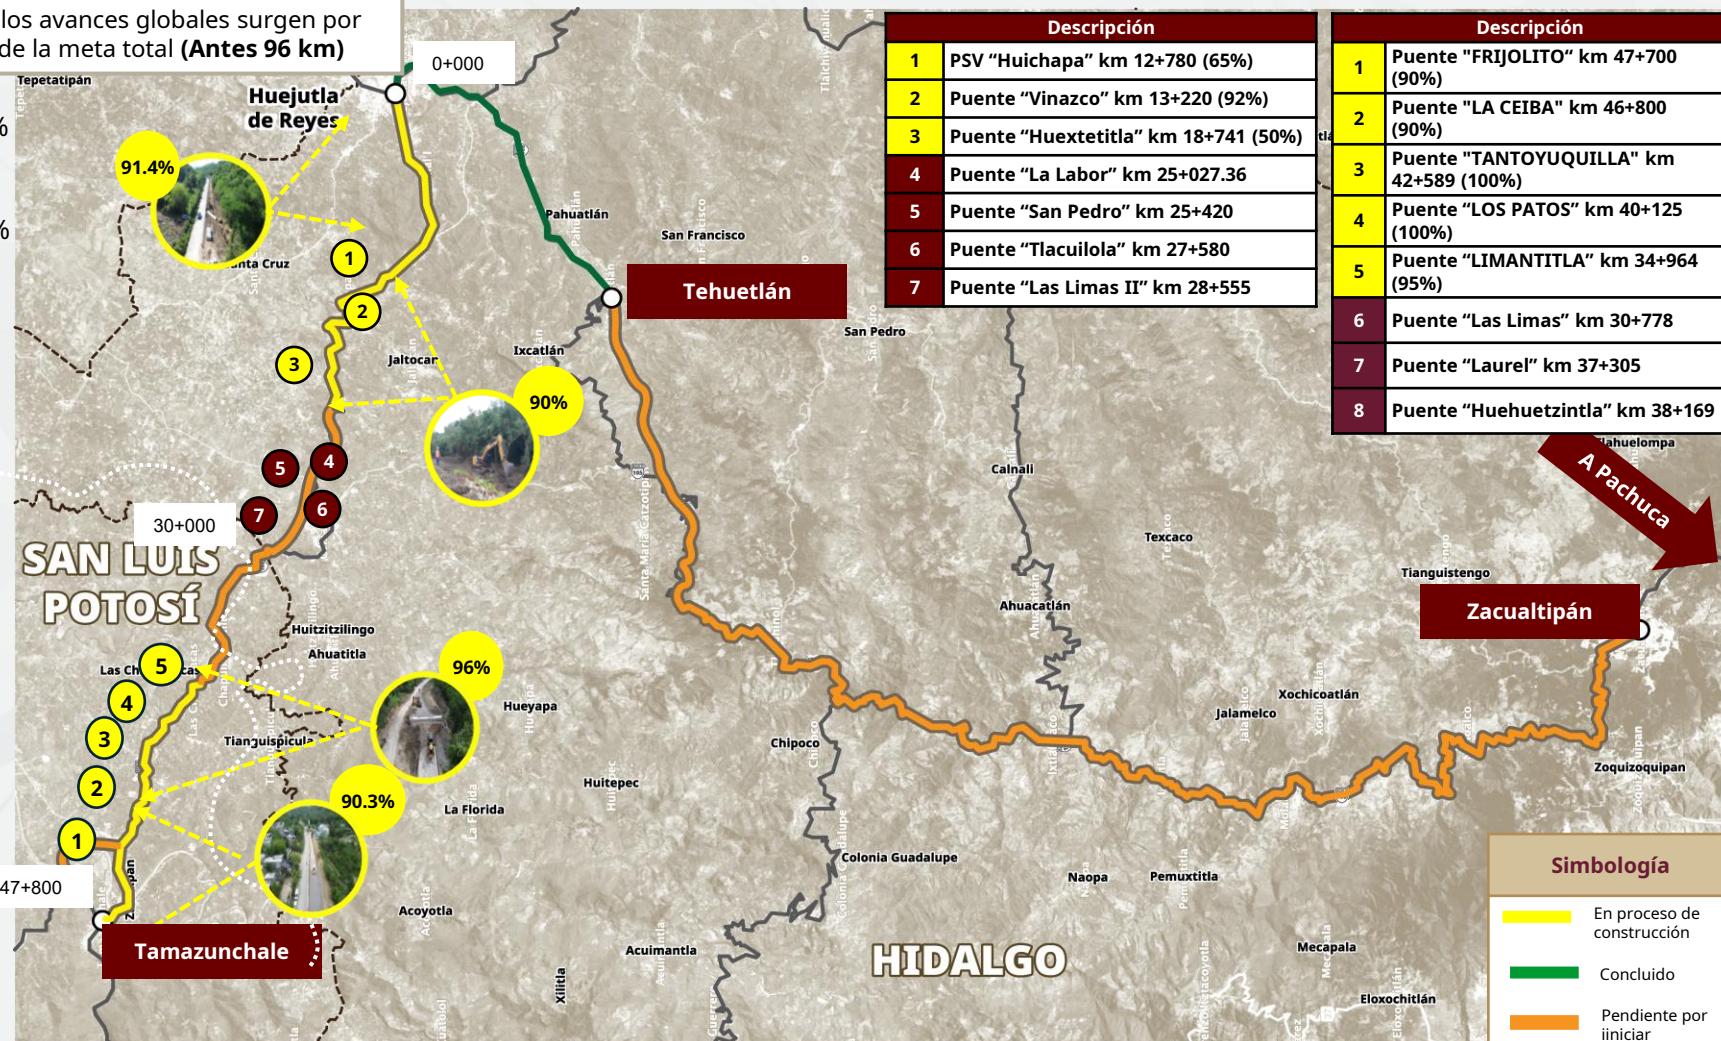

TDPA: 17,318 Veh/hr



65 min de ahorro en tiempo

+395 mil habitantes beneficiados en los municipios de Huejutla de Reyes, Jaltocán, Lolotla, Metztitlán, Molango de Escamilla, San Felipe Orizatlán, Tlanchinol, Xochicoatlán y Zacualtipán de Ángeles en Hidalgo y Tamazunchale, en San Luis Potosí.



Beneficios: Conecta de manera eficiente y segura el centro del país con la Sierra Hidalguense y la Huasteca Potosina.

San Luis Potosí

Tamazunchale - Huejutla


Km 34+140 al Km 35+160 y del Km 38+820 al Km 42+800

Elemento	Unidad	Meta	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 06/02/2026 al 12/02/2026		Observaciones
					Programado	Ejecutado	
TERRACERÍAS							
Despalme	m ³	31,718.00	31,718.0	100.00%	0.00	0.0	Trabajos concluidos
Cortes	m ³	249,345.00	249,345.0	100.00%	0.00	0	Trabajos concluidos
Terraplenes 90%	m ³	127,937.00	127,937.0	100.00%	0.00	0	Trabajos concluidos
Subyacente	m ³	31,983.00	31,983.0	100.00%	0.00	0	Trabajos concluidos
Subrasante	m ³	13,572.00	13,572.0	100.00%	0.00	0	Trabajos concluidos
OBRAS DE DRENAJE							
Obras de drenaje Tubería	pza.	11	11	100.00%	0	0	Trabajos concluidos
Obras de drenaje losa	pza.	2	2	100.00%	0	0	Trabajos concluidos
Obras de drenaje bóveda	pza.	2	2	100.00%	0	0	Trabajos concluidos
PAVIMENTOS							
Base hidráulica	m ³	14,685.00	14,685.0	100.00%	0.00	0	Trabajos concluidos
Base asfáltica	m ³	8,667.00	8,667.0	100.00%	0.00	2,167	1,167.0 Trabajos concluidos
Carpeta asfáltica	m ³	5,616.00	0	0.00%	5,616.00	5,616	0.0
SEÑALAMIENTO							
Señalamiento definitivo	km	5	0	0.00%	5	5.0	0.0

Km 42+800 al Km 47+800

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 06/02/2026 al 12/02/2026		Observaciones
					Programado	Ejecutado	
TERRACERÍAS							
Despalme	m ³	26,738	26,738.0	100.00%	0.00	0.0	Concluido
Cortes	m ³	189,998.00	189,998.00	100.00%	0.00	0.0	Trabajos del km 44+900 al km 44+980
Terraplenes 90%	m ³	24,931.00	24,600.00	98.67%	331.00	331.00	Trabajos del km 43+600 al km 43+660
Subyacente	m ³	38,781.00	38,781.00	100.00%	0.00	531.00	0.0 Trabajos del km 42+800 al km 47+800
Subrasante	m ³	19,107.00	18,713.00	97.94%	394.00	394.00	0.0 Trabajos del km 42+800 al km 47+800
OBRAS DE DRENAJE							
Obras de drenaje Tubería	pza.	10	10	100.0%	0	0	0.0 Concluido
Obras de drenaje losa	pza.	2	2	100.0%	0	0	0.0 Concluido
Obras de drenaje bóveda	pza.	2	2	100.0%	0	0	0.0 Concluido
PAVIMENTOS							
Base hidráulica	m ³	14,718.00	14,293.00	97.1%	425.00	425	0.0 km 42+800 al km 44+890 del km 45+060 al km 47+800
Base asfáltica	m ³	8,667.00	8,050.00	92.9%	617.00	426	0.0 Trabajos del km 42+800 al km 47+800
Carpeta asfáltica	m ³	5,474.00	0	0.0%	5,474.00	5,474	0.0 Partida aún no iniciada
SEÑALAMIENTO							
Señalamiento definitivo	km	5	3.6	72.0%	1.40	1.40	0.0 Partida aún no iniciada

Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Tamazunchale - Huejutla

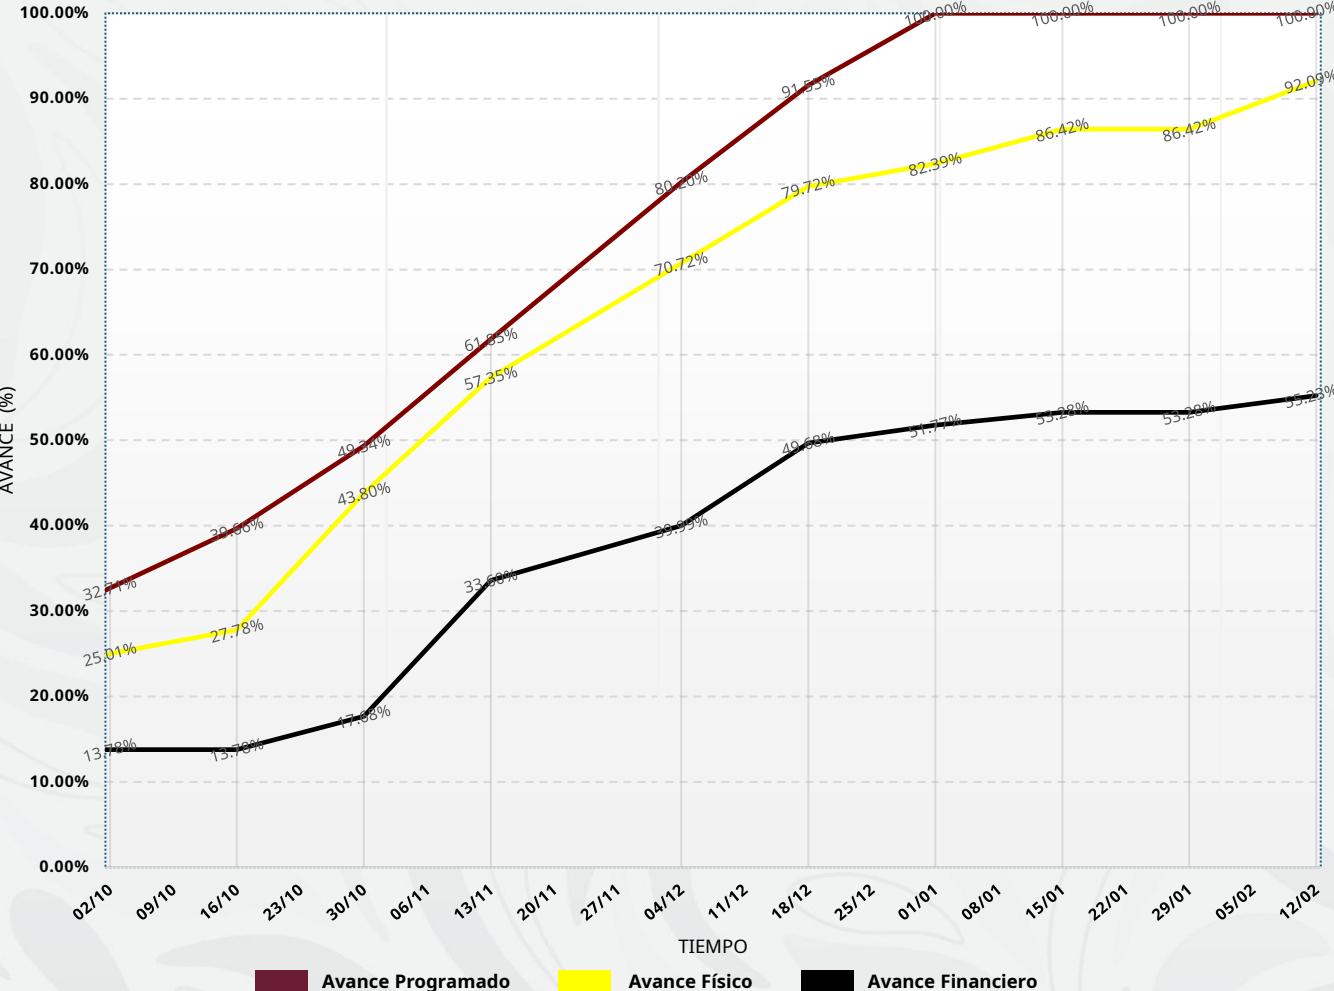

	30 de enero al 05 de febrero	06 de febrero al 12 de febrero
Fuerza de Trabajo (personas)	424	425
Maquinaria	194	194
Frentes	43	44

San Luis Potosí - Hidalgo

Tamazunchale – Huejutla – Pachuca

km 0+000 al km 10+000

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	06/02/26 al 12/02/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Desmonte (Ha)	20.0	20.0	-	-	-	Concluido
Despalme (m³)	21,500.0	21,500.0	-	-	-	Concluido
Cortes (m³)	183,255.0	183,255.0	-	-	-	Concluido
Terraplén (m³)	42,250.0	42,250.0	-	-	-	Concluido
Subyacente (m³)	93,012.0	90,797.0	2,215.0	0.0	6,545.0	
Subrasante (m³)	36,638.0	35,360.4	1,277.6	0.0	792.0	
Excavación estructuras y O.D. (m³)	14,264.6	13,342.5	922.1	0.0	415.0	
Base hidráulica (m³)	30,000.0	24,711.2	5,288.8	0.0	3,560.0	
Base asfáltica (m³)	16,760.0	12,373.2	4,386.8	0.0	2,150.0	
Carpeta asfáltica (m³)	10,692.0	1,221.6	9,470.4	0.0	0.0	
Puentes peatonales (pza)	4.0	0.5	3.5	0.0	0.0	
Señalamiento (m)	43,334.0	0.0	43,334.0	0.0	0.0	

km 10+000 al km 20+000

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	06/02/26 al 12/02/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Desmonte (Ha)	36.0	36.0	-	-	-	Concluido
Despalme (m³)	31,500.0	31,500.0	-	-	-	Concluido
Cortes (m³)	347,581.0	238,850.0	108,731.0	0.0	13,000.0	
Terraplén (m³)	251,735.0	170,700.0	81,035.0	0.0	17,000.0	
Subyacente (m³)	77,344.0	64,400.0	12,944.0	0.0	3,000.0	
Subrasante (m³)	32,248.0	27,500.0	4,748.0	0.0	700.0	
Excavación estructuras y O.D. (m³)	133,739.6	99,669.0	34,070.6	0.0	12,000.0	
Base hidráulica (m³)	30,000.0	18,640.0	11,360.0	0.0	1,500.0	
Base asfáltica (m³)	16,760.0	9,500.0	7,260.0	0.0	1,900.0	
Carpeta asfáltica (m³)	10,692.0	0.0	10,692.0	0.0	0.0	
Puentes peatonales (pza)	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	
Señalamiento (m)	43,334.0	0.0	43,334.0	0.0	0.0	



Avances físicos (San Luis Potosí)



Avances físicos (Hidalgo)
