



**Avance global**

- Programado: 8.75%
- Real: 6.91%

- Semanal: 0.11%
- Financiero: 3.00%

**Avance 2025**

- Programado: 96.25%
- Real: 77.04%
- Financiero: 66.60%

**1.- Edificaciones y Obras Civiles Romacal, S.A. de C.V. y Turboasfaltos, S.A. de C.V.**

Meta: Km 35+340-km 41+000, incluye 1 puente  
Inversión: 110.6 MDP C/IVA

**2.- Constructora ALICAT, S.A. de C.V., Constructora ERAGT Creación, S.A. de C.V., Construcciones Gracida y Asociados, S.A. de C.V. y CODEMAZATL, S.A. de C.V.**

Meta: Km 41+000-km 46+600 km  
Inversión: 79.8 MDP C/IVA

**3.- Construcción de Caminos y Proyectos Interestatales, S.A. de C.V.**

Meta: Km 51+400-km 56+000 km  
Inversión: 71.7 MDP C/IVA

**4.- Constructora ERAGT CREACIÓN, S.A. de C.V., Grupo Comercializador ELELVA, S.A. de C.V., DAHNA Constructores, S.A. de C.V. y Lizbeth Reyes Villa**

Meta: Km 80+800 – km 85+800  
Inversión: 82.11 MDP C/IVA

**5.- Moisés Martínez Mendoza, Grupos CYRMA MART, S.A. de C.V.**

Meta: Km 85+800 – km 90+800  
Inversión: 76.41 MDP C/IVA

**6.- Puentes e Ingeniería Especializada de Puebla, S.A. de C.V. PIEPSA y Grupo Tauro Ingeniería y Transportes, S.A. de C.V.**

Meta: Km 90+800 – km 95+800  
Inversión: 57.56 MDP C/IVA

**S1.- Grupo CORPCIT, S.A. de C.V.**

Meta: Km 35+340 – km 46+000 y Km 51+400 – Km 56+000  
Inversión: 6.40 MDP C/IVA



**Meta total 2025-2029:** 385km

- Morelos: 26 km
- Puebla: 159 km
- Guerrero: 201 km

**Meta 2025:** 33 km

**Inversión total 2025-2029:** 13.652 mdp.

- Morelos: 527 mdp
- Puebla: 7,669 mdp
- Guerrero: 5,456 mdp

**Inicio:** 16 de mayo 2025  
**Término:** diciembre 2029  
**Término meta 2025:** diciembre

**40,956 empleos generados**

**7,750 habitantes beneficiados**

**1 hora** de ahorro en tiempo

Se beneficiará a una población de 7,750 habitantes de los municipios de Igualapa, Cochoapa el Grande, Metlatonoc y Malinaltepec, reduciendo tiempos de traslado.

**S2.- Constructora DEMSA, S.A. de C.V.**

Meta: Km 80+800 – km 95+800  
Inversión: 5.95 MDP C/IVA

# Guerrero - Puebla

Eje Cuautla – Tlapa

Ramal Igualapa – Chilixtlahuaca - Alacatlatzala




Gobierno de  
México

Comunicaciones  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	05-12-25 al 11-12-25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Trabajos preliminares (km)	30.90	0.00	0.0	0.0	0.0	Trabajos de topografía
Terracerías (km)	30.90	23.40	7.50	1.0	0.2	Desmonte -Despalme -Cortes Terraplenes
Obras de drenaje (Pza.)	133	110	23	23	31	obras de drenaje
Pavimento (km)	30.9	2.6	28.30	2.5	0.6	-
Señalamiento (km)	30.9	0	30.9	0	0	-

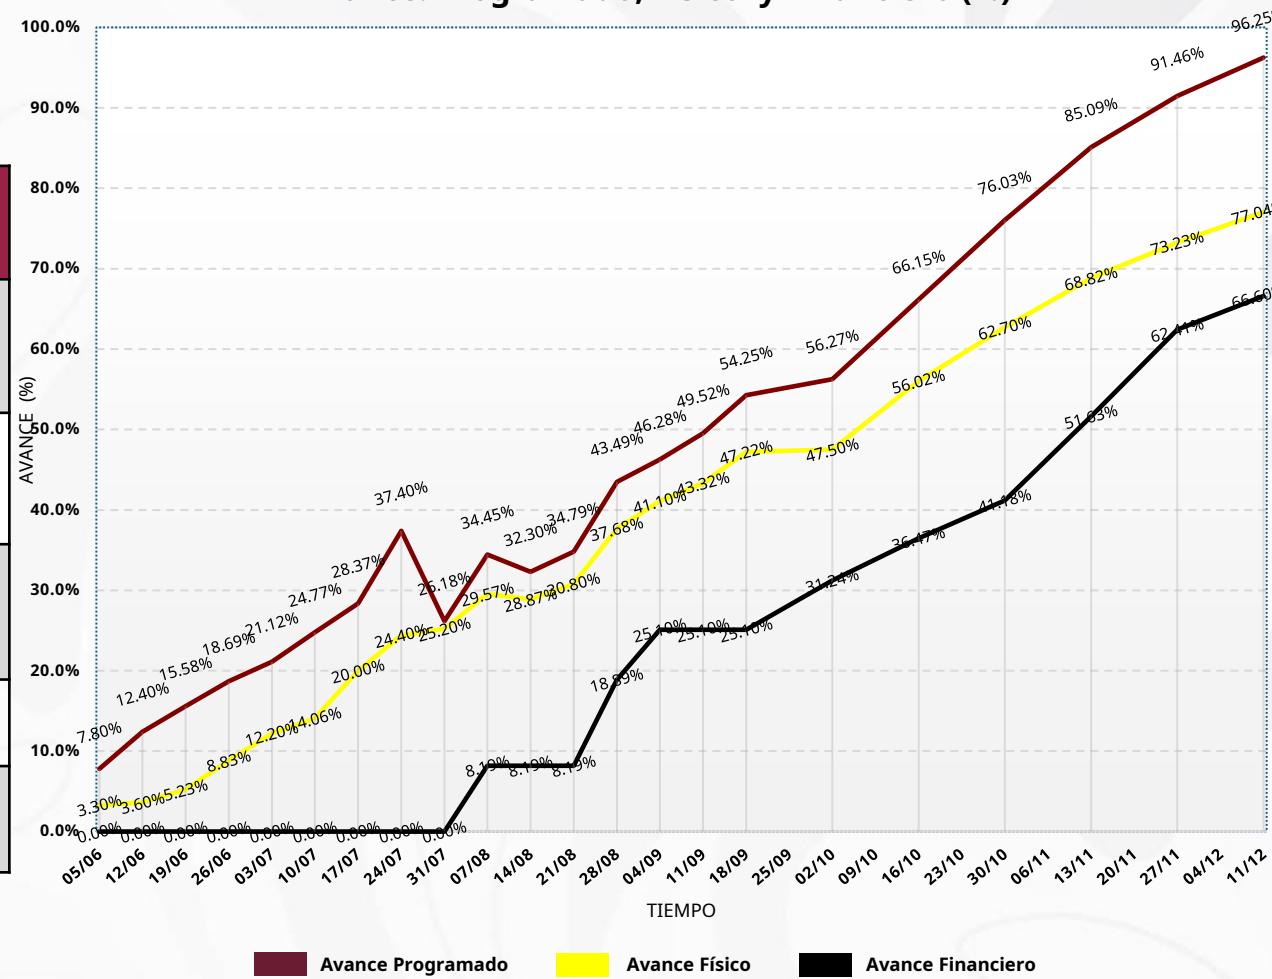

	27 de noviembre al 04 de diciembre	05 al 11 de diciembre
Fuerza de Trabajo (personas)	424	418
Maquinaria	185	184
Frentes de trabajo	34	30
