

Sonora/Chihuahua

Camino Límite Estados Chihuahua/Sonora-Pancho Villa-E.C. (Janos-Monte Verde)



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

1.- Constructora URBATRAC, S.A. de C.V.
Meta: Km 0+000-km 11+000, incluye entronque km 0+000 Inversión: 324.6 MDP C/IVA

2.- ESMA Instalaciones, S.A. de C.V.
Meta: Km 11+000-km 18+093 km Inversión: 306.2 MDP C/IVA

3.- INNOVACIONES INTELIGENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN,S.A DE C.V Y CMCO,S.A DE C.V
F. Km 6+900 Puente I, 122.0 m G. Km 14+700 Puente II, 61.5 m

4.- CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PROYECTOS INTERESTATALES,S.A DE C.V
Por modernizar a nivel de pavimento a 7.0 m Meta: Km 18+093 – km 29+093


5.- La CIMA Terraceros, S.A. de C.V. y Estructuras y Excavaciones JM, S.A. de C.V.
Meta: Km 29+093-KM 47+233 Inversión: 193.9 MDP C/IVA

6.- MERP Edificaciones y Terracerías, S.A. de C.V.
Meta: Km 47+233-Km 59+823 y Km 66+422-Km 66+829, incluye Boulevard y entronque a nivel. Inversión: 179.4 MDP C/IVA

7.- Asfaltos y Triturados EL PUJAL, S.A. de C.V.
En proceso de construcción de 5 puentes: A. Km 22+758 El Papalote, 30.0 m B. Km 25+758 Los Pilares, 40.0 m C. Km 33+832 Las Profesoras, 40.0 m D. Km 36+682 La Enramada, 30.0 m E. Km 38+362 La Pila, 120.0 m Inversión: 122.5 MDP C/IVA

Avance físico

- Programado: 76%
- Real: 68.0%
- Semanal: 0.0%
- Financiero: 52.4%

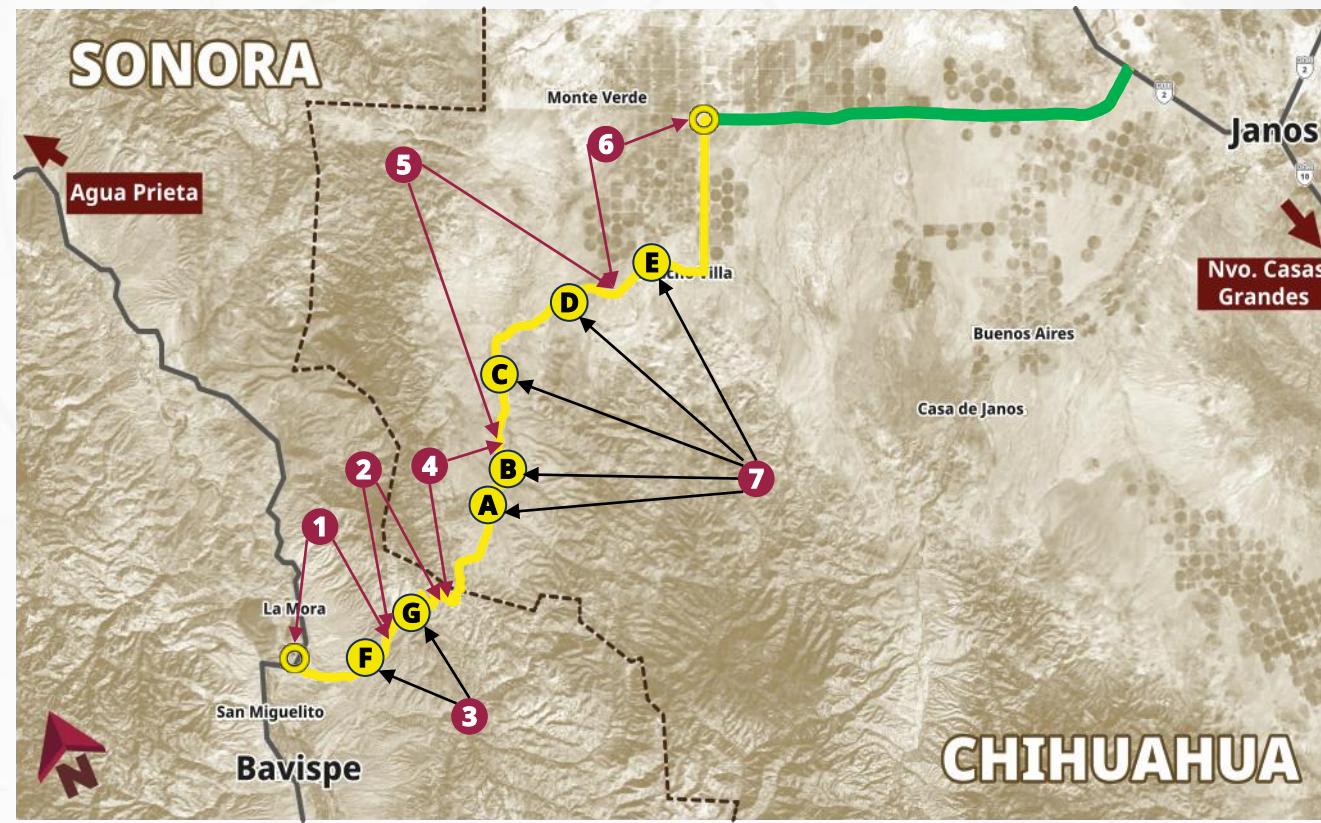

Inversión total: 1,859 mdp
Sonora: 774.5 mdp
Chihuahua: 1,084.5 mdp

Inicio: marzo, 2025
Término: 30 Enero de 2026

Meta total: 67 km y 7 puentes
• 6.6 km modernizados C,
Chihuahua (se requiere
trabajos complementarios)

Meta pendiente: 60.2 km y 7 puentes
Sonora

- 18.1 km, ampliación C
- 2 puentes (184 m)

Chihuahua

- 42.1 km, ampliación C
- 5 puentes (320 m)

5,577 empleos generados

4,713 habitantes beneficiados

90 minutos de ahorro en tiempo

S1.- CLAMI INGENIEROS, S.C

Tramo: del km 0+000 al km 11+000, puente Sonora I en el km 6+900
Inversión: 6.1 MDP C/IVA

S2.- NEDOX, S.A DE C.V

Tramo: tramo del km 18+093 al km 29+093, 5 puentes Chihuahua
Inversión: 7.5 MDP C/IVA

S3.- JIDASA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V

Tramo: tramo del km 29+093 al km 59+822, del km 66+422 al km 66+828
Inversión: 7.5 MDP C/IVA

S4.- GSM SUPERVISIÓN, PROYECTO E IMPACTO AMBIENTAL, S.A DE C.V

Tramo: Manifestación de Impacto Ambiental y de Cambio de Uso de Suelo Forestal, Chihuahua
Inversión: 6.7 MDP C/IVA

S5.- GRUPO SELOME, S.A. DE C.V

Tramo: implementación y ejecución de medidas de mitigación de la Manifestación de Impacto Ambiental, Sonora
Inversión: 14.0 MDP C/IVA

S6.- PROVEEDORA DE INGENIERIA, INSTALACION E INFRAESTRUCTURA, S.A DE C.V

Tramo: implementación y ejecución de medidas de mitigación de la Manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad regional, Sonora
Inversión: 10.5 MDP C/IVA

S7.- GRUPO CORPOSIIA, S.A. DE C.V.

Tramo: implementación y ejecución de medidas de mitigación de la Manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad regional, Sonora
Inversión: 10.5 MDP C/IVA

Sonora/Chihuahua

E.C. (Agua Prieta-Bavispe)-Pancho Villa-E.C.
(Janos-Monte Verde)




Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento44.9	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	14-11-25 al 20-11-25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Ampliación: Tramo Sonora	18	66.55%	33.45%	1.27%	2.45%	
Ampliación: Tramo Chihuahua	42	64.37%	35.63%	3.67%	2.41%	<ul style="list-style-type: none"> Aumentar turnos en las jornadas
Construcción Puentes (Chihuahua)	5	37.0%	63.0%	4.02%	2.3%	<ul style="list-style-type: none"> Incrementar cuadrillas de trabajo y equipo para colado
Construcción Puentes (Sonora)	2	44.9%	55.1%	1.03%	2.2%	-

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

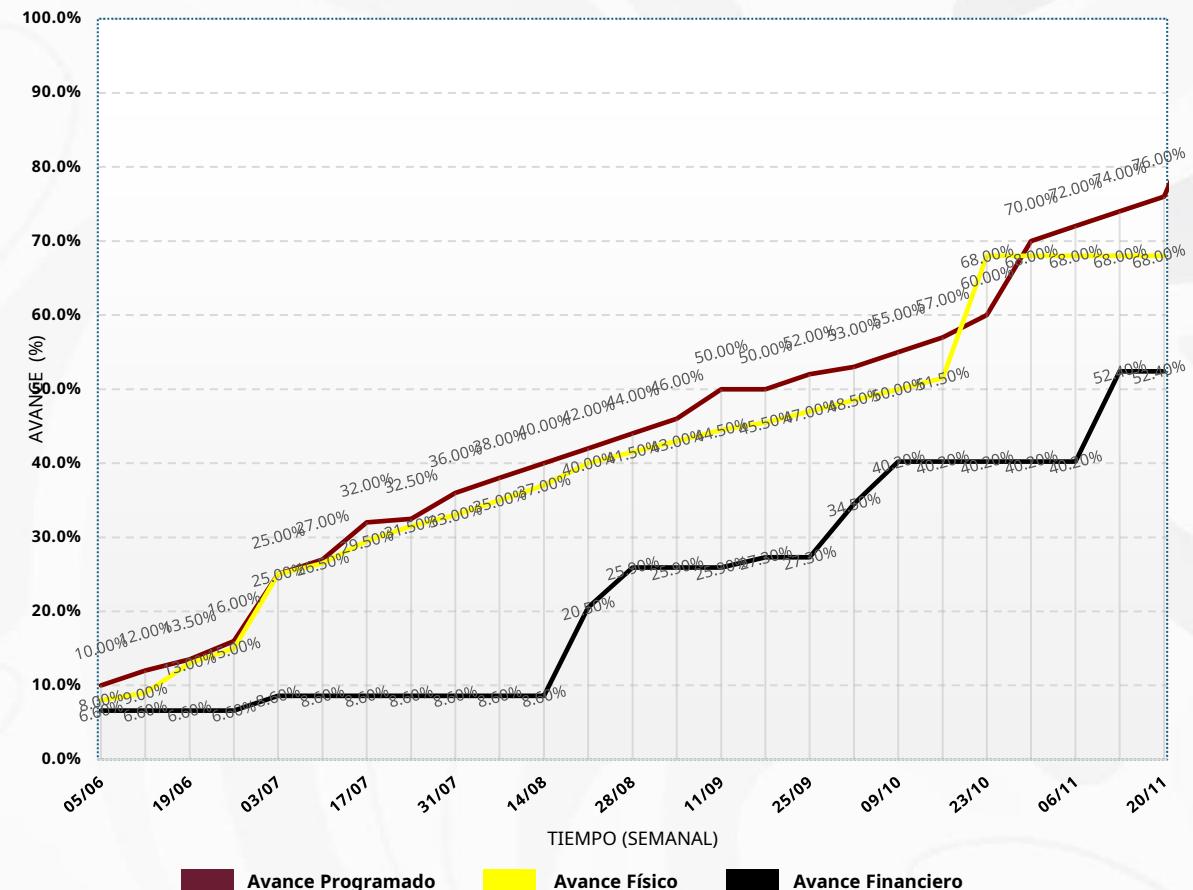

■ Avance Programado ■ Avance Físico ■ Avance Financiero

	07 de noviembre al 13 de noviembre	14 de noviembre al 20 de noviembre
Fuerza de Trabajo (personas)	795	830
Maquinaria	457	446
