

Salina Cruz-Zihuatanejo (MEX-200)

Tramo Guerrero



Avance global	- Programado: 9.15% - Real: 7.74%	Avance 2025	- Programado: 100.0% - Real: 98.41%	- Semanal: 0.43% - Financiero: 6.68%	Avance 2026	- Programado: 23.44% - Real: 11.79%	- Semanal: 3.76% - Financiero: 1.29%
----------------------	---	--------------------	---	--	--------------------	---	--



Descripción	
1	Puente Las Vigas Km 81+200 123 m
2	Puente Río Nexpa Km 85+300 425 m
3	Puente Agua Hedionda Km 106+760 21 m
4	Puente Copala Km 116+000 120 m
5	Puente Marquelia I Km 135+500 220 m
6	Puente Talapilla Km 171+857 41 m
7	Puente Río Quetzala Km 173+711 190 m
8	Puente Santa Catarina Km 184+744 101 m
9	Tramo 9 IG=km 209+500 AT - km 209+240 AD al km 219+540 10.30 km
10	Tramo 10 km 219+540 al km 229+600 10.06 km
11	Tramo 11 km 229+600 al km 234+843.77 5.24 km

Inversión total 2025-2030: 24,722 mdp

- Guerrero: 6,641 mdp
- Oaxaca: 18,081 mdp

Meta total 2025-2030: 423 km *

- Guerrero: 103 km
- Oaxaca: 319 km

Inversión 2025: 1,606 mdp

- Guerrero: 724 mdp
- Oaxaca: 882 mdp

Meta 2025: 27 km

- Guerrero: 1 km
- Oaxaca: 26 km

Inversión 2026: 2,757 mdp

- Oaxaca: 2,757 mdp

Meta 2026: 37 km

Inicio : 1 de abril de 2025

Termino: 31 de diciembre 2029

Término meta 2025: 30 de mayo de 2026

74,166 empleos generados


1,947,399 habitantes beneficiados

Beneficios: Reducción en tiempos de traslados de la Costa Chica de Gro. hacia Puerto Escondido Oax., reduciendo costos operativos e impulsando el turismo local y nacional de los municipios de Acapulco, San Marcos, Florencio Villareal, Cuajinicuilapa, Pinotepa Nacional, Villa de Tututepec, San Pedro Mixtepec, Pochutla y Huatulco.

Oaxaca/Guerrero

Salina Cruz-Zihuatanejo (MEX-200)

Elemento	Meta	Ejecutado Acumulable	Faltante	01-05-26 al 07-05-26	
				Programado	Ejecutado
Troncal	*13.58 km	*13.37 km	*0.21 km	0.0%	0.06%
8 puentes	8 pts	96.04% de 8 pts	3.96% de 8 pts	0.0%	0.14%
OBSERVACIONES					
Oaxaca Tramo 1 (0 frentes de trabajo) Concluido. Tramo 2 (0 frentes de trabajo) Sin actividad Tramo 3 (0 frentes de trabajo) Concluido Guerrero Puente Las Vigas km 81+200: Concluido. Puente Agua Hedionda Km 106+760: Concluido. Puente Copala Km 116+000: Concluido. Puente Marquelia I km 135+500: Concluido. Puente Nexpa km 85+300: Trabajos de pintura y Limpieza de Caudal. Puente Talapilla km 171+857: Concluido Puente Rio Quetzala Km 173+711: Armado y cimbrado de diafragmas. Colocación de losacero y Armado y cimbrado de losas. Puente Santa Catarina km 183+740: Cimbrado y tendido de base hidráulica y colocación de parapeto.					

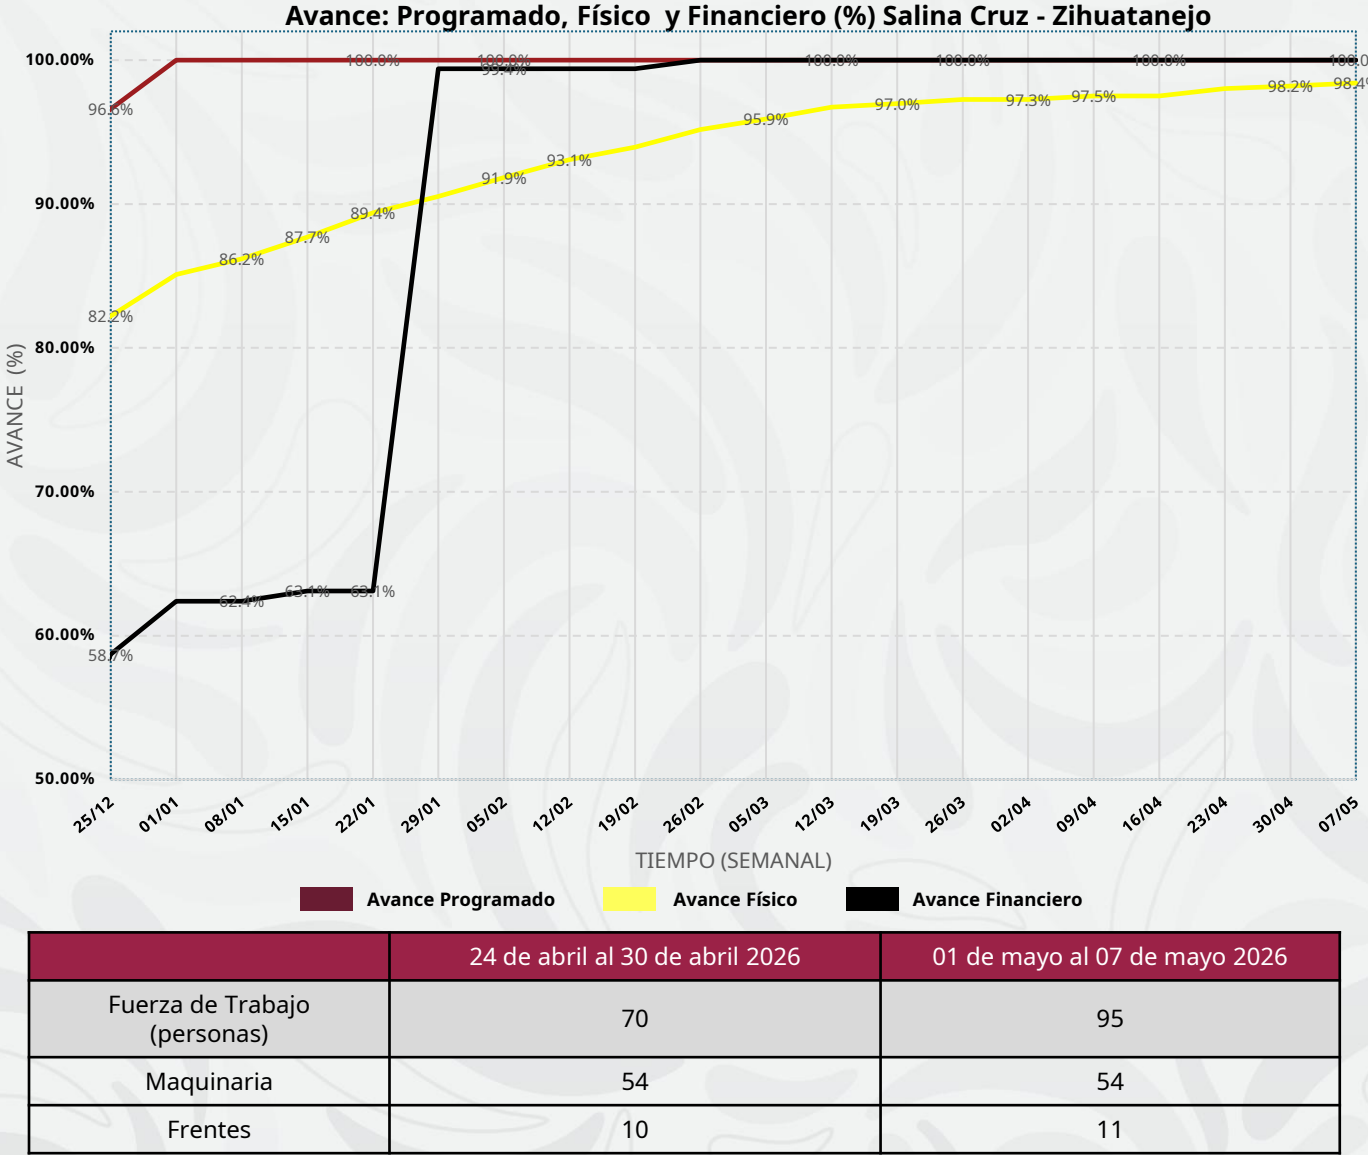

* 13.58 km se realizó un convenio en reducción de volúmenes del tramo I
