

San Luis Potosí - Hidalgo

Tamazunchale – Huejutla – Pachuca



Avance global	• Programado: 27.65%	• Semanal: 0.32%
	• Real: 26.84%	• Financiero: 25.56%
Avance 2025	• Programado: 100%	• Semanal: 0.0%
	• Real: 100%	• Financiero: 100%
Avance 2026	• Programado: 8.98%	• Semanal: 0.65%
	• Real: 8.69%	• Financiero: 3.37%


- Inversión total 2025-2028:** 6,674 mdp
 - Hidalgo: 3,779 mdp
 - SLP: 2,895 mdp
- Meta total 2025-2028:** 158 km
- Hidalgo:**
 - 130 km
- San Luis Potosí:**
 - 28 km
- Inversión 2025:** 1,650 mdp
 - Hidalgo: 821.66 mdp
 - San Luis Potosí: 827.86 mdp
- Meta 2025:** 30 km
 - Hidalgo: 20 km
 - San Luis Potosí: 10 km
- Inversión 2026:** 2,490 mdp
 - Hidalgo: 1,861 mdp
 - San Luis Potosí: 629 mdp
- Meta 2026:** Hidalgo 55 km (4 puentes) y San Luis Potosí 7 km A2 y (3 puentes)

- Inicio :** 28 de abril 2025
- Término:** diciembre 2028
- Término meta 2025:** 28 de febrero de 2026
- 20,022** empleos generados



TDPA: 17,318 Veh/hr

+395 mil habitantes beneficiados en los municipios de Huejutla de Reyes, Jaltocán, Lolotla, Metztitlán, Molango de Escamilla, San Felipe Orizatlán, Tlanchinol, Xochicoatlán y Zacualtipán de Ángeles en Hidalgo y Tamazunchale, en San Luis Potosí.

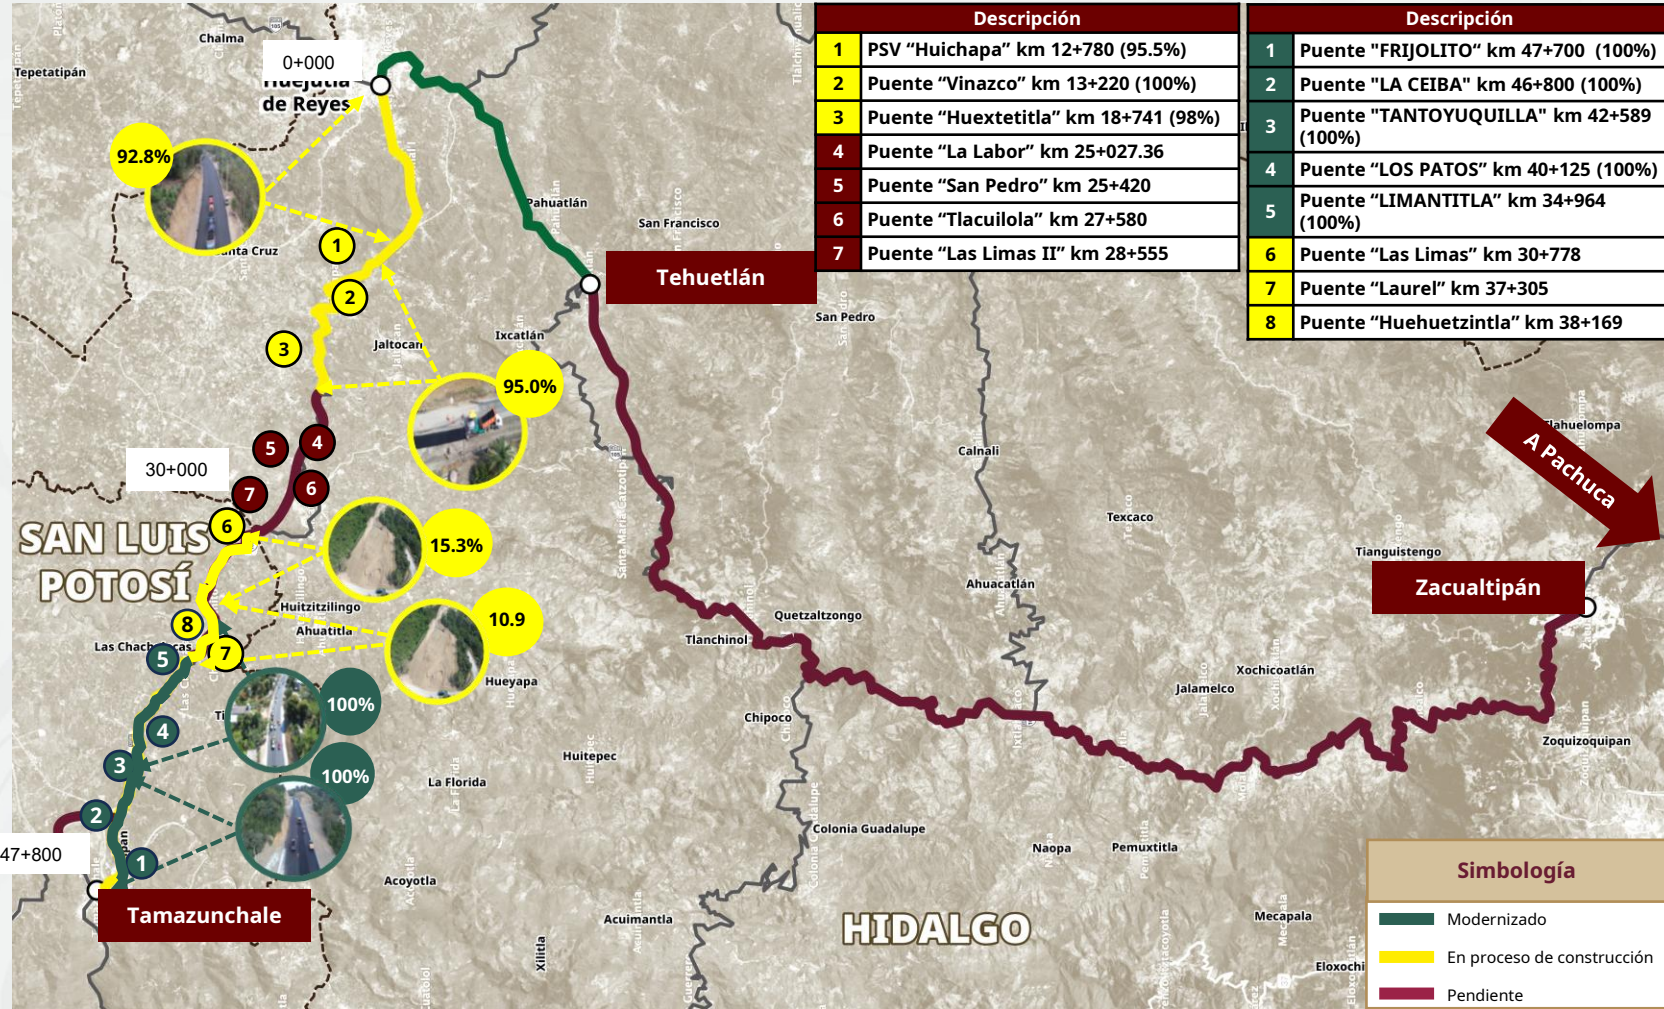

65 min de ahorro en tiempo

Beneficios: Conecta de manera eficiente y segura el centro del país con la Sierra Hidalguense y la Huasteca Potosina.


San Luis Potosí - Hidalgo

Tamazunchale – Huejutla

Km 30+500 al Km 34+140								
Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado		Faltante	Ejecutado del 01/05/2026 al 07/05/2026		Observaciones
						Programado	Ejecutado	
TERRACERÍAS								
Despalme	m³	24,896.0	15,393.0	61.83%	9,503.0	2,271.5	2,778.0	En proceso
Cortes	m³	376,161.0	72,674.0	19.32%	303,487.0	28,868.0	13,500.0	En proceso
Terraplenes 90%	m³	85,691.0	1,000.0	1.17%	84,691.0	5,712.7	500.0	En proceso
Pedraplen	m³	27,537.0	15,982.0	58.04%	11,555.0	2,503.4	14,384.0	En proceso
Subyacente	m³	39,813.0	6,797.0	17.07%	33,016.0	2,488.3	1,500.0	En proceso
Subrasante	m³	18,354.0	2,300.0	12.53%	16,054.0	1,079.0	500.0	En proceso
OBRAS DE DRENAJE								
Obras de drenaje	pza.	7	0.5	7.14%	6.5	0.5	0.5	En proceso
PAVIMENTOS								
Base hidráulica	m³	8,798.0	0.0	0.00%	8,798.0	0.0	0.0	Por iniciar
Base asfáltica	m³	5,083.0	0.0	0.00%	5,083.0	0.0	0.0	Por iniciar
Carpeta asfáltica	m³	3,307.0	0.0	0.00%	3,307.0	0.0	0.0	Por iniciar
Puentes	pza.	1.0	0.0	0.00%	1.0	0.0	0.0	Por iniciar
SEÑALAMIENTO								
Obra complementaria	km	3.6	0.0	0.00%	3.60	0.0	0.0	Por iniciar
Señalamiento definitivo	km	3.6	0.0	0.00%	3.60	0.0	0.0	Por iniciar

km 35+160 al km 38+820								
Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 01/05/2026 al 07/05/2026		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
TERRACERÍAS								
Despalme	m³	34,330.0	5,472.0	15.94%	28,858.0	2,288.7	0.0	En proceso
Cortes	m³	203,755.0	43,070.0	21.14%	160,685.0	11,845.8	7,470.0	En proceso
Terraplenes 90%	m³	78,664.0	0.0	0.00%	78,664.0	4,878.5	0.0	Por iniciar
Pedraplen	m³	33,734.0	11,662.0	34.57%	22,072.0	2,558.8	367.0	En proceso
Subyacente	m³	23,233.0	5,702.0	24.54%	17,531.0	2,323.0	1,527.0	En proceso
Subrasante	m³	16,228.0	232.0	1.43%	15,996.0	901.6	232.0	En proceso
OBRAS DE DRENAJE								
Obras de drenaje Tubería	pza.	12	0.8	6.67%	11.2	0.1	0.1	En proceso
PAVIMENTOS								
Base hidráulica	m³	7,895.0	0.0	0.00%	7,895.0	0.0	0.0	Por iniciar
Base asfáltica	m³	4,561.0	0.0	0.00%	4,561.0	0.0	0.0	Por iniciar
Carpeta asfáltica	m³	3,327.0	0.0	0.00%	3,327.0	0.0	0.0	Por iniciar
Puentes	pza.	2.0	0.0	0.00%	2.0	0.0	0.0	Por iniciar
SEÑALAMIENTO								
Obra complementaria	km	3.6	0.0	0.00%	3.60	0.0	0.0	Por iniciar
Señalamiento definitivo	km	3.6	0.0	0.00%	3.60	0.0	0.0	Por iniciar

Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Tamazunchale - Huejutla

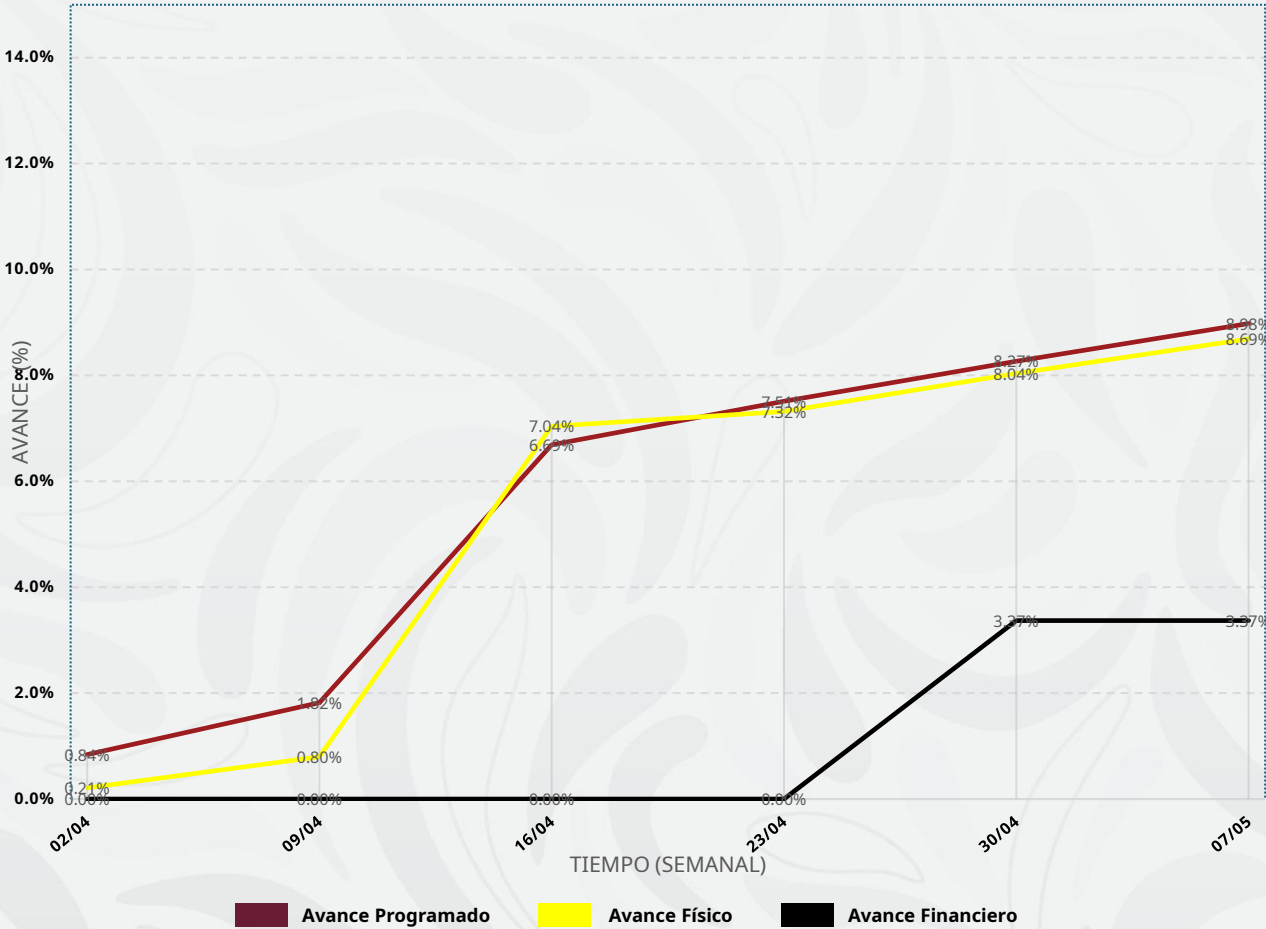

	24 de abril al 30 de abril	01 de mayo al 07 de mayo
Fuerza de Trabajo (personas)	283	263
Maquinaria	140	141
Frentes	24	15



San Luis Potosí - Hidalgo

Tamazunchale - Huejutla - Pachuca

km 0+000 al km 10+000

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	01/05/26 al 07/05/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Desmonte (Ha)	20.0	20.0	-	-	-	Concluido
Despalme (m3)	21,500.0	21,500.0	-	-	-	Concluido
Cortes (m3)	183,255.0	183,255.0	-	-	-	Concluido
Terraplén (m3)	42,250.0	42,250.0	-	-	-	Concluido
Subyacente (m3)	93,012.0	93,012.0	-	-	-	Concluido
Subrasante (m3)	36,638.0	36,638.0	-	-	-	Concluido
Excavación estructuras y O.D. (m3)	14,264.6	14,264.6	-	-	-	Concluido
Demolición de concreto hidráulico (m3)	3,727.5	3,727.5	-	-	-	Concluido
Base hidráulica (m3)	30,000.0	29,880.0	120.0	0.0	353.0	
Base asfáltica (m3)	16,760.0	16,565.0	195.0	0.0	0.0	
Carpeta asfáltica (m3)	10,692.0	5,044.0	5,648.0	0.0	0.0	
Puentes peatonales (pza)	2.0	0.7	1.3	0.0	0.00	Reducción meta por conflicto social
Señalamiento (m)	43,334.0	0.0	43,334.0	10,833.5	0.0	

km 10+000 al km 20+000

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	01/05/26 al 07/05/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Desmonte (Ha)	36.0	36.0	-	-	-	Concluido
Despalme (m3)	31,500.0	31,500.0	-	-	-	Concluido
Cortes (m3)	347,581.0	341,550.0	6,031.0	0.0	5,000.0	
Terraplén (m3)	251,735.0	250,335.0	1,400.0	0.0	800.0	
Subyacente (m3)	77,344.0	75,250.0	2,094.0	0.0	1,000.0	
Subrasante (m3)	32,248.0	31,250.0	998.0	0.0	100.0	
Excavación estructuras y O.D. (m3)	133,739.6	133,739.6	0.0	-	-	Concluido
Base hidráulica (m3)	30,000.0	28,990.0	1,010.0	0.0	200.0	
Base asfáltica (m3)	16,760.0	15,250.0	1,510.0	0.0	0.0	
Carpeta asfáltica (m3)	10,692.0	0.0	10,692.0	0.0	0.0	
Señalamiento (m)	43,334.0	0.0	43,334.0	0.0	0.0	



Avances físicos (San Luis Potosí)



Avances físicos (Hidalgo)
