



Guerrero - Puebla

Eje Cuautla – Tlapa

Ramal Igualapa – Chilixtlahuaca - Alacatlalzala

Avance global	• Programado: 10.11% • Real: 9.68%	Avance 2025	• Programado: 100.0% • Real: 100.0%	Avance 2026	• Programado: 14.94% • Real: 10.37%	• Semanal: 0.26% • Financiero: 5.25%	• Semanal: 1.33% • Financiero: 100.0%	• Semanal: 7.46% • Financiero: 2.68%
----------------------	---------------------------------------	--------------------	--	--------------------	--	---	--	---



Inversión total 2025-2029: 13,652 mdp

- Morelos: 688 mdp
- Puebla: 7,525 mdp
- Guerrero: 5,440 mdp

Meta total 2025-2029: 393 km

- Morelos: 26 km
- Puebla: 159 km
- Guerrero: 208 km



Inversión 2025: 641.2 mdp

- Guerrero: 515.5 mdp
- Puebla: 125.7 mdp

Meta 2025: 33 km

- Guerrero: 30 km
- Puebla: 3 km



Inversión 2026: 3,1618 mdp

- Guerrero: 750 mdp
- Puebla: 2,398 mdp

Meta 2026: 112 km

- Guerrero: 63 km
- Puebla: 49 km

Inicio meta 2026: 17 de febrero de 2026



Inicio: 16 de mayo 2025

Término: diciembre 2029

Termino meta 2025: marzo de 2026



40,956 empleos generados



7,750 habitantes beneficiados



1 hora de ahorro en tiempo




Se beneficiará a una población de 7,750 habitantes de los municipios de Igualapa, Cochoapa el Grande, Metlatonoc y Malinaltepec, reduciendo tiempos de traslado.

Guerrero - Puebla

Eje Cuautla – Tlapa

Ramal Igualapa – Chilixtlahuaca - Alacatlatzala

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	17-04-26 al 23-04-26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Trabajos preliminares (km)	30.90	0.00	0.0	0.0	0.0	Trabajos de topografía
Terracerías (km)	30.90	30.90	0.0	0.0	0.0	Desmonte -Despalme -Cortes Terraplenes
Obras de drenaje (Pza.)	141.0	141.0	0.0	0.0	0.0	obras de drenaje
Pavimento (km)	30.9	30.9	0.0	0.0	1.8	Tramos aislados de concreto hidráulico
Señalamiento (km)	30.9	30.9	0.0	5.00	5.0	Horizontal y vertical

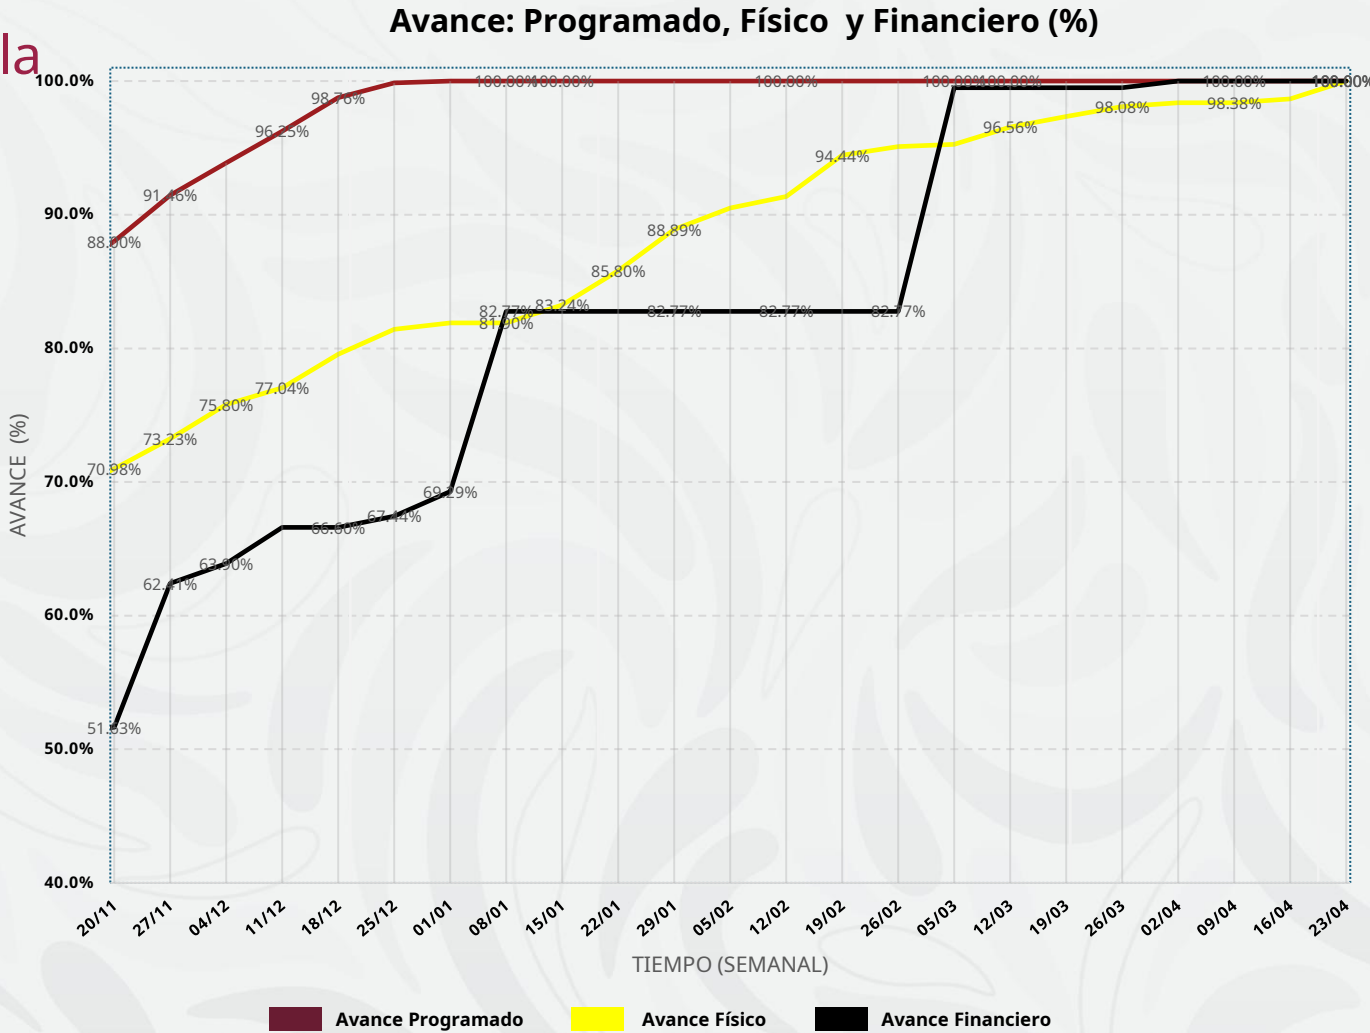

	10 de abril al 16 de abril	17 de abril al 23 de abril
Fuerza de Trabajo (personas)	15	15
Maquinaria	17	17
Frentes de trabajo	1	1
