

Salina Cruz-Zihuatanejo (MEX-200)

Tramo Guerrero

Avance global	• Programado: 8.10%	• Semanal: 0.03%	Avance 2025	• Programado: 100.0%	• Semanal: 0.52%	Avance 2026	• Programado: 14.02%	• Semanal: 0.01%
	• Real: 7.19%	• Financiero: 6.54%		• Real: 98.02%	• Financiero: 100.0%		• Real: 7.02%	• Financiero: 0.0%



Descripción	
1	Puente Las Vigas Km 81+200 123 m
2	Puente Río Nexpa Km 85+300 425 m
3	Puente Agua Hedionda Km 106+760 21 m
4	Puente Copala Km 116+000 120 m
5	Puente Marquelia I Km 135+500 220 m
6	Puente Talapilla Km 171+857 41 m
7	Puente Río Quetzala Km 173+711 190 m
8	Puente Santa Catarina Km 184+744 101 m
9	Tramo 9 IG=km 209+500 AT – km 209+240 AD al km 219+540 10.30 km
10	Tramo 10 km 219+540 al km 229+600 10.06 km
11	Tramo 11 km 229+600 al km 234+843.77 5.24 km

**Inversión total 2025-2030:** 24,722 mdp

- Guerrero: 6,641 mdp
- Oaxaca: 18,081 mdp

Meta total 2025-2030: 423 km *

- Guerrero: 103 km
- Oaxaca: 319 km

**Inversión 2025:** 1,606 mdp

- Guerrero: 724 mdp
- Oaxaca: 882 mdp

Meta 2025: 27 km

- Guerrero: 1 km
- Oaxaca: 26 km

**Inversión 2026:** 2,757 mdp

- Oaxaca: 2,757 mdp

Meta 2026: 37 km

**Inicio :** 1 de abril de 2025
Termino: 31 de diciembre 2029
Término meta 2025: 30 de mayo de 2026

**74,166** empleos generados
1,947,399 habitantes beneficiados


Beneficios: Reducción en tiempos de traslados de la Costa Chica de Gro. hacia Puerto Escondido Oax., reduciendo costos operativos e impulsando el turismo local y nacional de los municipios de Acapulco, San Marcos, Florencio Villareal, Cuajinicuilapa, Pinotepa Nacional, Villa de Tututepec, San Pedro Mixtepec, Pochutla y Huatulco.

Oaxaca/Guerrero

Salina Cruz-Zihuatanejo (MEX-200)

Elemento	Meta	Ejecutado Acumulable	Faltante	17-04-26 al 23-04-26	
				Programado	Ejecutado
Troncal	*13.58 km	*13.35 km	*0.23 km	0.0%	0.0%
8 puentes	8 pts	95.8% de 8 pts	4.2% de 8 pts	0.0%	0.8%
OBSERVACIONES					
Oaxaca Tramo 1 (0 frentes de trabajo) Concluido. Tramo 2 (0 frentes de trabajo) Sin actividad Tramo 3 (0 frentes de trabajo) Concluido Guerrero Puente Las Vigas km 81+200: Concluido. Puente Agua Hedionda Km 106+760: Concluido. Puente Copala Km 116+000: Concluido. Puente Marquelia I km 135+500: Concluido. Puente Nexpa km 85+300: Trabajos de pintura y Limpieza de Caudal. Puente Talapilla km 171+857: Concluido Puente Rio Quetzala Km 173+711: Montaje de trabes claro 4-5 y 5-6, Armado y cimbrado de diafragmas de los siguientes claros, Colocación de losacero y Armado y cimbrado de losas. Puente Santa Catarina km 183+740: Descimbrado de la guarnición, Colocación y Tendido de Base Hidráulica y Conos de derrame.					

Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Salina Cruz - Zihuatanejo

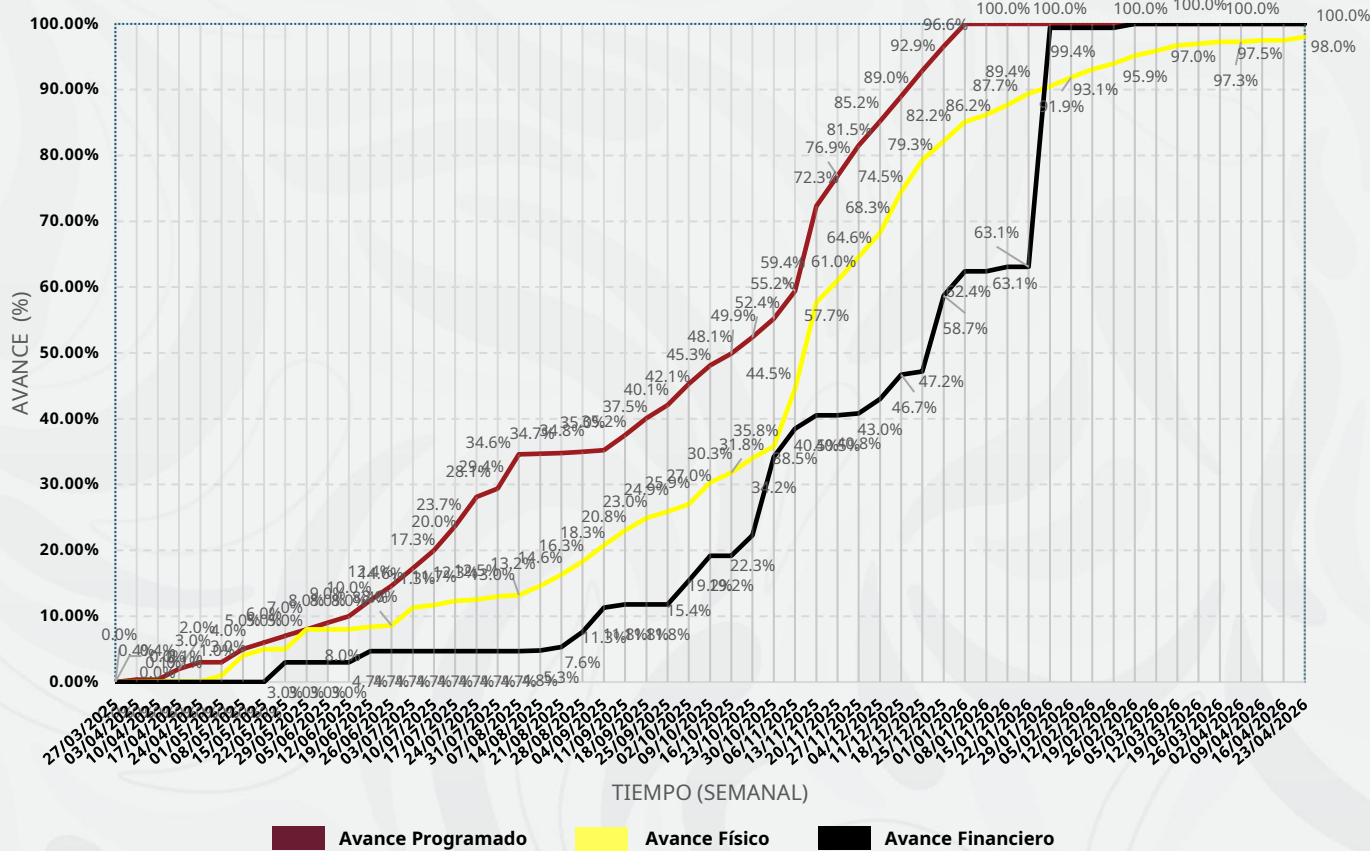

	10 de abril al 16 de abril 2026	17 de abril al 23 de abril 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	86	70
Maquinaria	54	59
Frentes	11	9

* 13.58 km se realizó un convenio en reducción de volúmenes del tramo I
