

San Luis Potosí - Hidalgo

Tamazunchale – Huejutla – Pachuca



Avance global

- Programado: 29.87%
- Real: 29.21%
- Semanal: 0.53%
- Financiero: 27.81%

Avance 2025

- Programado: 100%
- Real: 100%
- Semanal: 0.0%
- Financiero: 100%

Avance 2026

- Programado: 14.59%
- Real: 14.08%
- Semanal: 1.27%
- Financiero: 11.27%



Inversión total 2025-2028: 7,002.7 mdp

- Hidalgo: 4,192.8 mdp
- SLP: 2,809.9 mdp

Meta total 2025-2028: 158 km

Hidalgo:

- 130 km

San Luis Potosí:

- 28 km



Inversión 2025: 1,650 mdp

- Hidalgo: 821.66 mdp
- San Luis Potosí: 827.86 mdp

Meta 2025: 26.8 km

- Hidalgo: 16.8 km
- San Luis Potosí: 10 km



Inversión 2026: 2,242.1 mdp

- Hidalgo: 1,453.6 mdp
- San Luis Potosí: 788.5 mdp

Meta 2026: Hidalgo 29.5 km (4 puentes) y San Luis Potosí 7 km A2 y (3 puentes)



Inicio : 28 de abril 2025

Término: diciembre 2030

Término meta 2025: 28 de febrero de 2026



20,022 empleos generados




TDPA: 17,318 Veh/hr

+395 mil habitantes beneficiados en los municipios de Huejutla de Reyes, Jaltocán, Lolotla, Metztitlán, Molango de Escamilla, San Felipe Orizatlán, Tlanchinol, Xochicoatlán y Zacualtipán de Ángeles en Hidalgo y Tamazunchale, en San Luis Potosí.



65 min de ahorro en tiempo

Beneficios: Conecta de manera eficiente y segura el centro del país con la Sierra Hidalguense y la Huasteca Potosina.

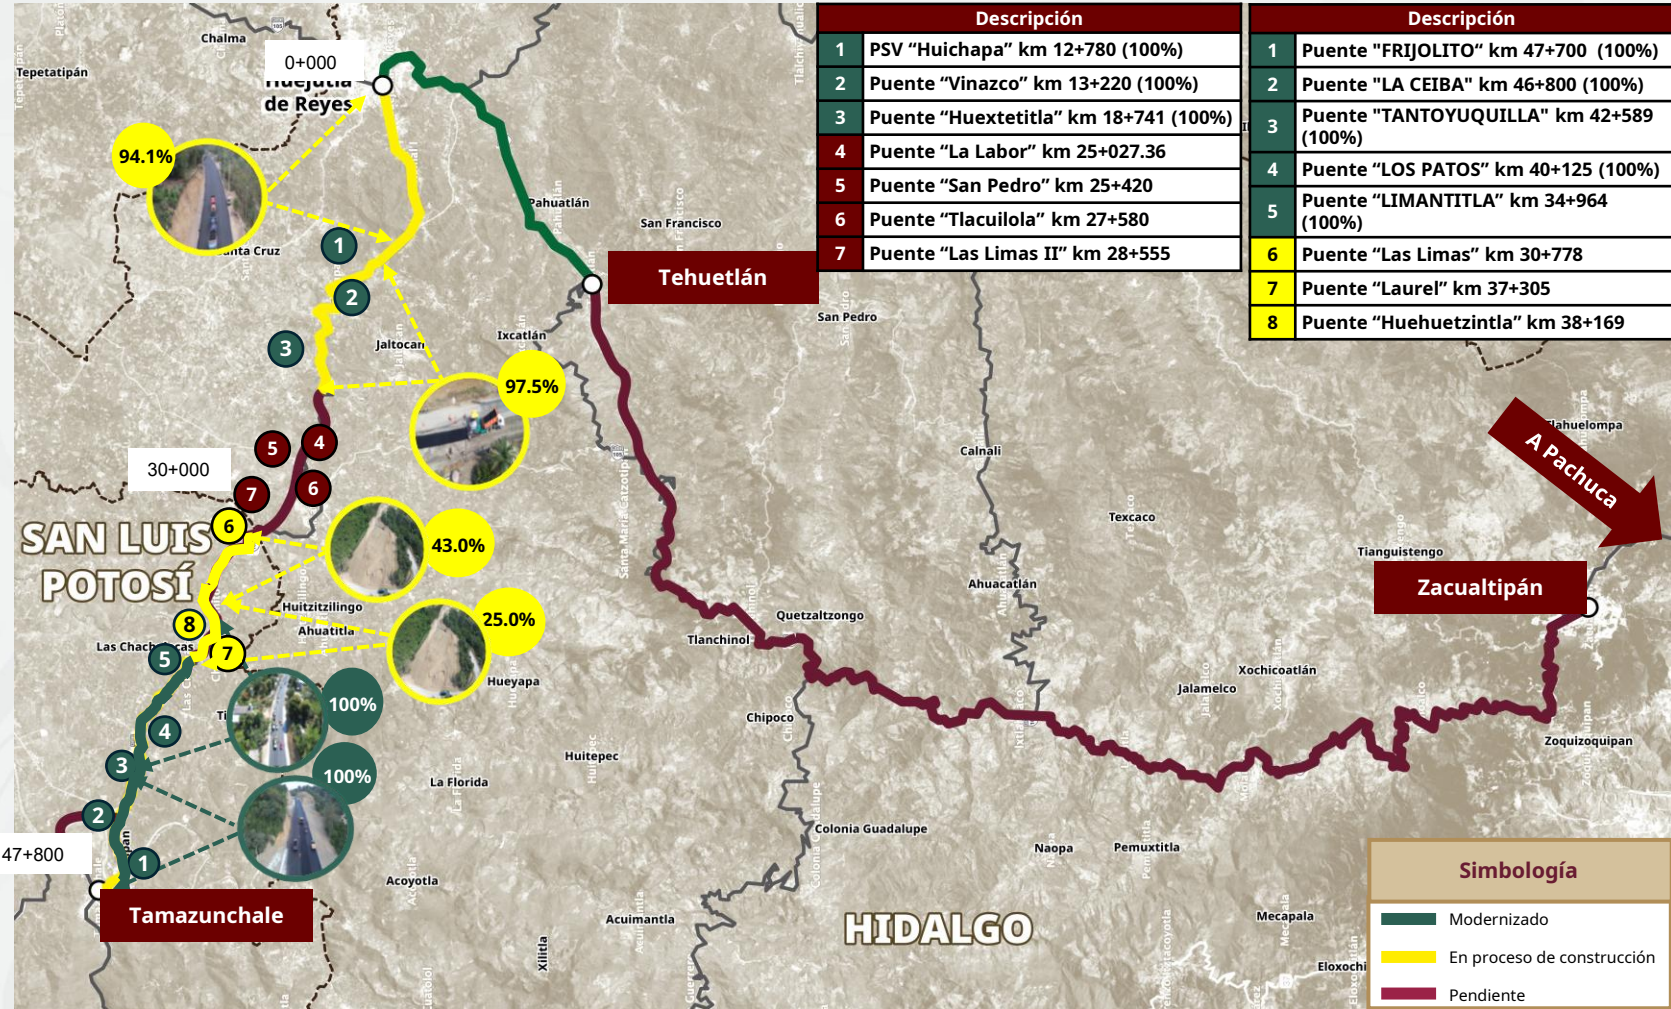



San Luis Potosí - Hidalgo

Tamazunchale – Huejutla


Km 30+500 al Km 34+140

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 05/06/2026 al 11/06/2026		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
TERRACERÍAS								
Despalme	m³	24,896.0	15,864.0	63.72%	9,032.0	2,271.5	0.0	En proceso
Cortes	m³	376,161.0	124,320.0	33.05%	251,841.0	28,868.0	12,840.0	En proceso
Terraplenes 90%	m³	85,691.0	1,000.0	1.17%	84,691.0	5,712.7	0.0	En proceso
Pedraplen	m³	27,537.0	15,982.0	58.04%	11,555.0	2,503.4	0.0	En proceso
Subyacente	m³	39,813.0	15,680.0	39.38%	24,133.0	2,488.3	4,040.0	En proceso
Subrasante	m³	18,354.0	5,628.0	30.66%	12,726.0	1,079.0	509.0	En proceso
OBRAS DE DRENAJE								
Obras de drenaje	pza.	7	3.5	50.00%	3.5	0.5	0.5	En proceso
PAVIMENTOS								
Base hidráulica	m³	8,798.0	3,640.0	41.37%	5,158.0	628.4	1,096.0	En proceso
Base asfáltica	m³	5,083.0	1,526.0	30.02%	3,557.0	564.8	726.0	En proceso
Carpeta asfáltica	m³	3,307.0	0.0	0.00%	3,307.0	0.0	0.0	En proceso
Puentes	pza.	1.0	0.0	0.00%	1.0	0.0	0.0	Por iniciar
SEÑALAMIENTO								
Obra complementaria	km	3.6	0.0	0.00%	3.60	0.0	0.0	Por iniciar
Señalamiento definitivo	km	3.6	0.0	0.00%	3.60	0.0	0.0	Por iniciar

km 35+160 al km 38+820

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 05/06/2026 al 11/06/2026		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
TERRACERÍAS								
Despalme	m³	34,330.0	6,032.0	17.57%	28,298.0	2,288.7	0.0	En proceso
Cortes	m³	203,755.0	74,134.6	36.38%	129,620.4	11,845.8	13,072.8	En proceso
Terraplenes 90%	m³	78,664.0	19,504.0	24.79%	59,160.0	4,878.5	17,673.7	En proceso
Pedraplen	m³	33,734.0	20,067.7	59.49%	13,666.3	2,558.8	2,893.1	En proceso
Subyacente	m³	23,233.0	8,309.8	35.77%	14,923.2	2,323.0	1,576.2	En proceso
Subrasante	m³	16,228.0	3,610.2	22.25%	12,617.8	901.6	1,066.7	En proceso
OBRAS DE DRENAJE								
Obras de drenaje Tubería	pza.	12	4.5	37.50%	7.5	0.6	0.5	En proceso
PAVIMENTOS								
Base hidráulica	m³	7,895.0	1,484.5	18.80%	6,410.5	464.4	266.1	En proceso
Base asfáltica	m³	4,561.0	385.2	8.45%	4,175.8	325.8	0.0	En proceso
Carpeta asfáltica	m³	3,327.0	0.0	0.00%	3,327.0	0.0	0.0	En proceso
Puentes	pza.	2.0	0.0	0.00%	2.0	0.0	0.0	Por iniciar
SEÑALAMIENTO								
Obra complementaria	km	3.6	0.0	0.00%	3.60	0.0	0.0	Por iniciar
Señalamiento definitivo	km	3.6	0.0	0.00%	3.60	0.0	0.0	Por iniciar

Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Tamazunchale - Huejutla

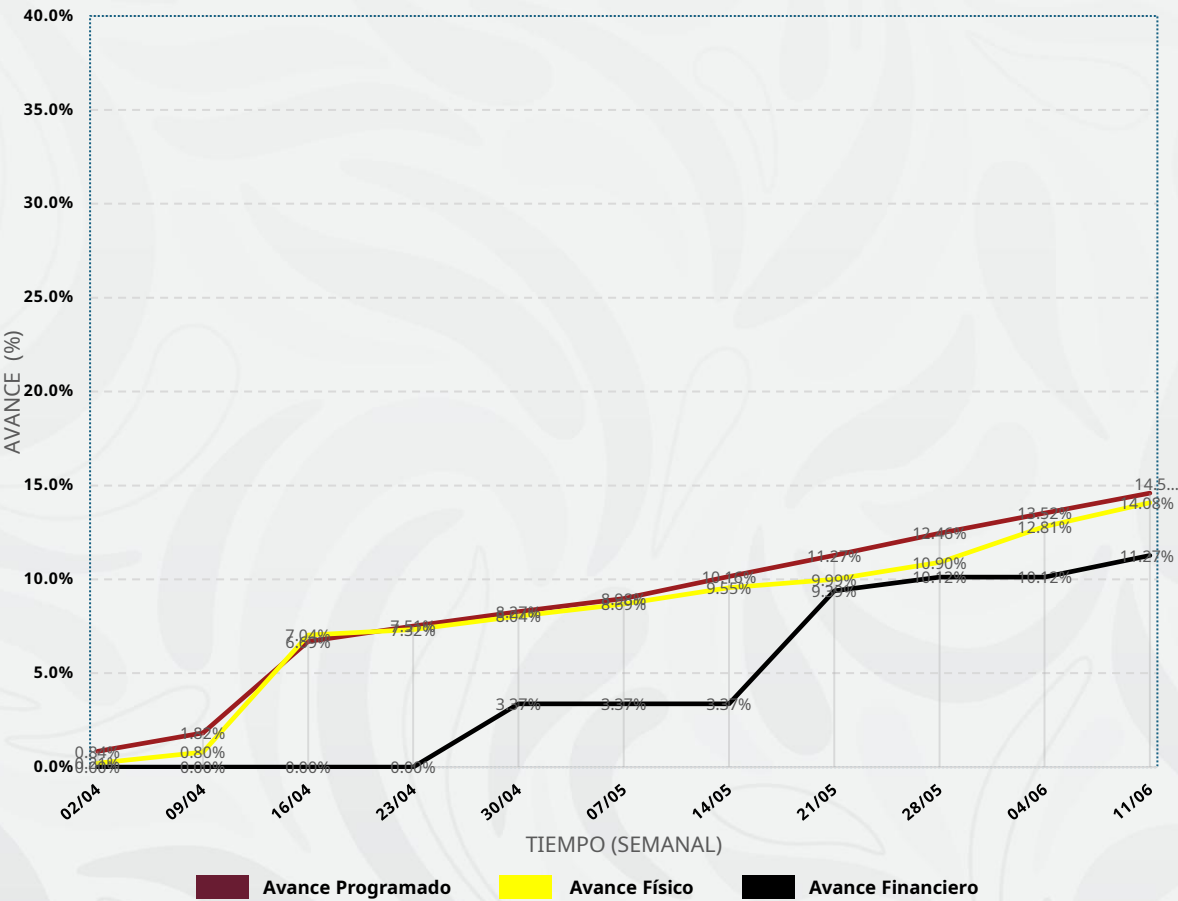

	29 de mayo al 04 de junio	05 de junio al 11 de junio
Fuerza de Trabajo (personas)	257	257
Maquinaria	154	155
Frentes	24	22



San Luis Potosí - Hidalgo

Tamazunchale - Huejutla - Pachuca

km 0+000 al km 10+000

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	05/06/26 al 11/06/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Desmonte (Ha)	20.0	20.0	-	-	-	Concluido
Despalme (m3)	21,500.0	21,500.0	-	-	-	Concluido
Cortes (m3)	183,255.0	183,255.0	-	-	-	Concluido
Terraplén (m3)	42,250.0	42,250.0	-	-	-	Concluido
Subyacente (m3)	93,012.0	93,012.0	-	-	-	Concluido
Subrasante (m3)	36,638.0	36,638.0	-	-	-	Concluido
Excavación estructuras y O.D. (m3)	14,264.6	14,264.6	-	-	-	Concluido
Demolición de concreto hidráulico (m3)	3,727.5	3,727.5	-	-	-	Concluido
Base hidráulica (m3)	30,000.0	30,000.0	-	-	-	Concluido
Base asfáltica (m3)	16,760.0	16,690.0	70.0	0.0	0.0	
Carpeta asfáltica (m3)	10,692.0	6,852.0	3,840.0	0.0	432.0	
Puentes peatonales (pza)	2.0	0.8	1.2	0.0	0.0	Reducción meta por conflicto social
Señalamiento (m)	43,334.0	0.0	43,334.0	0.0	0.0	



Avances físicos (San Luis Potosí)

km 10+000 al km 20+000

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	05/06/26 al 11/06/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Desmonte (Ha)	36.0	36.0	-	-	-	Concluido
Despalme (m3)	31,500.0	31,500.0	-	-	-	Concluido
Cortes (m3)	347,581.0	347,581.0	0.0	0.0	1,481.0	
Terraplén (m3)	251,735.0	251,735.0	-	-	-	Concluido
Subyacente (m3)	77,344.0	77,344.0	-	-	-	Concluido
Subrasante (m3)	32,248.0	32,248.0	-	-	-	Concluido
Excavación estructuras y O.D. (m3)	133,739.6	133,739.6	-	-	-	Concluido
Base hidráulica (m3)	30,000.0	30,000.0	-	-	-	Concluido
Base asfáltica (m3)	16,760.0	16,300.0	460.0	0.0	150.0	
Carpeta asfáltica (m3)	10,692.0	160.0	10,532.0	0.0	0.0	
Señalamiento (m)	43,334.0	0.0	43,334.0	0.0	0.0	



Avances físicos (Hidalgo)

San Luis Potosí - Hidalgo

Tamazunchale – Huejutla – Pachuca

Inversiones y metas 2025 - 2030

	2025		2026		PEF		FONADIN		VDG		2027		2028		2029		2030		Total	
	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta
Pachuca-Huejutla-Tamanzuchale	1,649.5	27	2,242.1	37	1,682.1	21	0	0	560	16	1,940	52	1,061	42	55.5	0	54.5	0	7,002.6	158
Hidalgo	821.7	17	1453.6	30	1093.6	-	-	-	360	-	1,040	48	778	36	50	-	49.5	-	4,192.8	131
San Luis Potosi	827.9	10	788.5	7	588.5	-	-	-	200	-	900	4	283	6	5.5	-	5	-	2,809.9	27
