

Salina Cruz-Zihuatanejo (MEX-200)

Tramo Guerrero



Avance global	- Programado: 9.23% - Real: 7.82%	- Semanal: 0.01% - Financiero: 6.80%	Avance 2025	- Programado: 100.0% - Real: 99.35%	- Semanal: 0.38% - Financiero: 100.0%	Avance 2026	- Programado: 47.70% - Real: 27.72%	- Semanal: 6.91% - Financiero: 2.38%
----------------------	--	---	--------------------	--	--	--------------------	--	---



Descripción	
1	Puente Las Vigas Km 81+200 123 m
2	Puente Río Nexpa Km 85+300 425 m
3	Puente Agua Hedionda Km 106+760 21 m
4	Puente Copala Km 116+000 120 m
5	Puente Marquelia I Km 135+500 220 m
6	Puente Talapilla Km 171+857 41 m
7	Puente Río Quetzala Km 173+711 190 m
8	Puente Santa Catarina Km 184+744 101 m
9	Tramo 9 IG=km 209+500 AT - km 209+240 AD al km 219+540 10.30 km
10	Tramo 10 km 219+540 al km 229+600 10.06 km
11	Tramo 11 km 229+600 al km 234+843.77 5.24 km



Inversión total 2025-2030:
25,563 mdp

- Guerrero: 6,390 mdp
- Oaxaca: 19,173 mdp

Meta total 2025-2030: 446 km

- Guerrero: 103 km
- Oaxaca: 343 km



Inversión 2025:
1,606 mdp

- Guerrero: 724 mdp
- Oaxaca: 882 mdp

Meta 2025: 27 km

- Guerrero: 1 km
- Oaxaca: 26 km



Inversión 2026:
1,412 mdp

- Oaxaca: 1,275 mdp
- Guerrero: 136 mdp

Meta 2026: 10 km

- Guerrero: 2 km
- Oaxaca: 8 km



Inicio : de abril de 2025
Termino: 31 de diciembre 2029
Término meta 2025: 30 de junio de 2026



76,689 empleos generados




1,947,399 habitantes beneficiados

Beneficios: Reducción en tiempos de traslados de la Costa Chica de Gro. hacia Puerto Escondido Oax., reduciendo costos operativos e impulsando el turismo local y nacional de los municipios de Acapulco, San Marcos, Florencio Villareal, Cuajinicuilapa, Pinotepa Nacional, Villa de Tututepec, San Pedro Mixtepec, Pochutla y Huatulco.

Oaxaca/Guerrero

Salina Cruz-Zihuatanejo (MEX-200)

Elemento	Meta	Ejecutado Acumulable	Faltante	05-06-26 al 11-06-26	
				Programado	Ejecutado
Troncal	*13.58 km	*13.57 km	*0.01 km	0.0%	0.1%
8 puentes	8 pts	96.62% de 8 pts	3.38% de 8 pts	0.0%	0.12%
OBSERVACIONES					
Oaxaca Tramo 1 (0 frentes de trabajo) Concluido. Tramo 2 (5 frentes de trabajo) Tendido y compactación de carpeta asfáltica del km. 222+300 al km. 223+350 lado derecho. Del km 222+050 al km 223+150 franja central y del km 221+650 al km 222+050 lado Izquierdo, Construcción bordillos, del km. 221+100 al km. 221+200 y Colocación de Señalamiento vertical (Pintura) del km. 221+000 al km. 224+100. Tramo 3 (0 frentes de trabajo) Concluido					
Guerrero Puente Las Vigas km 81+200: Concluido. Puente Agua Hedionda Km 106+760: Concluido. Puente Copala Km 116+000: Concluido. Puente Marquelia I km 135+500: Concluido. Puente Nexpa km 85+300: Concluido. Puente Talapilla km 171+857: Concluido Puente Río Quetzala Km 173+711: Tendido de carpeta asfáltica, habilitado de acero para muro de contención y cimbrado para colado de muro de contención. Puente Santa Catarina km 183+740: Habilitado y colado de lavaderos.					

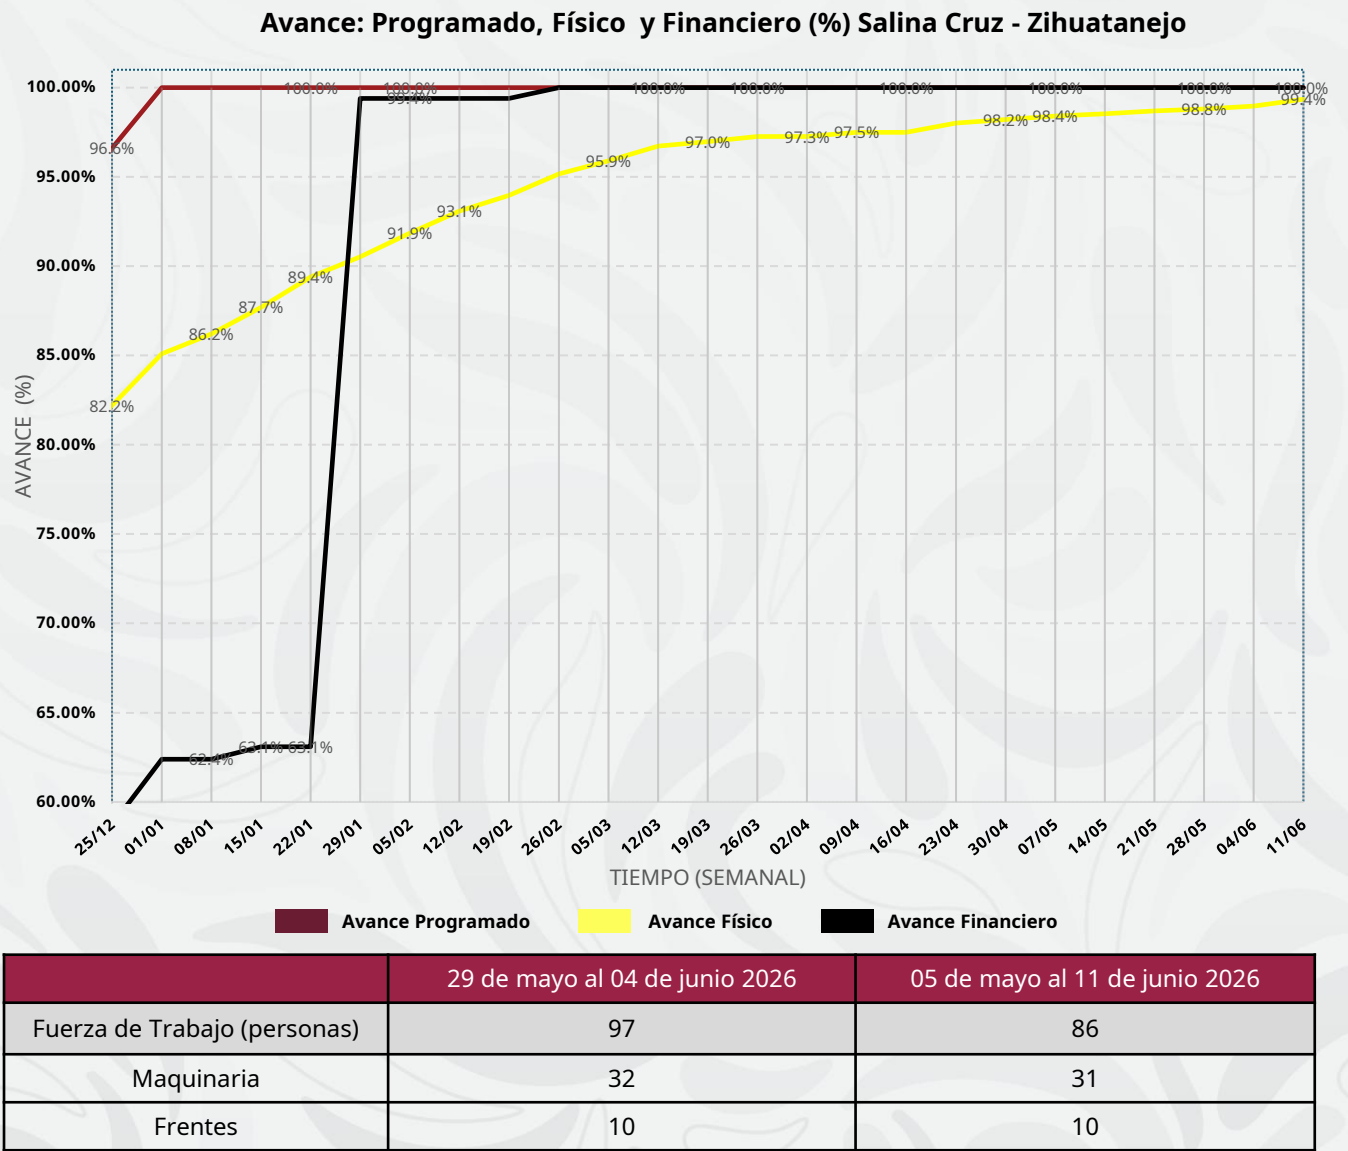

* 13.58 km se realizó un convenio en reducción de volúmenes del tramo I
