



Salina Cruz-Zihuatanejo (MEX-200)

Tramo Guerrero

Avance global	- Programado: 9.22% - Real: 7.80%	- Semanal: 0.01% - Financiero: 6.80%	Avance 2025	- Programado: 100.0% - Real: 98.80%	- Semanal: 0.10% - Financiero: 100.0%	Avance 2026	- Programado: 42.81% - Real: 17.01%	- Semanal: 1.75% - Financiero: 2.38%
----------------------	--	---	--------------------	--	--	--------------------	--	---



Descripción	
1	Puente Las Vigas Km 81+200 123 m
2	Puente Río Nexpa Km 85+300 425 m
3	Puente Agua Hedionda Km 106+760 21 m
4	Puente Copala Km 116+000 120 m
5	Puente Marquelia I Km 135+500 220 m
6	Puente Talapilla Km 171+857 41 m
7	Puente Río Quetzala Km 173+711 190 m
8	Puente Santa Catarina Km 184+744 101 m
9	Tramo 9 IG=km 209+500 AT – km 209+240 AD al km 219+540 10.30 km
10	Tramo 10 km 219+540 al km 229+600 10.06 km
11	Tramo 11 km 229+600 al km 234+843.77 5.24 km

Inversión total 2025-2030:
25,563 mdp

- Guerrero: 6,390 mdp
- Oaxaca: 19,173 mdp

Meta total 2025-2030: 446 km

- Guerrero: 103 km
- Oaxaca: 343 km

Inversión 2025:
1,606 mdp

- Guerrero: 724 mdp
- Oaxaca: 882 mdp

Meta 2025: 27 km

- Guerrero: 1 km
- Oaxaca: 26 km

Inversión 2026:
1,412 mdp

- Oaxaca: 1,275 mdp
- Guerrero 136 mdp

Meta 2026: 10 km

- Guerrero: 2 km
- Oaxaca: 8 km

Inversión 2027:
8,717 mdp

- Guerrero: 2,138 mdp
- Oaxaca: 6,579 mdp

Meta total 2027: 161 km

- Guerrero: 39 km
- Oaxaca: 122 km

Inversión 2028:
7,000 mdp

- Guerrero: 1,717 mdp
- Oaxaca: 5,283 mdp

Meta 2028: 130 km

- Guerrero: 32 km
- Oaxaca: 98 km

Inversión 2029:
6,409 mdp

- Guerrero: 1,572 mdp
- Oaxaca: 4,837 mdp

Meta 2029: 118 km

- Guerrero: 29 km
- Oaxaca: 89 km

Inversión 2030:
419 mdp

- Guerrero: 103 mdp
- Oaxaca: 316 mdp

Inicio : 1 de abril de 2025
Termino: 31 de diciembre 2029
Término meta 2025: 20 de abril de 2026

74,166 empleos generados

1,947,399 habitantes beneficiados

Beneficios: Reducción en tiempos de traslados de la Costa Chica de Gro. hacia Puerto Escondido Oax., reduciendo costos operativos e impulsando el turismo local y nacional de los municipios de Acapulco, San Marcos, Florencio Villareal, Cuajinicuilapa, Pinotepa Nacional, Villa de Tututepec, San Pedro Mixtepec, Pochutla y Huatulco.

Oaxaca/Guerrero

Salina Cruz-Zihuatanejo

Inversiones 2025 - 2030

	2025	2026	PEF	FONADIN	VDG	2027	2028	2029	2030	Total
Salina Cruz-Zihuatanejo	1,606.3	1,411.5	861.5	0.0	550.0	8,717.0	7,000.0	6,409.0	419.0	25,562.8
Guerrero	723.9	136.4	1.4	0.0	135.0	2,138.0	1,717.0	1,572.0	103.0	6,390.3
Oaxaca	882.4	1,275.1	860.1	0.0	415.0	6,579.0	5,283.0	4,837.0	316.0	19,172.5

Metas 2025 - 2030

	2025	2026	PEF	FONADIN	VDG	2027	2028	2029	2030	Total
Salina Cruz-Zihuatanejo	27	10	1	0	9	161	130	118	0	446
Guerrero	1	2	1	0	1	39	32	29	0	103
Oaxaca	26	8	0	0	8	122	98	89	0	343

Oaxaca/Guerrero

Salina Cruz-Zihuatanejo (MEX-200)



Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Salina Cruz - Zihuatanejo

Elemento	Meta	Ejecutado Acumulado	Faltante	22-05-26 al 28-05-26	
				Programado	Ejecutado
Troncal	*13.58 km	*13.40 km	*0.18 km	0.0%	1.6%
8 puentes	8 pts	96.48% de 8 pts	3.58% de 8 pts	0.0%	0.1%

OBSERVACIONES

Oaxaca


Tramo 1 (0 frentes de trabajo)
Concluido.

Tramo 2 (0 frentes de trabajo)
Producción de mezcla asfáltica para carpeta, en banco de materiales ubicado en el km. 224+250 desv. izquierda 50 m., y Tendido y compactación de carpeta asfáltica del km. 224+600 al km. 225+100.

Tramo 3 (0 frentes de trabajo)
Concluido

Guerrero

Puente Las Vigas km 81+200:
Concluido.
Puente Agua Hedionda Km 106+760:
Concluido.
Puente Copala Km 116+000:
Concluido.
Puente Marquelia I km 135+500:
Concluido.
Puente Nexpa km 85+300:
Reubicación y colocación de defensa metálica.
Puente Talapilla km 171+857:
Concluido
Puente Rio Quetzala Km 173+711:
Trabajos en terracería para accesos, Descimbrado de losas de acceso, Colado de guarnición y banquetas en segunda etapa y Excavación y corte para muro de contención.
Puente Santa Catarina km 183+740:
Limpieza de cunetas revestidas.

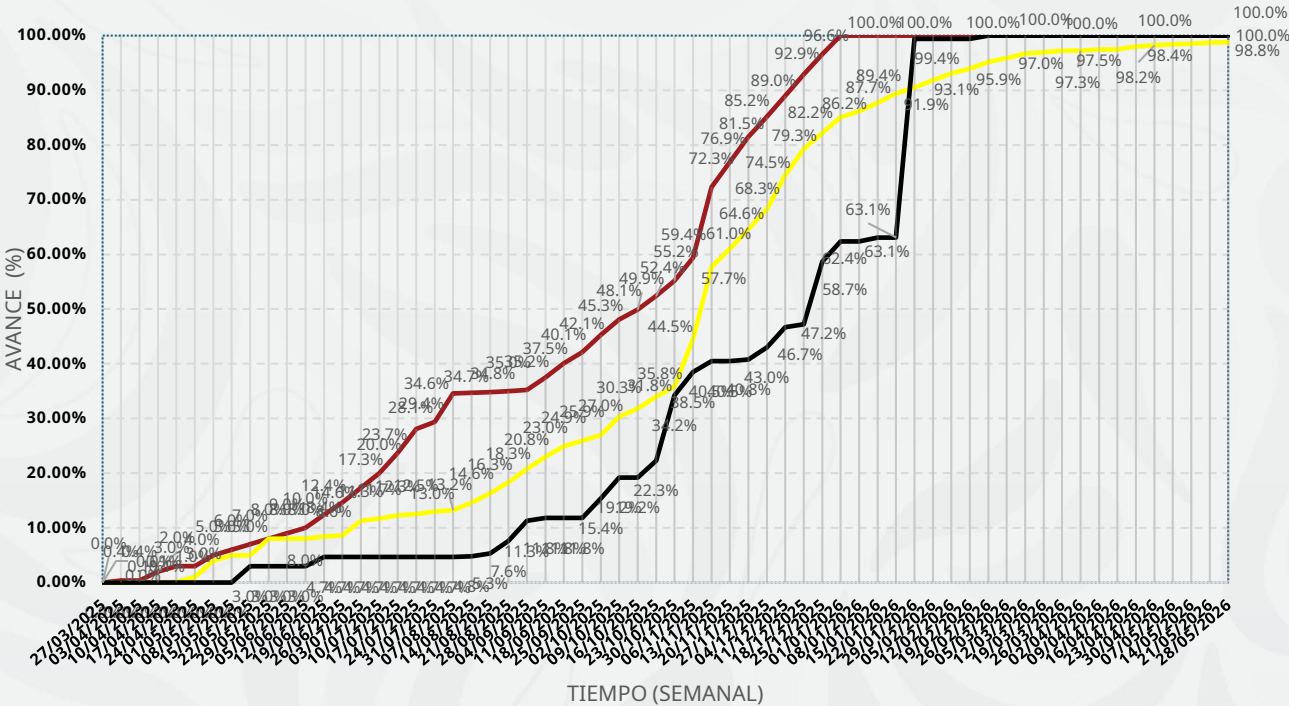

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	15 de mayo al 21 de mayo 2026	22 de mayo al 28 de mayo 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	111	110
Maquinaria	35	32
Frentes	13	11

* 13.58 km se realizó un convenio en reducción de volúmenes del tramo I
