

San Luis Potosí - Hidalgo

Tamazunchale – Huejutla – Pachuca



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance global

- Programado: 29.03%
- Real: 27.89%
- Semanal: 0.41%
- Financiero: 27.81%

Avance 2025

- Programado: 100%
- Real: 100%
- Semanal: 0.0%
- Financiero: 100%

Avance 2026

- Programado: 12.46%
- Real: 10.90%
- Semanal: 0.91%
- Financiero: 10.12%



Inversión total 2025-2028: 6,674 mdp

- Hidalgo: 3,779 mdp
- SLP: 2,895 mdp

Meta total 2025-2028: 158 km

Hidalgo:

- 130 km

San Luis Potosí:

- 28 km



Inversión 2025: 1,650 mdp

- Hidalgo: 821.66 mdp
- San Luis Potosí: 827.86 mdp

Meta 2025: 30 km

- Hidalgo: 20 km
- San Luis Potosí: 10 km



Inversión 2026: 2,490 mdp

- Hidalgo: 1,861 mdp
- San Luis Potosí: 629 mdp

Meta 2026: Hidalgo 55 km (4 puentes) y San Luis Potosí 7 km A2 y (3 puentes)




Inicio : 28 de abril 2025

Término: diciembre 2028

Término meta 2025: 28 de febrero de 2026



20,022 empleos generados

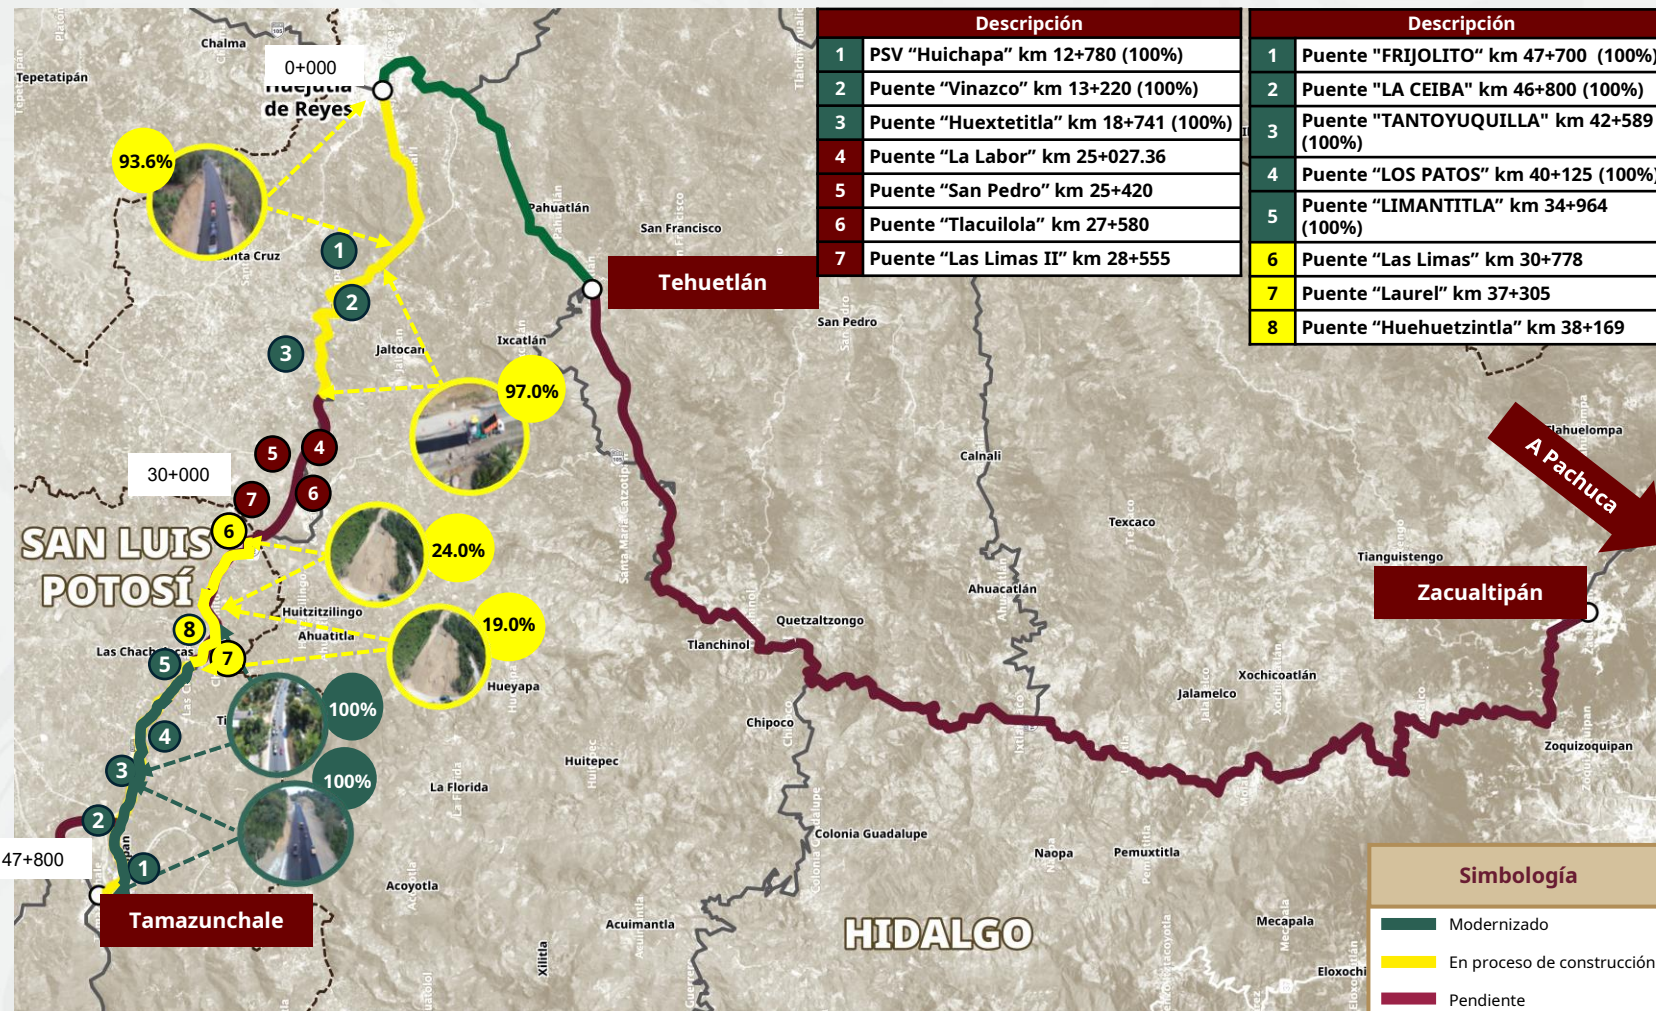

TDPA: 17,318 Veh/hr



+395 mil habitantes beneficiados en los municipios de Huejutla de Reyes, Jaltocán, Lolotla, Metztitlán, Molango de Escamilla, San Felipe Orizatlán, Tlanchinol, Xochicoatlán y Zacualtipán de Ángeles en Hidalgo y Tamazunchale, en San Luis Potosí.



65 min de ahorro en tiempo

Beneficios: Conecta de manera eficiente y segura el centro del país con la Sierra Hidalguense y la Huasteca Potosina.

San Luis Potosí - Hidalgo

Tamazunchale – Huejutla


Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Tamazunchale - Huejutla

Km 30+500 al Km 34+140

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 22/05/2026 al 28/05/2026		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
TERRACERÍAS								
Despalme	m³	24,896.0	15,864.0	63.72%	9,032.0	2,271.5	0.0	En proceso
Cortes	m³	376,161.0	105,640.0	28.08%	270,521.0	28,868.0	18,290.0	En proceso
Terraplenes 90%	m³	85,691.0	1,000.0	1.17%	84,691.0	5,712.7	0.0	En proceso
Pedraplen	m³	27,537.0	15,982.0	58.04%	11,555.0	2,503.4	0.0	En proceso
Subyacente	m³	39,813.0	11,640.0	29.24%	28,173.0	2,488.3	2,493.0	En proceso
Subrasante	m³	18,354.0	5,119.0	27.89%	13,235.0	1,079.0	569.0	En proceso
OBRAS DE DRENAJE								
Obras de drenaje	pza.	7	3	42.86%	4.0	0.5	0.0	En proceso
PAVIMENTOS								
Base hidráulica	m³	8,798.0	1,100.0	12.50%	7,698.0	628.4	500.0	En proceso
Base asfáltica	m³	5,083.0	0.0	0.00%	5,083.0	0.0	0.0	Por iniciar
Carpeta asfáltica	m³	3,307.0	0.0	0.00%	3,307.0	0.0	0.0	Por iniciar
Puentes	pza.	1.0	0.0	0.00%	1.0	0.0	0.0	Por iniciar
SEÑALAMIENTO								
Obra complementaria	km	3.6	0.0	0.00%	3.60	0.0	0.0	Por iniciar
Señalamiento definitivo	km	3.6	0.0	0.00%	3.60	0.0	0.0	Por iniciar

km 35+160 al km 38+820

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 22/05/2026 al 28/05/2026		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
TERRACERÍAS								
Despalme	m³	34,330.0	6,032.0	17.57%	28,298.0	2,288.7	0.0	En proceso
Cortes	m³	203,755.0	58,991.3	28.95%	144,763.7	11,845.8	1,913.0	En proceso
Terraplenes 90%	m³	78,664.0	875.0	1.11%	77,789.0	4,878.5	875.0	En proceso
Pedraplen	m³	33,734.0	16,504.1	48.92%	17,229.9	2,558.8	1,116.0	En proceso
Subyacente	m³	23,233.0	6,283.0	27.04%	16,950.0	2,323.0	0.0	En proceso
Subrasante	m³	16,228.0	2,207.0	13.60%	14,021.0	901.6	543.0	En proceso
OBRAS DE DRENAJE								
Obras de drenaje Tubería	pza.	12	3	25.00%	9	0.6	1.0	En proceso
PAVIMENTOS								
Base hidráulica	m³	7,895.0	842.3	10.67%	7,052.7	464.4	486.0	En proceso
Base asfáltica	m³	4,561.0	264.0	5.79%	4,297.0	325.8	264.0	En proceso
Carpeta asfáltica	m³	3,327.0	0.0	0.00%	3,327.0	0.0	0.0	Por iniciar
Puentes	pza.	2.0	0.0	0.00%	2.0	0.0	0.0	Por iniciar
SEÑALAMIENTO								
Obra complementaria	km	3.6	0.0	0.00%	3.60	0.0	0.0	Por iniciar
Señalamiento definitivo	km	3.6	0.0	0.00%	3.60	0.0	0.0	Por iniciar

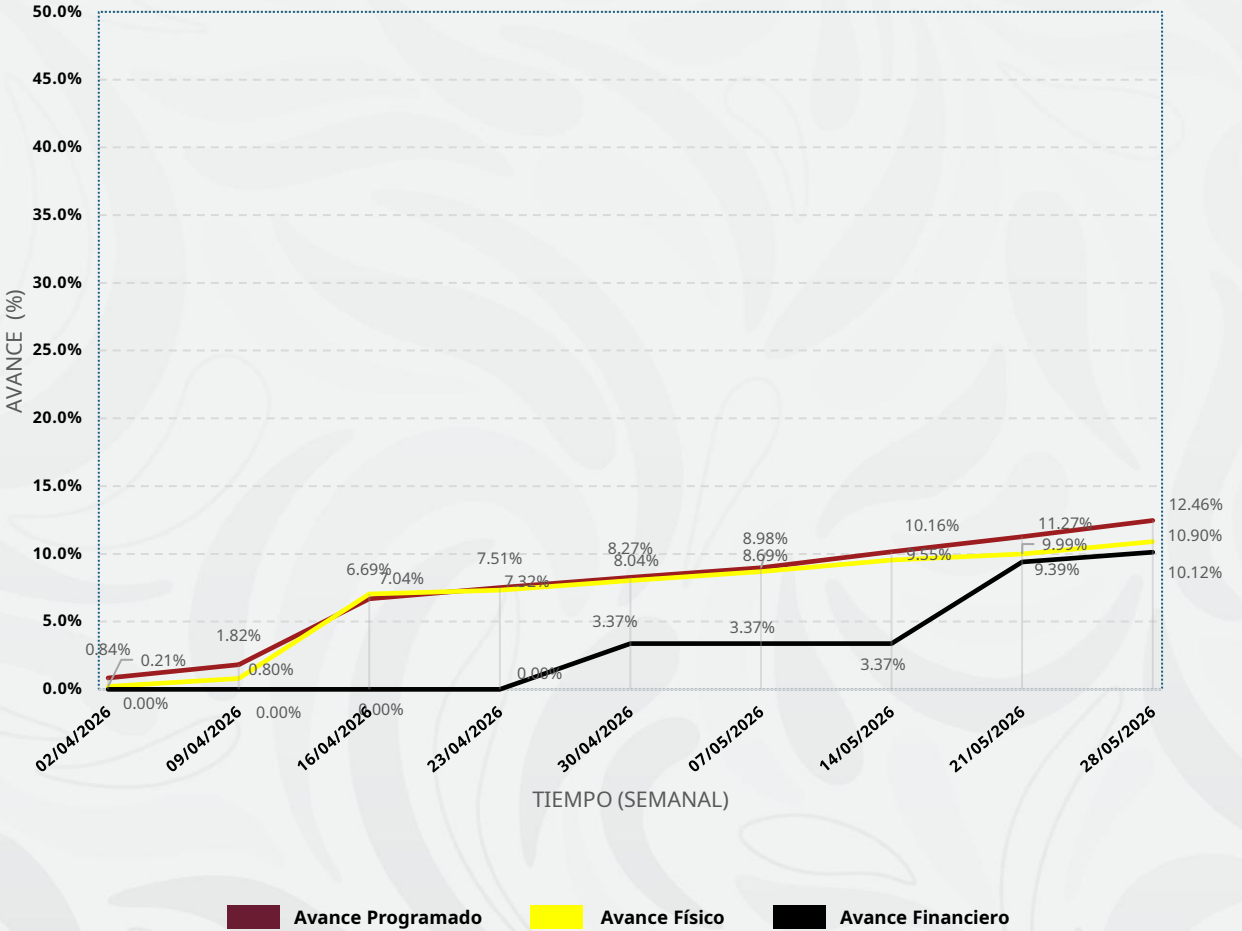

	15 de mayo al 21 de mayo	22 de mayo al 28 de mayo
Fuerza de Trabajo (personas)	244	257
Maquinaria	150	154
Frentes	21	24
