

Guaymas – Esperanza – Yécora - Chihuahua



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance 2025

Avance Programado: 100.0 %

Avance Real: 98.00 %

Avance Financiero: 50.80 %

Avance 2026

Avance Programado: 1.73%

Avance Real: 2.04%

Avance Financiero: 0.48%

*Los avances incluyen datos VDG



Inversión total: 19,163 mdp

• Sonora: 12,606 mdp

• Chihuahua: 6,557 mdp

Meta total: 450 km

• Sonora: 252 km y 26 puentes

• Chihuahua: 198 km

Avance Global

Avance Programado: 8.51 %

Avance Real: 8.56 %

Avance Financiero: 1.27 %



Inversión 2025: 450 mdp

• Sonora: 450 mdp

Meta 2025: 10 km y 4 puentes

• Sonora: 10 km y 4 puentes



Inversión PEF 2026: 450.0 mdp (Son)

Meta 2026: 14.3 km (Son) (9.3 km y 2 puentes contratados y 5.0 km en proceso de licitación)

Inversión VDG 2026: 2,480.8 mdp (Son y Chih)

Meta 2026: 59.7 km (Son y Chih)



Inicio : 20 de octubre de 2025

Termino: diciembre de 2029

2025

Inicio: 20 de octubre de 2025

Término: 15 de julio de 2026

2026

Inicio: 01 de abril de 2026

Término: 31 de diciembre de 2026



669,912 habitantes beneficiados

Beneficios:

- Derrama económica regional.
- Fortalecimiento de exportaciones.
- Impulso al crecimiento turístico.
- Mejora en los puntos de salida para la producción agropecuaria, manufacturera e industrial.



57,489 empleos generados



Guaymas – Esperanza – Yécora – Chihuahua (2025)

Tramo: km 17+300 al km 27+200 (*MARINA*)




Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	12-06-26 al 18-06-26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Trabajos preliminares (km)	9.97	9.97	-	-	-	-
Terracerías (km)	9.97	9.97	-	-	-	-
Obras de drenaje (Pza)	23	23	-	-	-	-
Pavimento (km)	9.97	8.17	1.80	0.0	0.0	-
Señalamiento (km)	9.97	8.0	1.97	0.0	0.0	-
Construcción Puente I (Canal alto)	100%	97.0%	3.10%	0.50%	0.10%	-
Construcción Puente II (Agua Caliente)	100%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-
Construcción Puente III (Chinitos I)	100%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-
Construcción Puente IV (Chinitos II)	100%	100.00%	0.00%	3.00%	0.00%	-

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

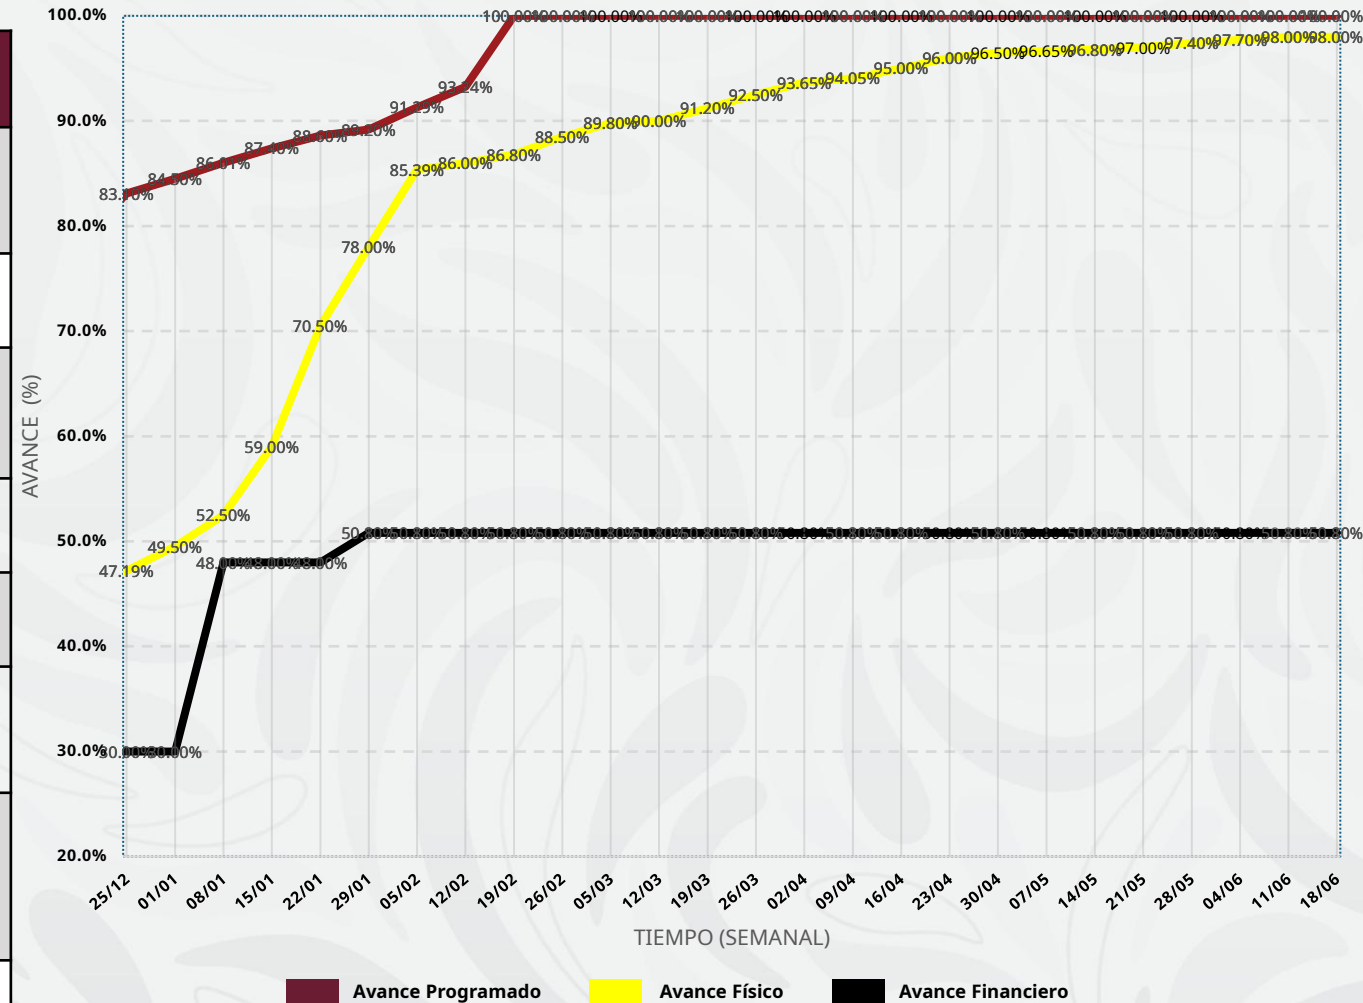

	05 al 11 de junio 2026	12 al 18 de junio 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	30	30
Maquinaria	4	4
Frentes de trabajo	2	2

Inversiones y metas 2025 - 2030

	Hasta 2024		2025		2026		PEF		VDG		2027		2028		2029		2030		Total	
	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta
Guaymas-Esperanza-Yécora-Chihuahua	-	27.0	450	10.0	2,931	74.0	450	14.3	2,481	59.7	4,186	118.1	4,186	118.1	3,610	102.6	3,800	-	19,163	450
Sonora	Gob. Edo.	27.0	450	10.0	2,388	50.6	450	14.3	1,938	36.3	2,791	57.9	2,791	57.9	2,351	48.4	1,836	-	12,606	252
Chihuahua		-	-	-	543	23.4	-	-	543	23.4	1,395	60.2	1,395	60.2	1,259	54.3	1,964	-	6,557	198
