

Salina Cruz-Zihuatanejo (MEX-200)

Tramo Guerrero



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance global	- Programado: 6.05% - Real: 6.05%	- Semanal: 0.0% - Financiero: 4.20%	Avance 2025	- Programado: 100.0% - Real: 99.43%	- Semanal: 0.08% - Financiero: 100.0%	Avance 2026	- Programado: 47.70% - Real: 28.86%	- Semanal: 1.14% - Financiero: 9.84%
----------------------	--	--	--------------------	--	--	--------------------	--	---



Descripción	
1	Puente Las Vigas Km 81+200 123 m
2	Puente Río Nexpa Km 85+300 425 m
3	Puente Agua Hedionda Km 106+760 21 m
4	Puente Copala Km 116+000 120 m
5	Puente Marquelia I Km 135+500 220 m
6	Puente Talapilla Km 171+857 41 m
7	Puente Río Quetzala Km 173+711 190 m
8	Puente Santa Catarina Km 184+744 101 m
9	Tramo 9 IG=km 209+500 AT – km 209+240 AD al km 219+540 10.30 km
10	Tramo 10 km 219+540 al km 229+600 10.06 km
11	Tramo 11 km 229+600 al km 234+843.77 5.24 km



Inversión total 2025-2030:
38,277.30 mdp

- Guerrero: 9,508.80 mdp
- Oaxaca: 28,768.50 mdp

Meta total 2025-2030: 446 km

- Guerrero: 103 km
- Oaxaca: 343 km



Inversión 2025:
1,606.0 mdp

- Guerrero: 724 mdp
- Oaxaca: 882 mdp

Meta 2025: 27 km

- Guerrero: 1 km
- Oaxaca: 26 km



Inversión 2026:
1,714 mdp

- Oaxaca: 1,504 mdp
- Guerrero: 210 mdp

Meta 2026: 10 km

- Guerrero: 2 km
- Oaxaca: 8 km



Inicio : 1 de abril de 2025
Termino: 31 de diciembre 2029
Término meta 2025: 30 de junio de 2026



114,832 empleos generados



1,947,399 habitantes beneficiados

Beneficios: Reducción en tiempos de traslados de la Costa Chica de Gro. hacia Puerto Escondido Oax., reduciendo costos operativos e impulsando el turismo local y nacional de los municipios de Acapulco, San Marcos, Florencio Villareal, Cuajinicuilapa, Pinotepa Nacional, Villa de Tututepec, San Pedro Mixtepec, Pochutla y Huatulco.

Oaxaca/Guerrero

Salina Cruz-Zihuatanejo (MEX-200)



Elemento	Meta	Ejecutado Acumulable	Faltante	12-06-26 al 18-06-26	
				Programado	Ejecutado
Troncal	*13.58 km	*13.58 km	*0.0 km	0.0%	0.1%
8 puentes	8 pts	96.83% de 8 pts	3.17% de 8 pts	0.0%	0.12%

OBSERVACIONES


Oaxaca

Tramo 1 (0 frentes de trabajo)
Concluido.
Tramo 2 (0 frentes de trabajo)
Concluido
Tramo 3 (0 frentes de trabajo)
Concluido

Guerrero

Puente Las Vigas km 81+200:
Concluido.
Puente Agua Hedionda Km 106+760:
Concluido.
Puente Copala Km 116+000:
Concluido.
Puente Marquelia I km 135+500:
Concluido.
Puente Nexpa km 85+300:
Concluido.
Puente Talapilla km 171+857:
Concluido
Puente Rio Quetzala Km 173+711:
Tendido de carpeta asfáltica, habilitado de acero para muro de contención y cimbrado para colado de muro de contención, así como Fabricación y colocación de parapeto metálico segunda etapa
Puente Santa Catarina km 183+740:
Habilitado y colado de lavaderos.

Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Salina Cruz - Zihuatanejo

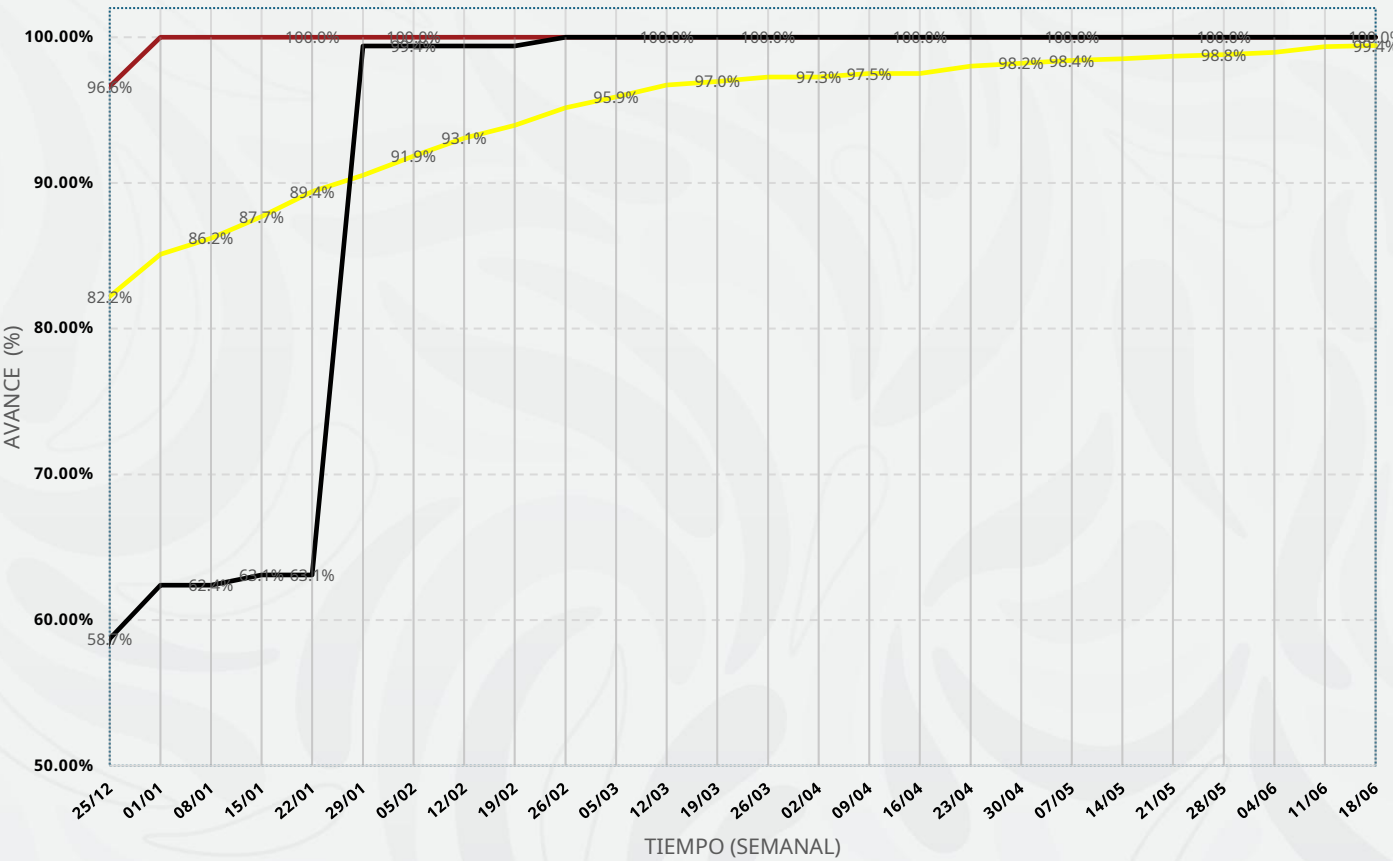

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	05 de mayo al 11 de junio 2026	12 de junio al 18 de junio 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	86	43
Maquinaria	31	5
Frentes	10	5

* 13.58 km se realizó un convenio en reducción de volúmenes del tramo I

Salina Cruz-Zihuatanejo

Inversiones y Metas 2025 - 2030

	2025		2026		PEF		VDG		2027		2028		2029		2030		Total	
	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta
Salina Cruz-Zihuatanejo	1,606.3	27	1,714.3	10.0	861.5	1	852.8	9.0	13,516	161	10,853.7	130	9,937.3	118	649.8	0	38,277.4	446
Guerrero	723.9	1	210.7	2	1.4	-	209	2	3,315.3	39	2,662.3	32	2,437.5	29	159.4	-	9,509	103
Oaxaca	882.4	26	1,503.6	8	860.1	1	644	7	10,200.7	122	8,191.4	98	7,499.8	89	490.4	-	28,768	343
