

Guaymas – Esperanza – Yécora - Chihuahua



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance 2025

Avance Programado: 100.0 %
Avance Real: 96.50 %
Avance Financiero: 50.80 %

Avance 2026*

Avance Programado: 2.5 %
Avance Real: 1.45 %
Avance Financiero: 0.0 %

*Datos solo del contrato formalizado



Inversión total: 10,228 mdp

- Sonora: 5,935 mdp
- Chihuahua: 4,293 mdp

Meta total: 450 km

- Sonora: 252 km y 18 puentes
- Chihuahua: 198 km



Inversión 2025: 450 mdp

- Sonora: 450 mdp
- Meta 2025:** 10 km y 4 puentes
- Sonora: 10 km y 4 puentes



Inversión 2026: 2,000 mdp (450.0 mdp recursos PEF)

- Sonora: 2,000 mdp
- Meta 2026:** 49.3 km y 14 puentes (9.3 km y 2 puentes con recursos PEF)
- Sonora: 49.3 km y 14 puentes



Inicio : 20 de octubre de 2025
Termino: diciembre de 2029

Término meta 2025: 30 de abril de 2026

Término meta 2026: 29 de noviembre de 2026 (solo del contrato formalizado)



669,912 habitantes beneficiados

Beneficios:

- Derrama económica regional.
- Fortalecimiento de exportaciones.
- Impulso al crecimiento turístico.
- Mejora en los puntos de salida para la producción agropecuaria, manufacturera e industrial.



30,684 empleos generados




Guaymas – Esperanza – Yécora - Chihuahua

Km 17+300 al Km 27+200

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	24-04-26 al 30-04-26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Trabajos preliminares (km)	9.97	9.97	-	-	-	-
Terracerías (km)	9.97	9.97	-	-	-	-
Obras de drenaje (Pza)	23	23	-	-	-	-
Pavimento (km)	9.97	8.17	1.80	0.0	0.0	-
Señalamiento (km)	9.97	8.0	1.97	0.0	0.0	-
Construcción Puente I (Canal alto)	100%	94.00%	6.00%	2.00%	2.00%	-
Construcción Puente II (Agua Caliente)	100%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-
Construcción Puente III (Chinitos I)	100%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-
Construcción Puente IV (Chinitos II)	100%	100.00%	0.00%	3.00%	0.00%	-

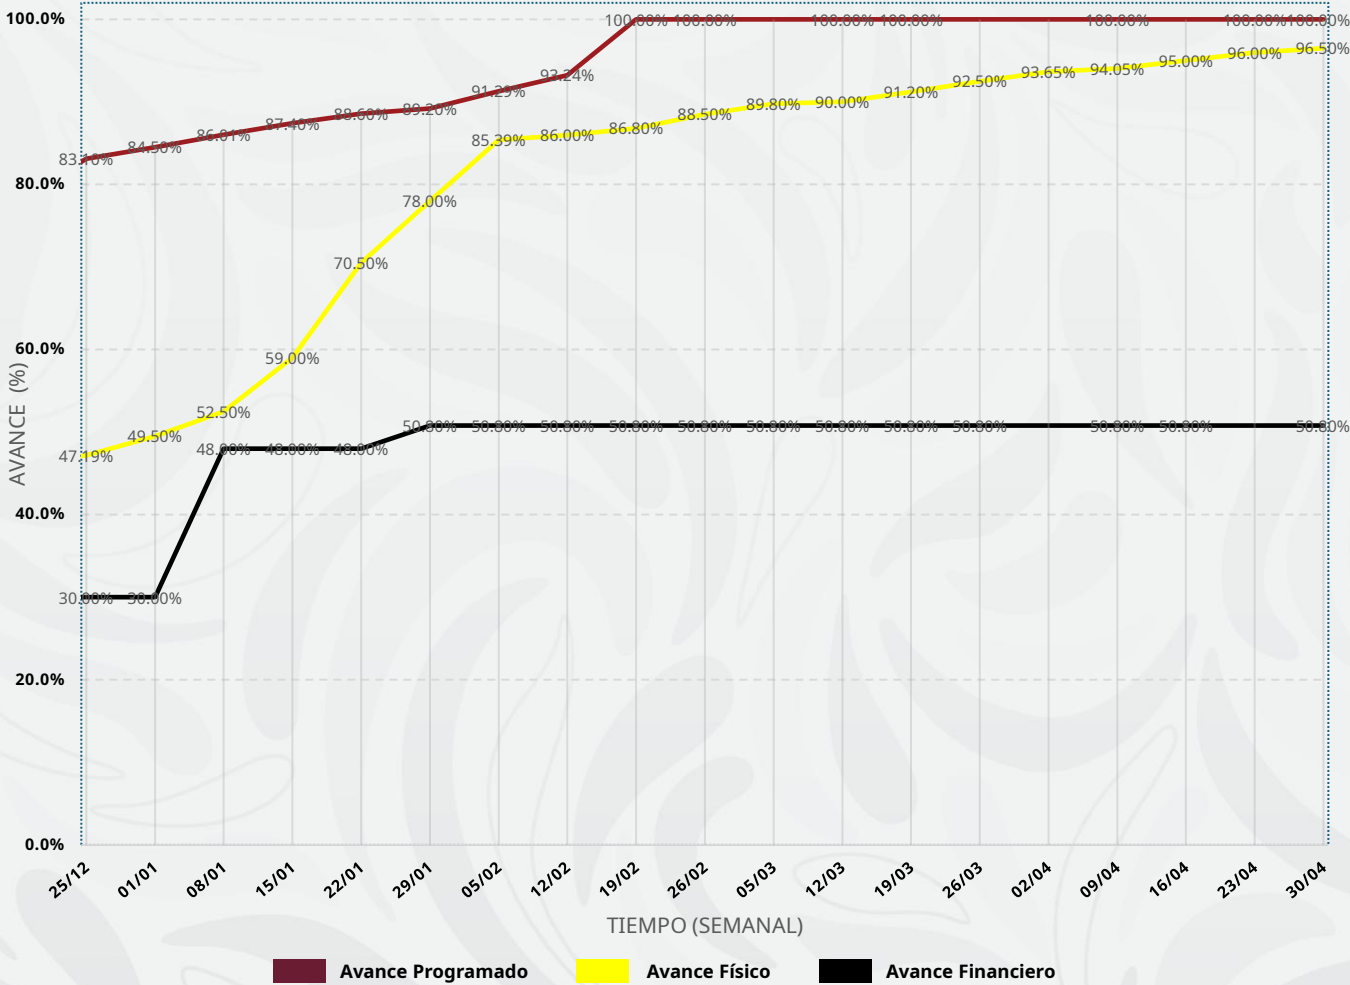

	17 de abril al 23 de abril 2026	24 de abril al 30 de abril 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	100	80
Maquinaria	20	20
Frentes de trabajo	7	6
