

Salina Cruz-Zihuatanejo (MEX-200)

Tramo Guerrero

Avance global	• Programado: 9.20%	• Semanal: 0.04%	Avance 2025	• Programado: 100.0%	• Semanal: 0.12%	Avance 2026	• Programado: 23.50%	• Semanal: 0.01%
	• Real: 7.78%	• Financiero: 6.68%		• Real: 98.53%	• Financiero: 100.0%		• Real: 11.80%	• Financiero: 1.29%



Descripción	
1	Puente Las Vigas Km 81+200 123 m
2	Puente Río Nexpa Km 85+300 425 m
3	Puente Agua Hedionda Km 106+760 21 m
4	Puente Copala Km 116+000 120 m
5	Puente Marquelia I Km 135+500 220 m
6	Puente Talapilla Km 171+857 41 m
7	Puente Río Quetzala Km 173+711 190 m
8	Puente Santa Catarina Km 184+744 101 m
9	Tramo 9 IG=km 209+500 AT – km 209+240 AD al km 219+540 10.30 km
10	Tramo 10 km 219+540 al km 229+600 10.06 km
11	Tramo 11 km 229+600 al km 234+843.77 5.24 km

Inversión total 2025-2030: 24,722 mdp

- Guerrero: 6,641 mdp
- Oaxaca: 18,081 mdp

Meta total 2025-2030: 423 km *

- Guerrero: 103 km
- Oaxaca: 319 km

Inversión 2026: 2,757 mdp

- Oaxaca: 2,757 mdp

Meta 2026: 37 km

Inversión 2025: 1,606 mdp

- Guerrero: 724 mdp
- Oaxaca: 882 mdp

Meta 2025: 27 km

- Guerrero: 1 km
- Oaxaca: 26 km

74,166 empleos generados

1,947,399 habitantes beneficiados

Beneficios: Reducción en tiempos de traslados de la Costa Chica de Gro. hacia Puerto Escondido Oax., reduciendo costos operativos e impulsando el turismo local y nacional de los municipios de Acapulco, San Marcos, Florencio Villareal, Cuajinicuilapa, Pinotepa Nacional, Villa de Tututepec, San Pedro Mixtepec, Pochutla y Huatulco.

Inicio : 1 de abril de 2025

Termino: 31 de diciembre 2029

Término meta 2025: 30 de mayo de 2026

Oaxaca/Guerrero

Salina Cruz-Zihuatanejo (MEX-200)

Elemento	Meta	Ejecutado Acumulable	Faltante	08-05-26 al 14-05-26	
				Programado	Ejecutado
Troncal	*13.58 km	*13.38 km	*0.20 km	0.0%	0.09%
8 puentes	8 pts	96.20% de 8 pts	3.80% de 8 pts	0.0%	0.23%

OBSERVACIONES

Oaxaca

Tramo 1 (0 frentes de trabajo)
Concluido.

Tramo 2 (0 frentes de trabajo)
Producción de mezcla asfáltica para carpeta, en banco de materiales ubicado en el km. 224+250 desv. izquierda 50 m., y Tendido y compactación de carpeta asfáltica del km. 224+600 al km. 225+100.

Tramo 3 (0 frentes de trabajo)
Concluido

Guerrero

Puente Las Vigas km 81+200:
Concluido.

Puente Agua Hedionda Km 106+760:
Concluido.

Puente Copala Km 116+000:
Concluido.

Puente Marquelia I km 135+500:
Concluido.


Puente Nexpa km 85+300:
Trabajos de pintura.

Puente Talapilla km 171+857:
Concluido

Puente Rio Quetzala Km 173+711: Trabajos de plataforma para conos de derrame, Armado y cimbrado de losas y Habilitado y armado de guarnición.

Puente Santa Catarina km 183+740:
Base Hidráulica y Conos de Derrame.

Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Salina Cruz - Zihuatanejo

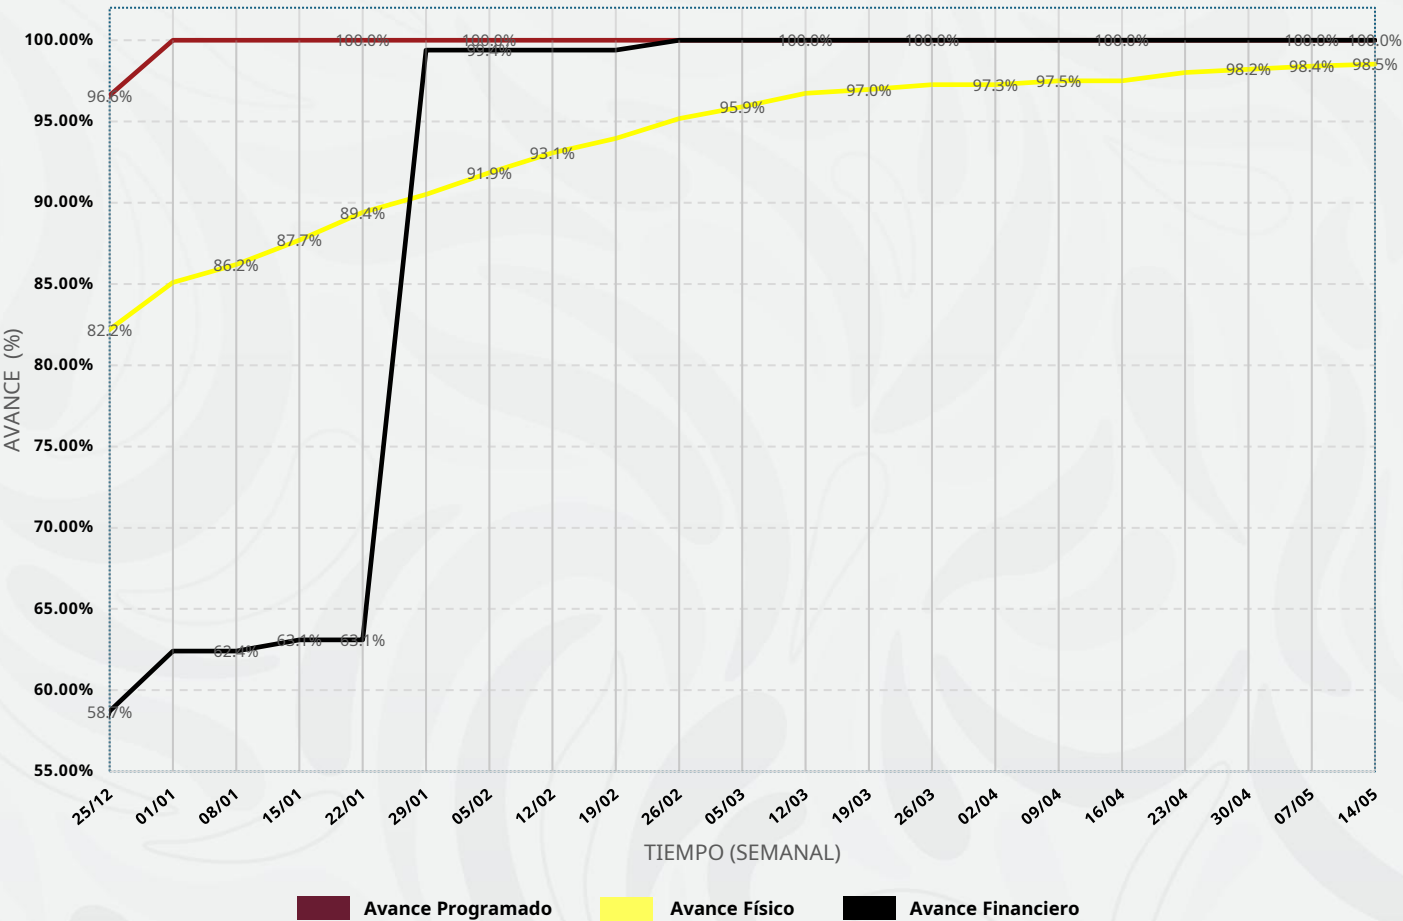

	01 de mayo al 07 de mayo 2026	08 de mayo al 14 de mayo 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	95	96
Maquinaria	54	43
Frentes	12	11

* 13.58 km se realizó un convenio en reducción de volúmenes del tramo I
