

San Luis Potosí - Hidalgo

Tamazunchale – Huejutla – Pachuca

Avance global

- Programado: 28.12%
- Real: 27.26%
- Semanal: 0.42%
- Financiero: 25.56%

Avance 2025

- Programado: 100%
- Real: 100%
- Semanal: 0.0%
- Financiero: 100%

Avance 2026

- Programado: 10.16%
- Real: 9.55%
- Semanal: 0.86%
- Financiero: 3.37%



Inversión total 2025-2028: 6,674 mdp

- Hidalgo: 3,779 mdp
- SLP: 2,895 mdp

Meta total 2025-2028: 158 km

Hidalgo:

- 130 km

San Luis Potosí:

- 28 km



Inversión 2025: 1,650 mdp

- Hidalgo: 821.66 mdp
- San Luis Potosí: 827.86 mdp

Meta 2025: 30 km

- Hidalgo: 20 km
- San Luis Potosí: 10 km



Inversión 2026: 2,490 mdp

- Hidalgo: 1,861 mdp
- San Luis Potosí: 629 mdp

Meta 2026: Hidalgo 55 km (4 puentes) y San Luis Potosí 7 km A2 y (3 puentes)



Inicio : 28 de abril 2025

Término: diciembre 2028

Término meta 2025: 28 de febrero de 2026




20,022 empleos generados



TDPA: 17,318 Veh/hr

+395 mil habitantes beneficiados en los municipios de Huejutla de Reyes, Jaltocán, Lolotla, Metztitlán, Molango de Escamilla, San Felipe Orizatlán, Tlanchinol, Xochicoatlán y Zacualtipán de Ángeles en Hidalgo y Tamazunchale, en San Luis Potosí.

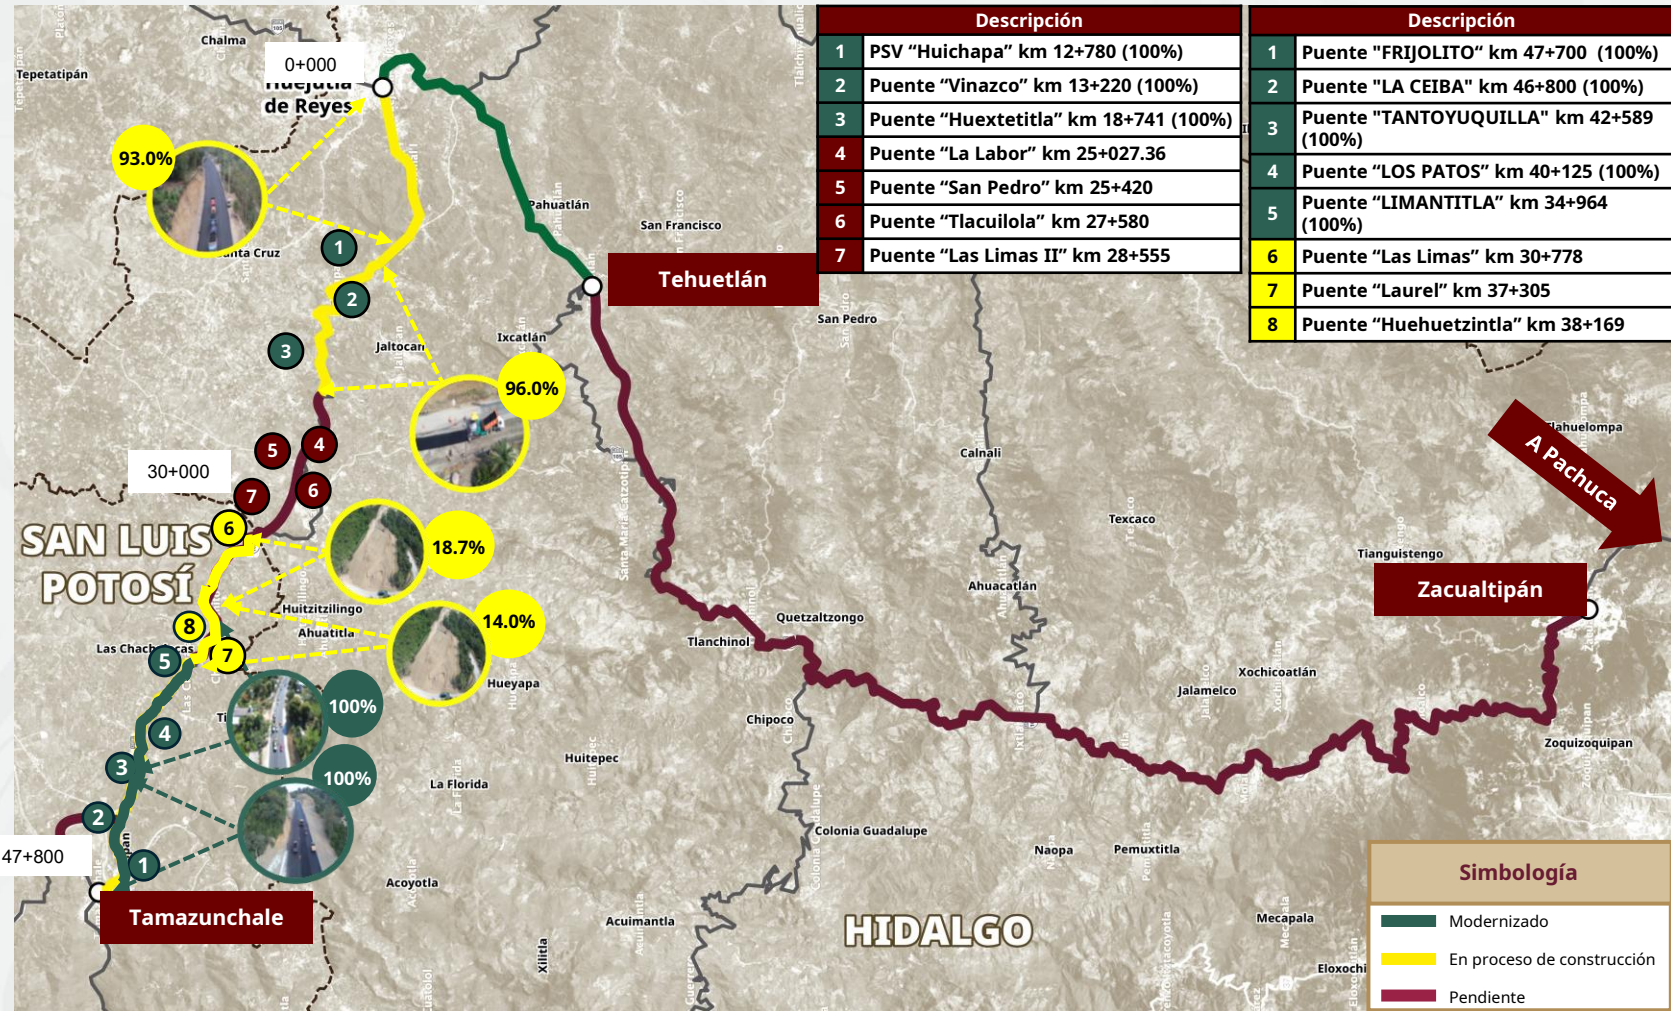

65 min de ahorro en tiempo

Beneficios: Conecta de manera eficiente y segura el centro del país con la Sierra Hidalguense y la Huasteca Potosina.

San Luis Potosí - Hidalgo
Tamazunchale – Huejutla


Km 30+500 al Km 34+140

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 08/05/2026 al 14/05/2026		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
TERRACERÍAS								
Despalme	m³	24,896.0	15,393.0	61.83%	9,503.0	2,271.5	0.0	En proceso
Cortes	m³	376,161.0	78,512.0	20.87%	297,649.0	28,868.0	5,838.0	En proceso
Terraplenes 90%	m³	85,691.0	1,000.0	1.17%	84,691.0	5,712.7	0.0	En proceso
Pedraplen	m³	27,537.0	15,982.0	58.04%	11,555.0	2,503.4	0.0	En proceso
Subyacente	m³	39,813.0	8,547.0	21.47%	31,266.0	2,488.3	1,750.0	En proceso
Subrasante	m³	18,354.0	4,050.0	22.07%	14,304.0	1,079.0	1,750.0	En proceso
OBRAS DE DRENAJE								
Obras de drenaje	pza.	7	1	14.29%	6.0	0.5	0.5	En proceso
PAVIMENTOS								
Base hidráulica	m³	8,798.0	360.0	4.09%	8,438.0	0.0	360.0	Por iniciar
Base asfáltica	m³	5,083.0	0.0	0.00%	5,083.0	0.0	0.0	Por iniciar
Carpeta asfáltica	m³	3,307.0	0.0	0.00%	3,307.0	0.0	0.0	Por iniciar
Puentes	pza.	1.0	0.0	0.00%	1.0	0.0	0.0	Por iniciar
SEÑALAMIENTO								
Obra complementaria	km	3.6	0.0	0.00%	3.60	0.0	0.0	Por iniciar
Señalamiento definitivo	km	3.6	0.0	0.00%	3.60	0.0	0.0	Por iniciar

km 35+160 al km 38+820

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 08/05/2026 al 14/05/2026		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
TERRACERÍAS								
Despalme	m³	34,330.0	5,472.0	15.94%	28,858.0	2,288.7	0.0	En proceso
Cortes	m³	203,755.0	52,242.0	25.64%	151,513.0	11,845.8	9,172.0	En proceso
Terraplenes 90%	m³	78,664.0	0.0	0.00%	78,664.0	4,878.5	0.0	Por iniciar
Pedraplen	m³	33,734.0	12,912.6	38.28%	20,821.4	2,558.8	1,250.6	En proceso
Subyacente	m³	23,233.0	6,283.0	27.04%	16,950.0	2,323.0	581.0	En proceso
Subrasante	m³	16,228.0	832.0	5.13%	15,396.0	901.6	600.0	En proceso
OBRAS DE DRENAJE								
Obras de drenaje Tubería	pza.	12	1	8.33%	11	0.1	0.2	En proceso
PAVIMENTOS								
Base hidráulica	m³	7,895.0	0.0	0.00%	7,895.0	0.0	0.0	Por iniciar
Base asfáltica	m³	4,561.0	0.0	0.00%	4,561.0	0.0	0.0	Por iniciar
Carpeta asfáltica	m³	3,327.0	0.0	0.00%	3,327.0	0.0	0.0	Por iniciar
Puentes	pza.	2.0	0.0	0.00%	2.0	0.0	0.0	Por iniciar
SEÑALAMIENTO								
Obra complementaria	km	3.6	0.0	0.00%	3.60	0.0	0.0	Por iniciar
Señalamiento definitivo	km	3.6	0.0	0.00%	3.60	0.0	0.0	Por iniciar

Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Tamazunchale - Huejutla

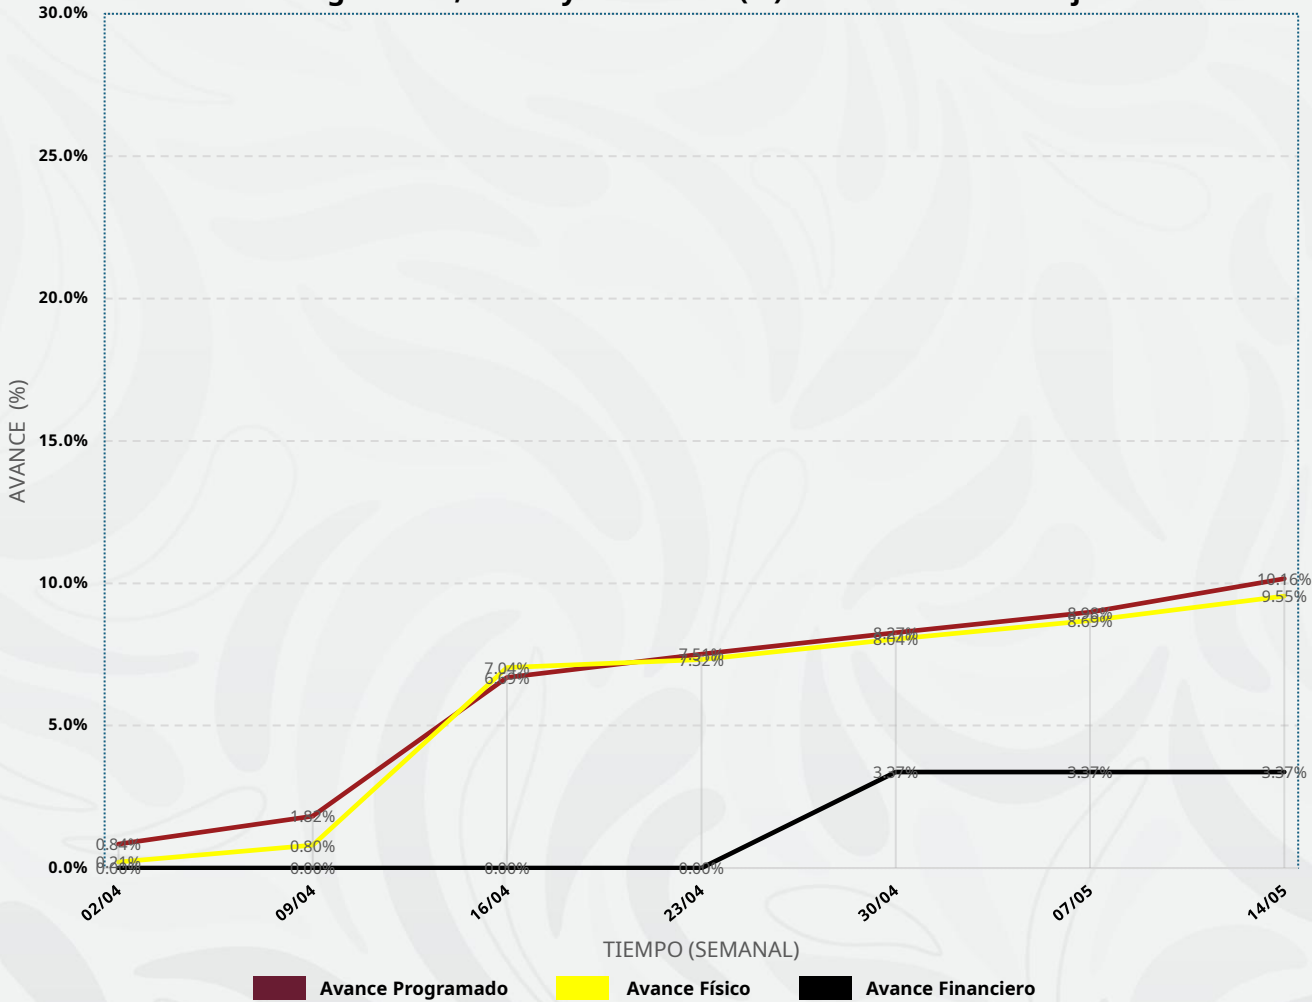

	01 de mayo al 07 de mayo	08 de mayo al 14 de mayo
Fuerza de Trabajo (personas)	263	264
Maquinaria	141	150
Frentes	15	24

km 0+000 al km 10+000
