

Guerrero - Puebla

Eje Cuautla – Tlapa

Ramal Igualapa – Chilixtlahuaca - Alacatlitzala

Avance global	• Programado: 13.96%	• Semanal: 0.45%	Avance 2025	• Programado: 100.0%	• Semanal: 0.00%	Avance 2026	• Programado: 17.89%	• Semanal: 1.57%
	• Real: 11.93%	• Financiero: 6.91%		• Real: 100.0%	• Financiero: 100.0%		• Real: 12.80%	• Financiero: 10.43%

-  **Inversión total 2025-2029:** 13,652 mdp
- Morelos: 688 mdp
 - Puebla: 7,525 mdp
 - Guerrero: 5,440 mdp
- Meta total 2025-2029:** 393 km
- Morelos: 26 km
 - Puebla: 159 km
 - Guerrero: 208 km


-  **Inversión 2025:** 641.2 mdp
- Guerrero: 515.5 mdp
 - Puebla: 125.7 mdp
- Meta 2025:** 33 km
- Guerrero: 30 km
 - Puebla: 3 km

-  **Inversión 2026:** 3,433.9 mdp
- Guerrero: 1,035.9 mdp (PEF) (867.10 mdp modernización y 168.84 mdp conservación)
 - Puebla: 2,398 mdp
- Meta 2026:** 134.8 km
- Guerrero: 85.84 km (28.84 km construcción y 57.0 km conservación en tramos aislados)
 - Puebla: 49 km

-  **Inicio meta 2026:** 17 de febrero 2026
- Inicio:** 16 de mayo 2025
- Término:** diciembre 2029
- Termino meta 2025:** marzo de 2026

 **40,956** empleos generados

 **7,750** habitantes beneficiados

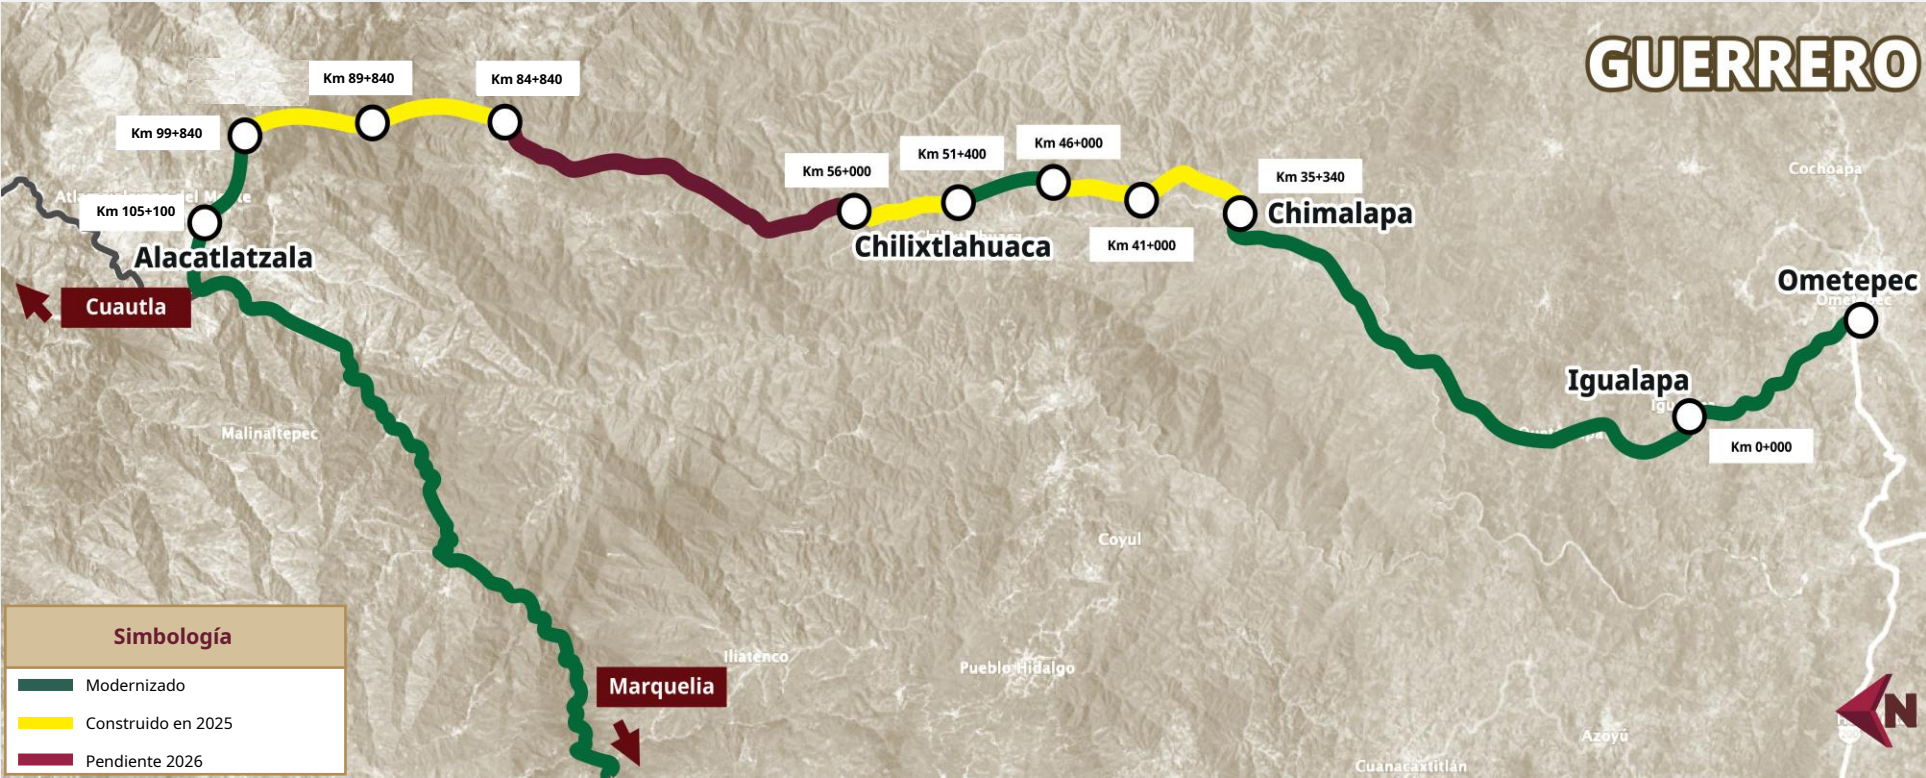

 **1 hora** de ahorro en tiempo

 Se beneficiará a una población de 7,750 habitantes de los municipios de Igualapa, Cochoapa el Grande, Metlatonoc y Malinaltepec, reduciendo tiempos de traslado.

Guerrero 2026

Eje Cuautla – Tlapa

Ramal Igualapa – Chilixtlahuaca - Alacatlatzala




Gobierno de
México

ACTUALIZADA 26/05/2026

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance: Programado, Físico y Financiero

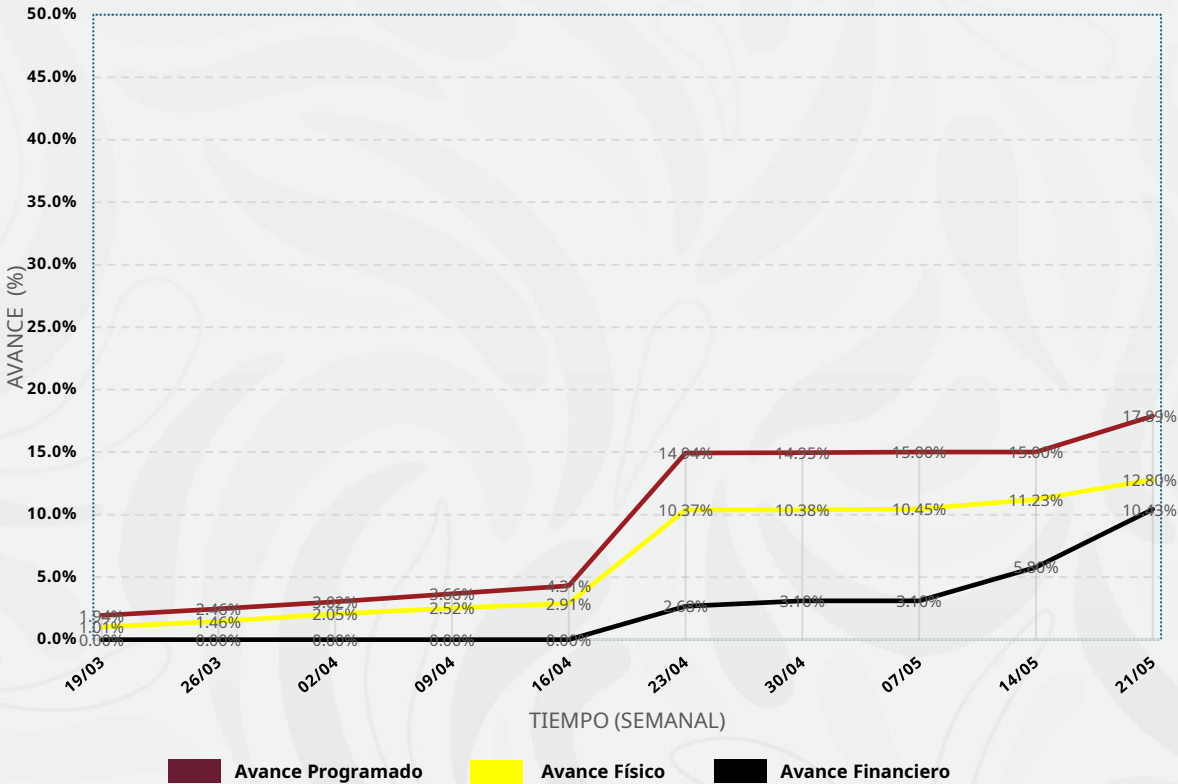

	08 de mayo al 14 de mayo 2026	15 de mayo al 21 de mayo 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	100	100
Maquinaria	36	43
Frentes de trabajo	10	10
