

Salina Cruz-Zihuatanejo (MEX-200)

Tramo Guerrero

Avance global	• Programado: 9.21%	• Semanal: 0.01%	Avance 2025	• Programado: 100.0%	• Semanal: 0.17%	Avance 2026	• Programado: 33.10%	• Semanal: 3.46%
	• Real: 7.79%	• Financiero: 6.80%		• Real: 98.70%	• Financiero: 100.0%		• Real: 15.26%	• Financiero: 2.38%



Descripción	
1	Puente Las Vigas Km 81+200 123 m
2	Puente Río Nexpa Km 85+300 425 m
3	Puente Agua Hedionda Km 106+760 21 m
4	Puente Copala Km 116+000 120 m
5	Puente Marquelia I Km 135+500 220 m
6	Puente Talapilla Km 171+857 41 m
7	Puente Río Quetzala Km 173+711 190 m
8	Puente Santa Catarina Km 184+744 101 m
9	Tramo 9 IG=km 209+500 AT – km 209+240 AD al km 219+540 10.30 km
10	Tramo 10 km 219+540 al km 229+600 10.06 km
11	Tramo 11 km 229+600 al km 234+843.77 5.24 km

**Inversión total 2025-2030:** 24,722 mdp

- Guerrero: 6,641 mdp
- Oaxaca: 18,081 mdp

Meta total 2025-2030: 423 km *

- Guerrero: 103 km
- Oaxaca: 319 km

**Inversión 2026:** 2,757 mdp

- Oaxaca: 2,757 mdp

Meta 2026: 37 km

**Inicio :** 1 de abril de 2025
Termino: 31 de diciembre 2029
Término meta 2025: 30 de mayo de 2026

**74,166** empleos generados

**1,947,399** habitantes beneficiados


Beneficios: Reducción en tiempos de traslados de la Costa Chica de Gro. hacia Puerto Escondido Oax., reduciendo costos operativos e impulsando el turismo local y nacional de los municipios de Acapulco, San Marcos, Florencio Villareal, Cuajinicuilapa, Pinotepa Nacional, Villa de Tututepec, San Pedro Mixtepec, Pochutla y Huatulco.

Oaxaca/Guerrero

Salina Cruz-Zihuatanejo (MEX-200)

Elemento	Meta	Ejecutado Acumulable	Faltante	08-05-26 al 14-05-26	
				Programado	Ejecutado
Troncal	*13.58 km	*13.40 km	*0.18 km	0.0%	1.6%
8 puentes	8 pts	96.42% de 8 pts	3.58% de 8 pts	0.0%	0.1%
OBSERVACIONES					
Oaxaca					
Tramo 1 (0 frentes de trabajo) Concluido.					
Tramo 2 (0 frentes de trabajo) Tendido de carpeta asfáltica, colocación de señalamiento horizontal (pintura) y construcción de cunetas.					
Tramo 3 (0 frentes de trabajo) Concluido					
Guerrero					
Puente Las Vigas km 81+200: Concluido.					
Puente Agua Hedionda Km 106+760: Concluido.					
Puente Copala Km 116+000: Concluido.					
Puente Marquelia I km 135+500: Concluido.					
Puente Nexpa km 85+300: Reubicación y colocación de defensa metálica.					
Puente Talapilla km 171+857: Concluido					
Puente Rio Quetzala Km 173+711: Trabajos en terracería para accesos, descimbrado de losas de acceso, colado de guarnición y banquetas en segunda etapa así como excavación y corte para muro de contención.					
Puente Santa Catarina km 183+740: Suministro y tendido de riego de liga así como base asfáltica.					

Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Salina Cruz - Zihuatanejo

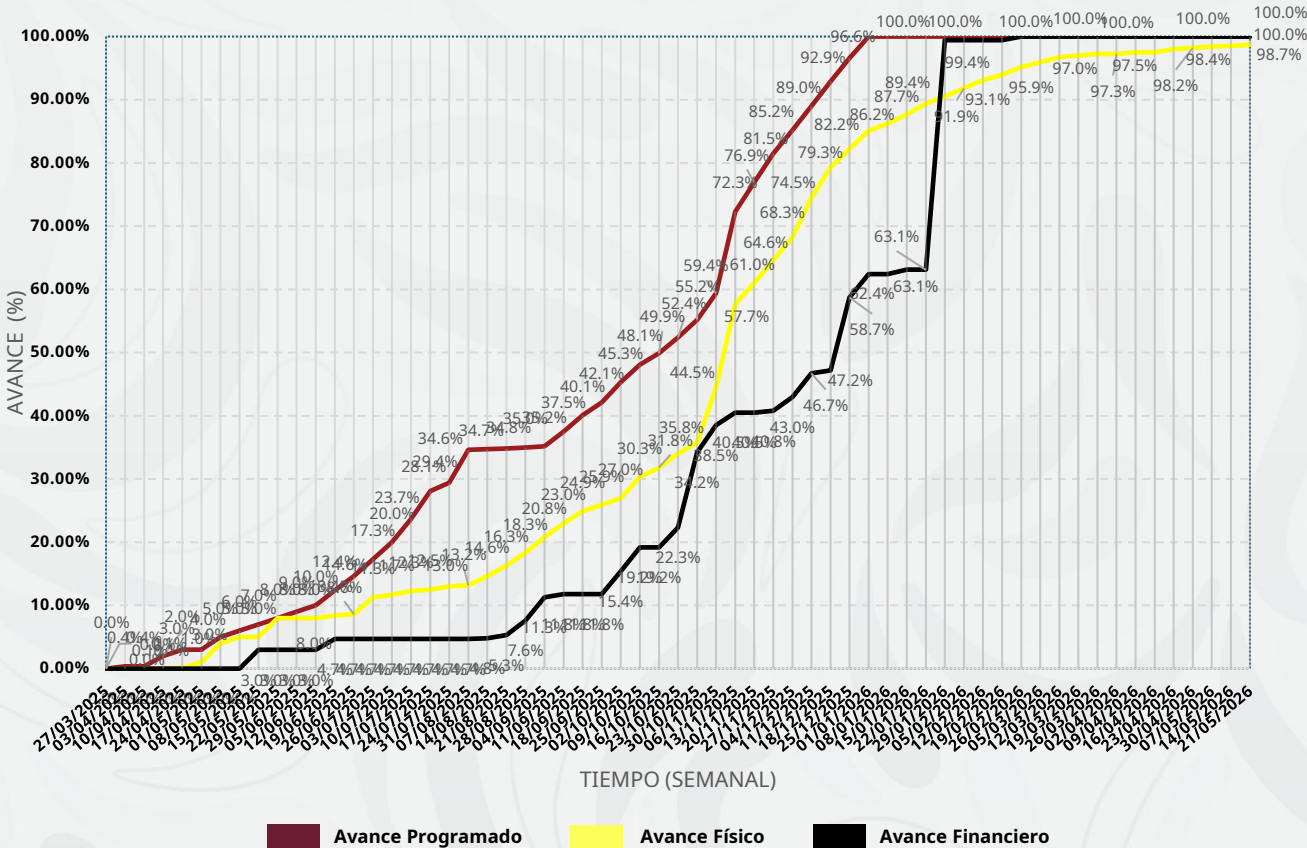

	08 de mayo al 14 de mayo 2026	15 de mayo al 21 de mayo 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	95	111
Maquinaria	43	35
Frentes	11	13

* 13.58 km se realizó un convenio en reducción de volúmenes del tramo I
