

San Luis Potosí - Hidalgo

Tamazunchale – Huejutla – Pachuca

Avance global

- Programado: 28.56%
- Real: 27.48%
- Semanal: 0.22%
- Financiero: 27.08%

Avance 2025

- Programado: 100%
- Real: 100%
- Semanal: 0.0%
- Financiero: 100%

Avance 2026

- Programado: 11.27%
- Real: 9.99%
- Semanal: 0.44%
- Financiero: 9.39%

Inversión total 2025-2028: 6,674 mdp

- Hidalgo: 3,779 mdp
- SLP: 2,895 mdp

Meta total 2025-2028: 158 km

Hidalgo:

- 130 km

San Luis Potosí:

- 28 km

Inversión 2025: 1,650 mdp

- Hidalgo: 821.66 mdp
- San Luis Potosí: 827.86 mdp

Meta 2025: 30 km

- Hidalgo: 20 km
- San Luis Potosí: 10 km

Inversión 2026: 2,490 mdp

- Hidalgo: 1,861 mdp
- San Luis Potosí: 629 mdp

Meta 2026: Hidalgo 55 km (4 puentes) y San Luis Potosí 7 km A2 y (3 puentes)

Inicio : 28 de abril 2025

Término: diciembre 2028

Término meta 2025: 28 de febrero de 2026


20,022 empleos generados

TDPA: 17,318 Veh/hr

+395 mil habitantes beneficiados en los municipios de Huejutla de Reyes, Jaltocán, Lolotla, Metztitlán, Molango de Escamilla, San Felipe Orizatlán, Tlanchinol, Xochicoatlán y Zacualtipán de Ángeles en Hidalgo y Tamazunchale, en San Luis Potosí.

65 min de ahorro en tiempo

Beneficios: Conecta de manera eficiente y segura el centro del país con la Sierra Hidalguense y la Huasteca Potosina.

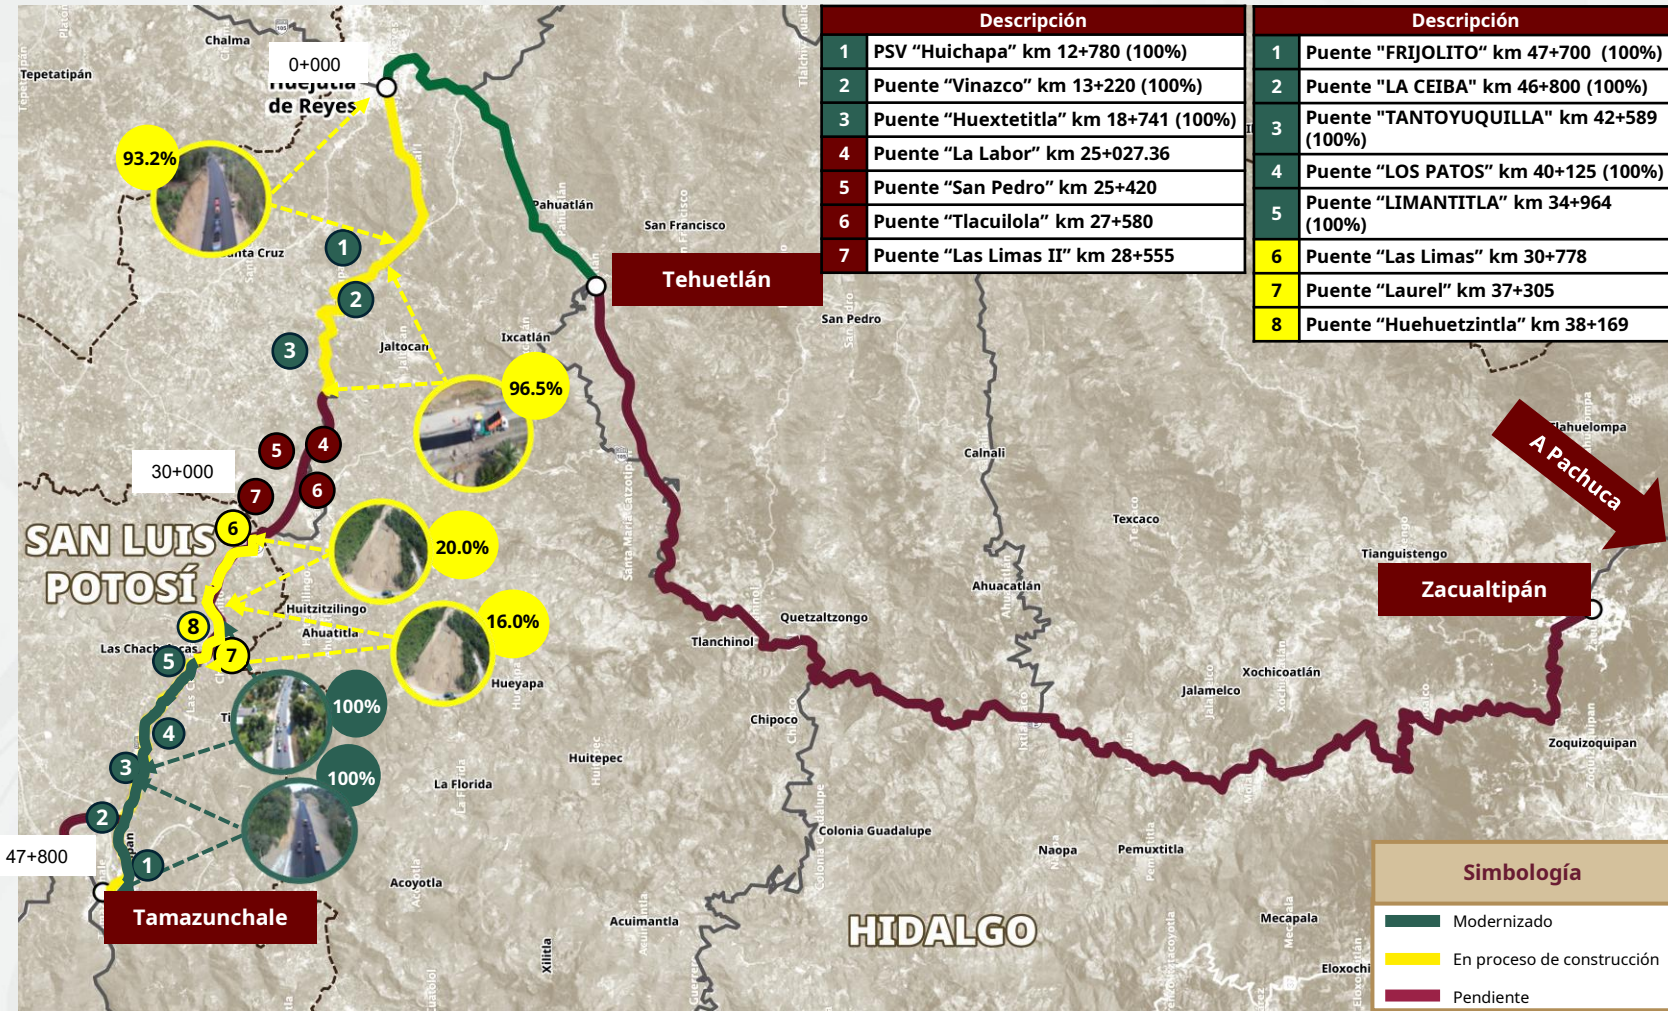


San Luis Potosí - Hidalgo

Tamazunchale – Huejutla

Km 30+500 al Km 34+140								
Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 15/05/2026 al 21/05/2026		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
TERRACERÍAS								
palme	m³	24,896.0	15,864.0	63.72%	9,032.0	2,271.5	471.0	En proceso
tes	m³	376,161.0	87,350.0	23.22%	288,811.0	28,868.0	8,838.0	En proceso
aplenes 90%	m³	85,691.0	1,000.0	1.17%	84,691.0	5,712.7	0.0	En proceso
lraplen	m³	27,537.0	15,982.0	58.04%	11,555.0	2,503.4	0.0	En proceso
yacente	m³	39,813.0	9,147.0	22.97%	30,666.0	2,488.3	600.0	En proceso
rasante	m³	18,354.0	4,550.0	24.79%	13,804.0	1,079.0	500.0	En proceso
RAS DE DRENAJE								
as de drenaje	pza.	7	3	42.86%	4.0	0.5	2.0	En proceso
/IMIENTOS								
e hidráulica	m³	8,798.0	600.0	6.82%	8,198.0	0.0	240.0	Por iniciar
e asfáltica	m³	5,083.0	0.0	0.00%	5,083.0	0.0	0.0	Por iniciar
peta asfáltica	m³	3,307.0	0.0	0.00%	3,307.0	0.0	0.0	Por iniciar
ntes	pza.	1.0	0.0	0.00%	1.0	0.0	0.0	Por iniciar
ALAMIENTO								
a complementaria	km	3.6	0.0	0.00%	3.60	0.0	0.0	Por iniciar
alamiento definitivo	km	3.6	0.0	0.00%	3.60	0.0	0.0	Por iniciar

km 35+160 al km 38+820								
Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 15/05/2026 al 21/05/2026		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
TERRACERÍAS								
Despalme	m³	34,330.0	6,032.0	17.57%	28,298.0	2,288.7	560.0	En proceso
Cortes	m³	203,755.0	57,078.3	28.01%	146,676.7	11,845.8	4,836.3	En proceso
Terraplenes 90%	m³	78,664.0	0.0	0.00%	78,664.0	4,878.5	0.0	Por iniciar
Pedraplen	m³	33,734.0	15,388.1	45.62%	18,345.9	2,558.8	2,475.5	En proceso
Subyacente	m³	23,233.0	6,283.0	27.04%	16,950.0	2,323.0	0.0	En proceso
Subrasante	m³	16,228.0	1,664.0	10.25%	14,564.0	901.6	832.0	En proceso
OBRAS DE DRENAJE								
Obras de drenaje Tubería	pza.	12	2	16.67%	10	0.1	1.0	En proceso
PAVIMENTOS								
Base hidráulica	m³	7,895.0	356.3	4.51%	7,538.7	0.0	356.3	Por iniciar
Base asfáltica	m³	4,561.0	0.0	0.00%	4,561.0	0.0	0.0	Por iniciar
Carpeta asfáltica	m³	3,327.0	0.0	0.00%	3,327.0	0.0	0.0	Por iniciar
Puentes	pza.	2.0	0.0	0.00%	2.0	0.0	0.0	Por iniciar
SEÑALAMIENTO								
Obra complementaria	km	3.6	0.0	0.00%	3.60	0.0	0.0	Por iniciar
Señalamiento definitivo	km	3.6	0.0	0.00%	3.60	0.0	0.0	Por iniciar

Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Tamazunchale - Huejutla

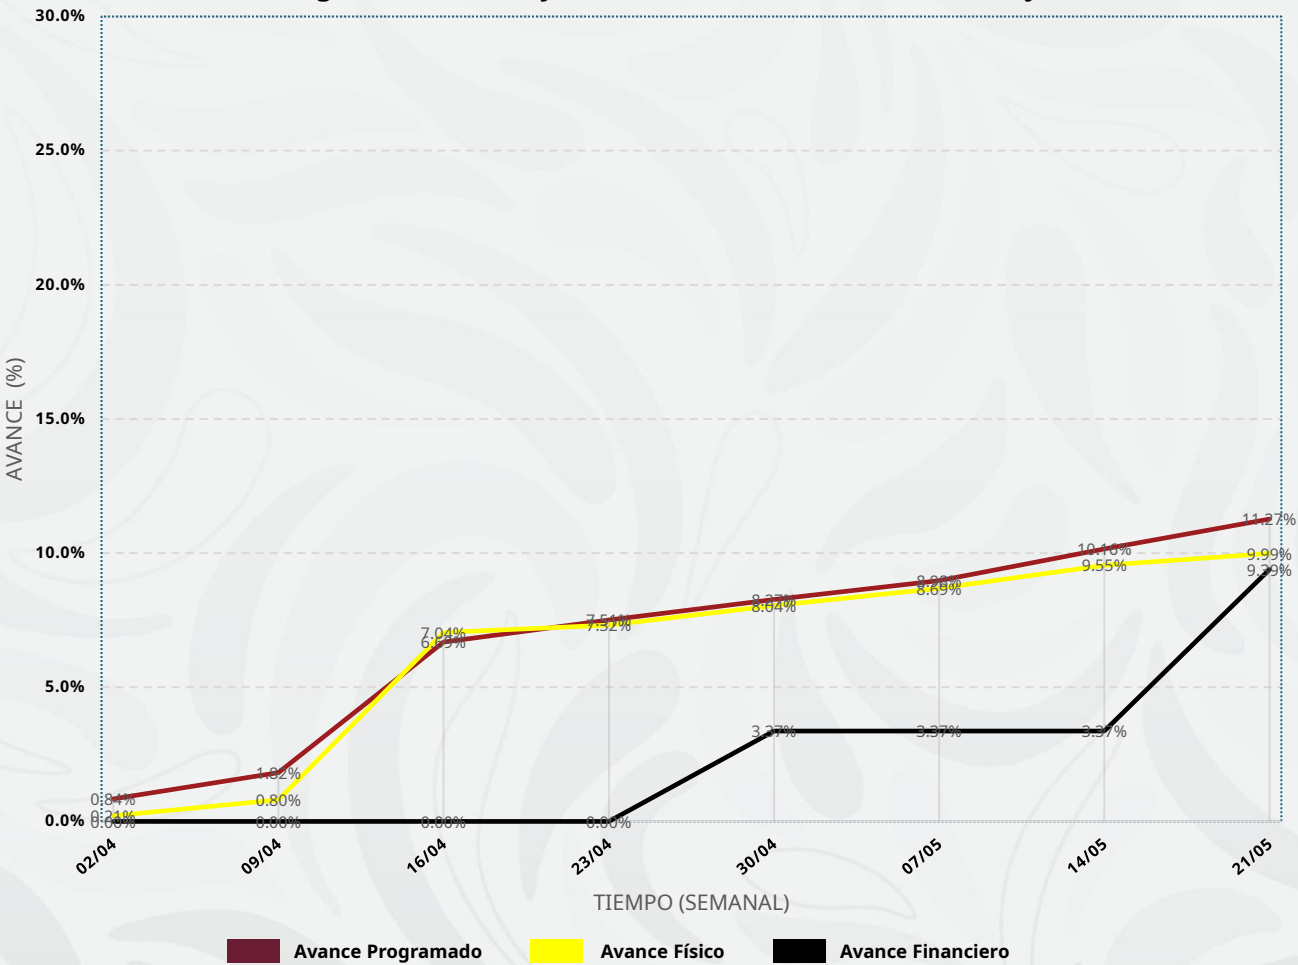

	08 de mayo al 14 de mayo	15 de mayo al 21 de mayo
Fuerza de Trabajo (personas)	264	244
Maquinaria	150	150
Frentes	24	21

San Luis Potosí - Hidalgo

Tamazunchale – Huejutla – Pachuca

Hidalgo

km 0+000 al km 10+000

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	15/05/26 al 21/05/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Desmonte (Ha)	20.0	20.0	-	-	-	Concluido
Despalme (m3)	21,500.0	21,500.0	-	-	-	Concluido
Cortes (m3)	183,255.0	183,255.0	-	-	-	Concluido
Terraplén (m3)	42,250.0	42,250.0	-	-	-	Concluido
Subyacente (m3)	93,012.0	93,012.0	-	-	-	Concluido
Subrasante (m3)	36,638.0	36,638.0	-	-	-	Concluido
Excavación estructuras y O.D. (m3)	14,264.6	14,264.6	-	-	-	Concluido
Demolición de concreto hidráulico (m3)	3,727.5	3,727.5	-	-	-	Concluido
Base hidráulica (m3)	30,000.0	29,880.0	120.0	0.0	0.0	
Base asfáltica (m3)	16,760.0	16,690.0	70.0	0.0	125.0	
Carpeta asfáltica (m3)	10,692.0	5,395.6	5,296.4	0.0	280.0	
Puentes peatonales (pza)	2.0	0.7	1.3	0.0	0.00	Reducción meta por conflicto social
Señalamiento (m)	43,334.0	0.0	43,334.0	0.0	0.0	

km 10+000 al km 20+000

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	15/05/26 al 21/05/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Desmonte (Ha)	36.0	36.0	0.0	-	-	Concluido
Despalme (m3)	31,500.0	31,500.0	0.0	-	-	Concluido
Cortes (m3)	347,581.0	346,050.0	1,531.0	0.0	500.0	
Terraplén (m3)	251,735.0	251,735.0	0.0	-	-	Concluido
Subyacente (m3)	77,344.0	77,344.0	0.0	-	-	Concluido
Subrasante (m3)	32,248.0	32,248.0	0.0	-	-	Concluido
Excavación estructuras y O.D. (m3)	133,739.6	133,739.6	0.0	-	-	Concluido
Base hidráulica (m3)	30,000.0	29,390.0	610.0	0.0	200.0	
Base asfáltica (m3)	16,760.0	15,850.0	910.0	0.0	300.0	
Carpeta asfáltica (m3)	10,692.0	80.0	10,612.0	0.0	80.0	
Señalamiento (m)	43,334.0	0.0	43,334.0	0.0	0.0	



Avances físicos (San Luis Potosí)



Avances físicos (Hidalgo)
