

# Sonora/Chihuahua


## Camino Límite Estados Chihuahua/Sonora-Pancho Villa-E.C. (Janos-Monte Verde)



Gobierno de  
**México**

**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

**Avance físico** • Programado: 93.0%  
• Real: 92.0%  
• Semanal: 7.0%  
• Financiero: 65.2%

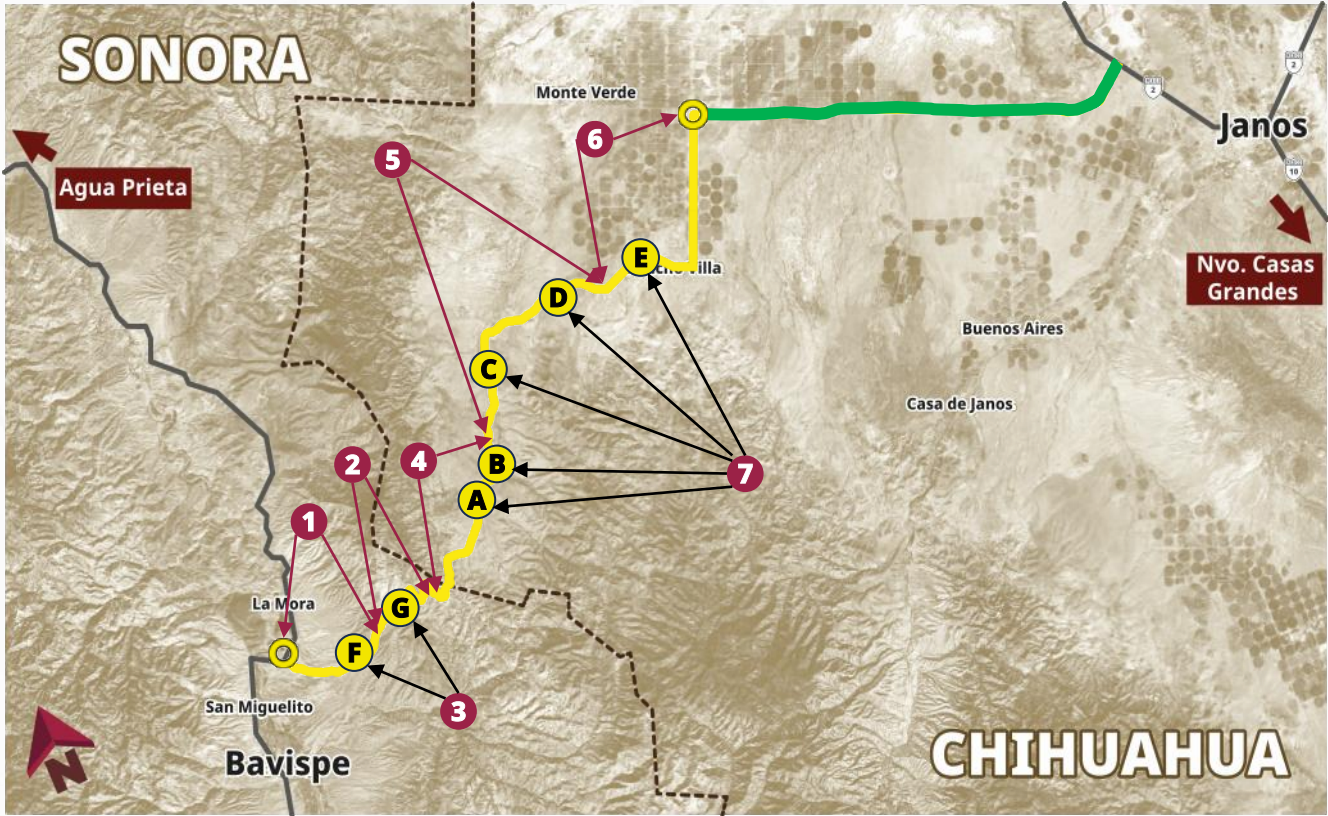

- Inversión total: 1,859 mdp**  
Sonora: 774.5 mdp  
Chihuahua: 1,084.5 mdp
- Inicio:** marzo, 2025  
**Término:** 30 Enero de 2026
- Meta total:** 67 km y 7 puentes  
• 6.6 km modernizados C, Chihuahua (se requiere trabajos complementarios)
- Meta pendiente:** 60.2 km y 7 puentes  
**Sonora**
  - 18.1 km, ampliación C
  - 2 puentes (184 m)**Chihuahua**
  - 42.1 km, ampliación C
  - 5 puentes (320 m)
- 5,577** empleos generados
- 4,713** habitantes beneficiados
- 90 minutos** de ahorro en tiempo


<b>1.- Constructora URBATRAC, S.A. de C.V.</b>
<b>Meta:</b> Km 0+000-km 11+000, incluye entronque km 0+000 <b>Inversión:</b> 324.6 MDP C/IVA
<b>2.- ESMA Instalaciones, S.A. de C.V.</b>
<b>Meta:</b> Km 11+000-km 18+093 <b>Inversión:</b> 306.2 MDP C/IVA
<b>3.- INNOVACIONES INTELIGENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN,S.A DE C.V Y CMCO,S.A DE C.V</b>
F. Km 6+900 Puente I, 122.0 m G. Km 14+700 Puente II, 61.5 m
<b>4.- CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PROYECTOS INTERESTATALES,S.A DE C.V</b>
Por modernizar a nivel de pavimento a 7.0 m <b>Meta:</b> Km 18+093 – km 29+093
<b>5.- La CIMA Terraceros, S.A. de C.V. y Estructuras y Excavaciones JM, S.A. de C.V.</b>
<b>Meta:</b> Km 29+093-KM 47+233 <b>Inversión:</b> 193.9 MDP C/IVA
<b>6.- MERP Edificaciones y Terracerías, S.A. de C.V.</b>
<b>Meta:</b> Km 47+233-Km 59+823 y Km 66+422-Km 66+829, incluye Boulevard y entronque a nivel. <b>Inversión:</b> 179.4 MDP C/IVA
<b>7.- Asfaltos y Triturados EL PUJAL, S.A. de C.V.</b>
<b>En proceso de construcción de 5 puentes:</b> A. Km 22+758 El Papalote, 30.0 m B. Km 25+758 Los Pilares, 40.0 m C. Km 33+832 Las Profesoras, 40.0 m D. Km 36+682 La Enramada, 30.0 m E. Km 38+362 La Pila, 120.0 m <b>Inversión:</b> 122.5 MDP C/IVA

<b>S1.- CLAMI INGENIEROS, S.C</b>	<b>S2.- NEDOX, S.A DE C.V</b>	<b>S3.- JIDASA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V</b>	<b>S4.- GSM SUPERVISIÓN, PROYECTO E IMPACTO AMBIENTAL, S.A DE C.V</b>	<b>S5.- GRUPO SELOME, S.A. DE C.V</b>	<b>S6.- PROVEEDORA DE INGENIERIA, INSTALACION E INFRAESTRUCTURA, S.A DE C.V</b>	<b>S7.- GRUPO CORPOIIA, S.A. DE C.V.</b>
<b>Tramo:</b> del km 0+000 al km 11+000, puente Sonora I en el km 6+900 <b>Inversión:</b> 6.1 MDP C/IVA	<b>Tramo:</b> del km 11+000 al km 18+093, puente Sonora II en el km 14+700 <b>Inversión:</b> 6.8 MDP C/IVA	<b>Tramo:</b> tramo del km 18+093 al km 29+093, 5 puentes Chihuahua <b>Inversión:</b> 7.5 MDP C/IVA	<b>Tramo:</b> tramo del km 29+093 al km 59+822, del km 66+422 al km 66+828 <b>Inversión:</b> 7.5 MDP C/IVA	<b>Tramo:</b> Manifestación de Impacto Ambiental y de Cambio de Uso de Suelo Forestal, Chihuahua <b>Inversión:</b> 6.7 MDP C/IVA	<b>Tramo:</b> implementación y ejecución de medidas de mitigación de la Manifestación de Impacto Ambiental, Sonora <b>Inversión:</b> 14.0 MDP C/IVA	<b>Tramo:</b> implementación y ejecución de medidas de mitigación de la Manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad regional, Sonora <b>Inversión:</b> 10.5 MDP C/IVA

# Sonora/Chihuahua

## E.C. (Agua Prieta-Bavispe)-Pancho Villa-E.C. (Janos-Monte Verde)

Elemento44.9	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	19-12-25 al 25-12-25	
				Programado	Ejecutado
Ampliación: Tramo Sonora	18	84.71%	15.29%	0.8%	1.0%
Ampliación: Tramo Chihuahua	42	81.0%	19.0%	2.5%	1.0%
Construcción Puentes (Chihuahua)	5	55.15%	44.85%	2.42%	3.15%
Construcción Puentes (Sonora)	2	65.8%	34.2%	1.62%	4.4%

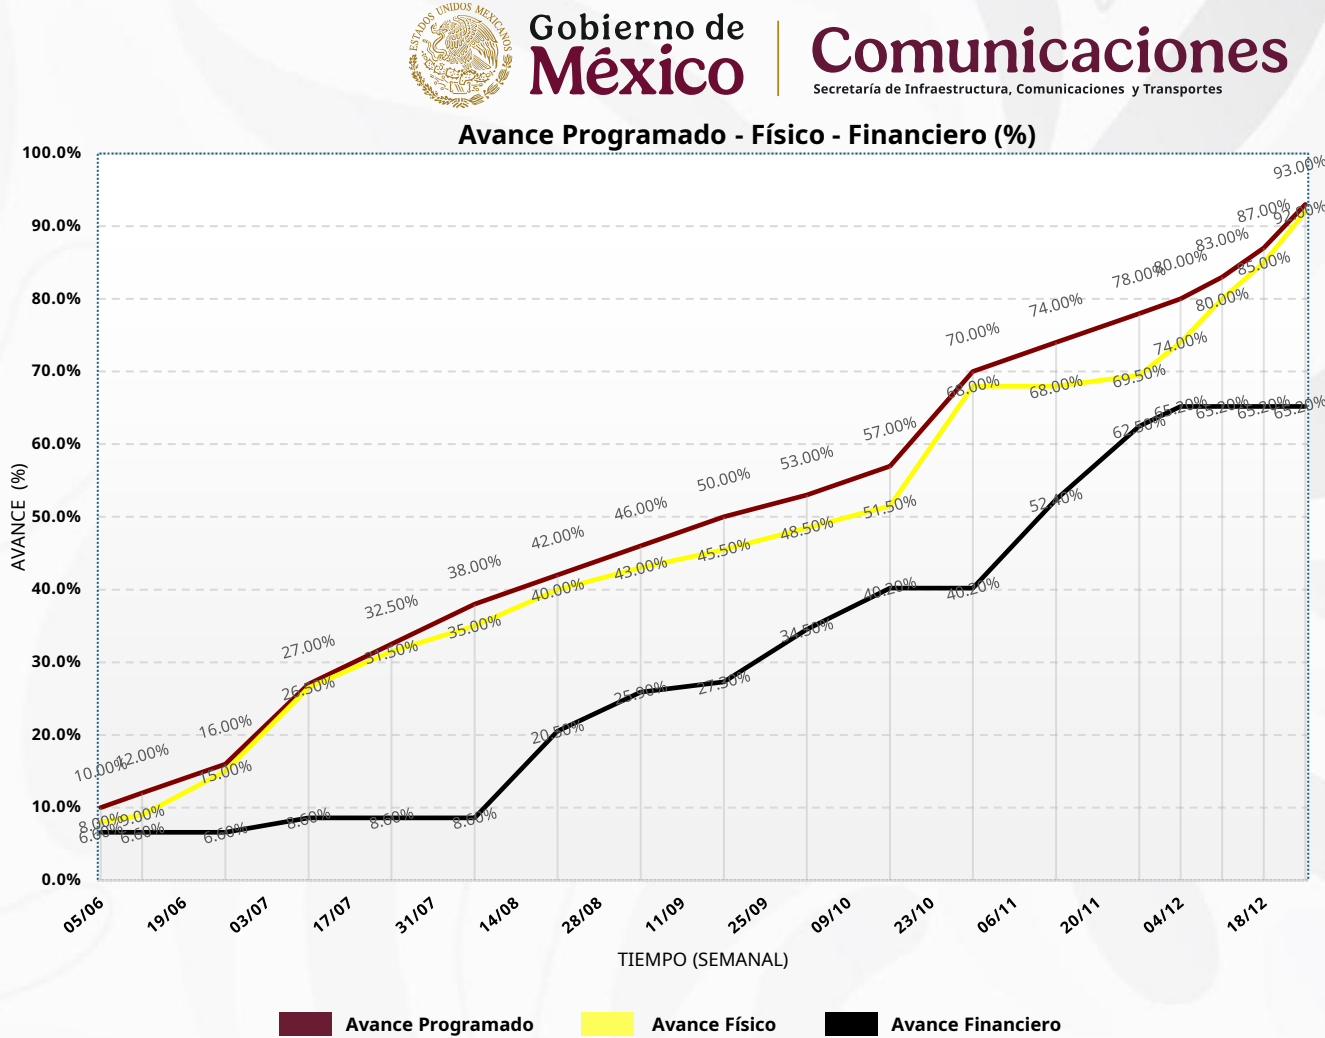

	12 de diciembre al 18 de diciembre	19 de diciembre al 25 de diciembre
Fuerza de Trabajo (personas)	840	840
Maquinaria	449	445
Frentes de trabajo	84	84
