

Tabasco-Campeche

Macuspana-Escárcega (Carretera Federal 186)

Tramo Tabasco



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance global

- Programado: 6.80%
- Real: 6.78%
- Semanal: 0.01%
- Financiero: 6.78%

Avance 2025

- Programado: 100.00%
- Real: 99.93%
- Semanal: 0.37%
- Financiero: 99.93%



Inversión total 2025-2028: 21,047 mdp

- **Tabasco:** 8,335 mdp
- **Campeche:** 11,483 mdp
- **Chiapas:** 1,229 mdp

Meta total 2025-2028: | 249 km |

Ampliación a 22 m (A4)

Tabasco • 92 km | Chiapas • 14 km | Campeche • 143 km



Inversión 2025: 1,431 MDP

- **Tabasco:** 1,141 mdp
- **Campeche:** 286 mdp

Meta 2025: Tabasco: 12 km , 1 entronque y 2 puentes,
Campeche: 4 km y 2 entronques



Inversión 2026: 3,749 MDP

- **Tabasco:** 3,749 mdp
- Meta 2026:** 40 km



Inicio: 16 de marzo de 2025

Término: Diciembre 2028

Término meta 2025: 15 de febrero de 2026



63,141 empleos generados



40 minutos de ahorro en tiempo



760 mil habitantes beneficiados

297 km longitud total
48 km Ampliados (A4)

Tabasco-Campeche

Macuspana-Escárcega (Carretera Federal 186)

Tramo Tabasco

Km 48+000 – km 60+000 y km 293+000 al 297+000

Elemento	Intervención	Unidad	Ejecutado	Faltante	23/01/2026 al 29/01/2026	
			acumulado		Programado	Ejecutado
Base Hidráulica	123,271.69	m³	123,271.69	0.00	8,690.81	200.20
Base Asfáltica	53,105.32	m³	51,727.52	1,377.80	4,279.80	884.50
Carpeta Asfáltica	40,454.83	m³	38,077.73	2,377.10	2,832.71	1,316.00
Riego de sello	265,193.53	m²	252,513.53	12,680.00	66,297.13	18,029.96
Obras complementarias	24.00	km	23.50	0.50	3.50	0.13
Señalamiento	26.40	km	21.00	5.40	4.10	10.00
Barrera central	11.87	km	9.66	2.21	0.20	0.50




Gobierno de
México

Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Macuspana - Escárcega

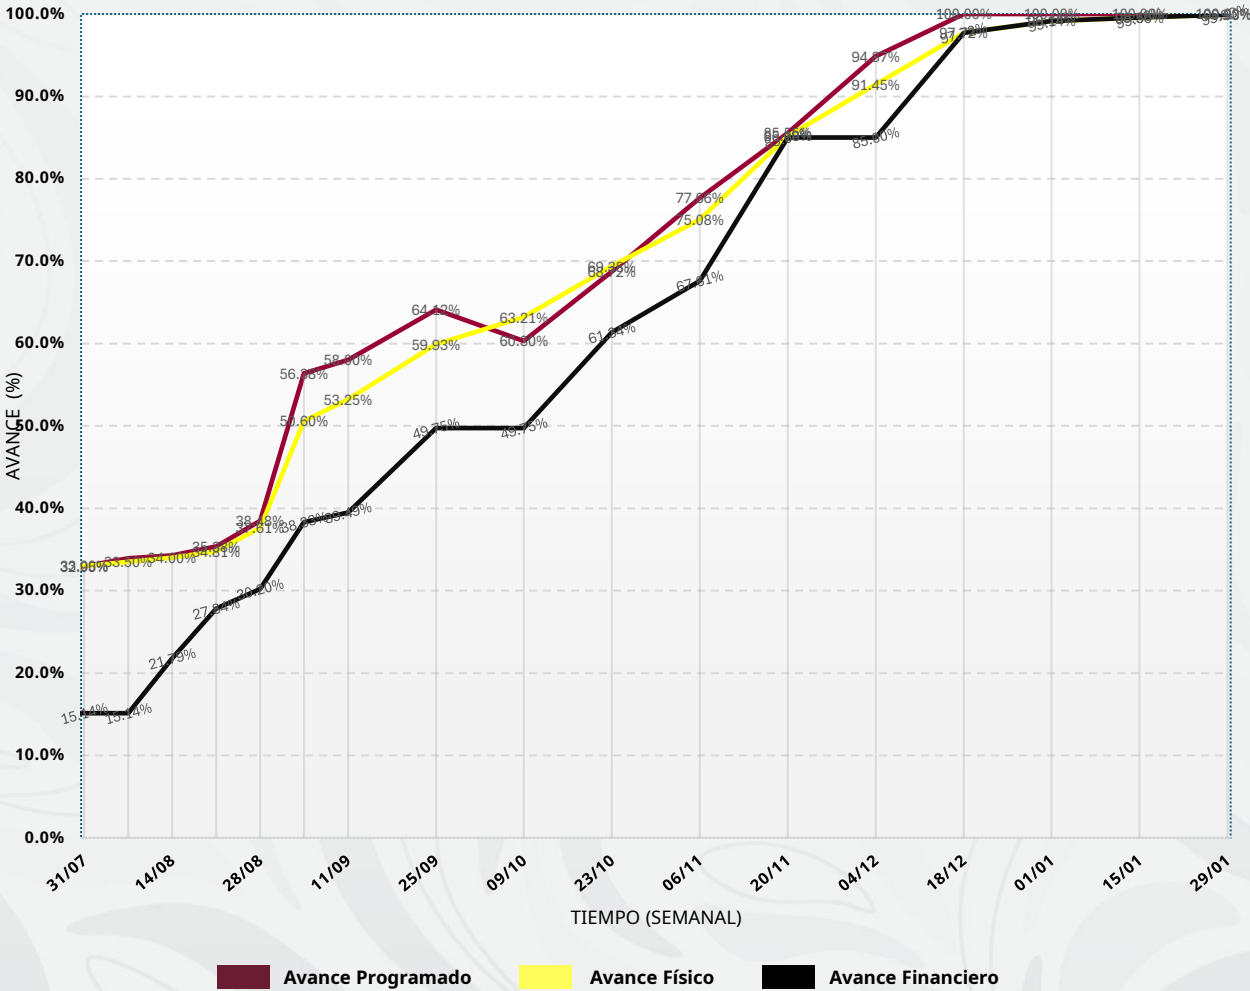

	16 de enero al 22 de enero	23 de enero al 29 de enero
Fuerza de Trabajo (personas)	347	288
Maquinaria	113	91
Frentes de trabajo	19	17
