

Sonora/Chihuahua

Camino Límite Estados Chihuahua/Sonora-Pancho Villa-E.C. (Janos-Monte Verde)



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

1.- Constructora URBATRAC, S.A. de C.V.

Meta: Km 0+000-km 11+000, incluye entronque km 0+000
Inversión: 324.6 MDP C/IVA

2.- ESMA Instalaciones, S.A. de C.V.

Meta: Km 11+000-km 18+093
Inversión: 306.2 MDP C/IVA

3.- INNOVACIONES INTELIGENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN,S.A DE C.V Y CMCO,S.A DE C.V

F. Km 6+900 Puente I, 122.0 m
G. Km 14+700 Puente II, 61.5 m

4.- CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PROYECTOS INTERESTATALES,S.A DE C.V

Por modernizar a nivel de pavimento a 7.0 m
Meta: Km 18+093 – km 29+093

5.- La CIMA Terraceros, S.A. de C.V. y Estructuras y Excavaciones JM, S.A. de C.V.

Meta: Km 29+093-KM 47+233
Inversión: 193.9 MDP C/IVA


6.- MERP Edificaciones y Terracerías, S.A. de C.V.

Meta: Km 47+233-Km 59+823 y Km 66+422-Km 66+829, incluye Boulevard y entronque a nivel.
Inversión: 179.4 MDP C/IVA

7.- Asfaltos y Triturados EL PUJAL, S.A. de C.V.

En proceso de construcción de 5 puentes:
A. Km 22+758 El Papalote, 30.0 m
B. Km 25+758 Los Pilares, 40.0 m
C. Km 33+832 Las Profesoras, 40.0 m
D. Km 36+682 La Enramada, 30.0 m
E. Km 38+362 La Pila, 120.0 m
Inversión: 122.5 MDP C/IVA

Avance físico • Programado: 80%
• Real: 74.0%
• Semanal: 4.5%
• Financiero: 65.2%

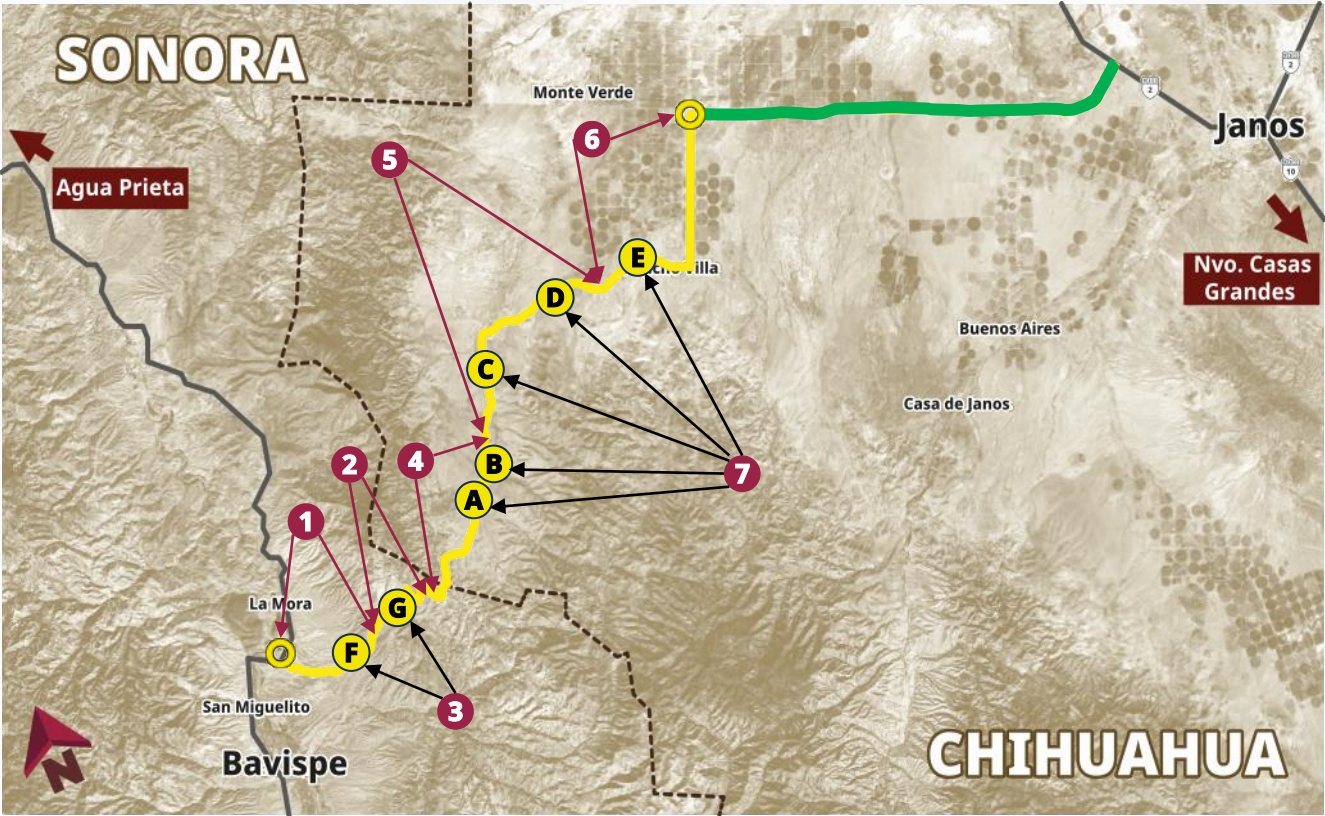

- Inversión total: 1,859 mdp**
Sonora: 774.5 mdp
Chihuahua: 1,084.5 mdp
- Inicio:** marzo, 2025
Término: 30 Enero de 2026
- Meta total:** 67 km y 7 puentes
• 6.6 km modernizados C, Chihuahua (se requiere trabajos complementarios)
- Meta pendiente:** 60.2 km y 7 puentes
Sonora
 - 18.1 km, ampliación C
 - 2 puentes (184 m)**Chihuahua**
 - 42.1 km, ampliación C
 - 5 puentes (320 m)
- 5,577** empleos generados
- 4,713** habitantes beneficiados
- 90 minutos** de ahorro en tiempo

S1.- CLAMI INGENIEROS, S.C	S2.- NEDOX, S.A DE C.V	S3.- JIDASA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V	S4.- GSM SUPERVISIÓN, PROYECTO E IMPACTO AMBIENTAL, S.A DE C.V	S5.- GRUPO SELOME, S.A. DE C.V	S6.- PROVEEDORA DE INGENIERIA, INSTALACION E INFRAESTRUCTURA, S.A DE C.V	S7.- GRUPO CORPOIIA, S.A. DE C.V.
Tramo: del km 0+000 al km 11+000, puente Sonora I en el km 6+900 Inversión: 6.1 MDP C/IVA	Tramo: del km 11+000 al km 18+093, puente Sonora II en el km 14+700 Inversión: 6.8 MDP C/IVA	Tramo: tramo del km 18+093 al km 29+093, 5 puentes Chihuahua Inversión: 7.5 MDP C/IVA	Tramo: tramo del km 29+093 al km 59+822, del km 66+422 al km 66+828 Inversión: 7.5 MDP C/IVA	Tramo: Manifestación de Impacto Ambiental y de Cambio de Uso de Suelo Forestal, Chihuahua Inversión: 6.7 MDP C/IVA	Tramo: implementación y ejecución de medidas de mitigación de la Manifestación de Impacto Ambiental, Sonora Inversión: 14.0 MDP C/IVA	Tramo: implementación y ejecución de medidas de mitigación de la Manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad regional, Sonora Inversión: 10.5 MDP C/IVA

Sonora/Chihuahua

E.C. (Agua Prieta-Bavispe)-Pancho Villa-E.C. (Janos-Monte Verde)


Elemento44.9	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	28-11-25 al 04-12-25	
				Programado	Ejecutado
Ampliación: Tramo Sonora	18	71.27%	28.73%	1.27%	2.57%
Ampliación: Tramo Chihuahua	42	68.81%	31.19%	3.48%	2.61%
Construcción Puentes (Chihuahua)	5	47.25%	52.75%	2.42%	7.06%
Construcción Puentes (Sonora)	2	51.6%	48.4%	1.03%	4.1%



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance: Programado Físico Financiero (%) Bavispe

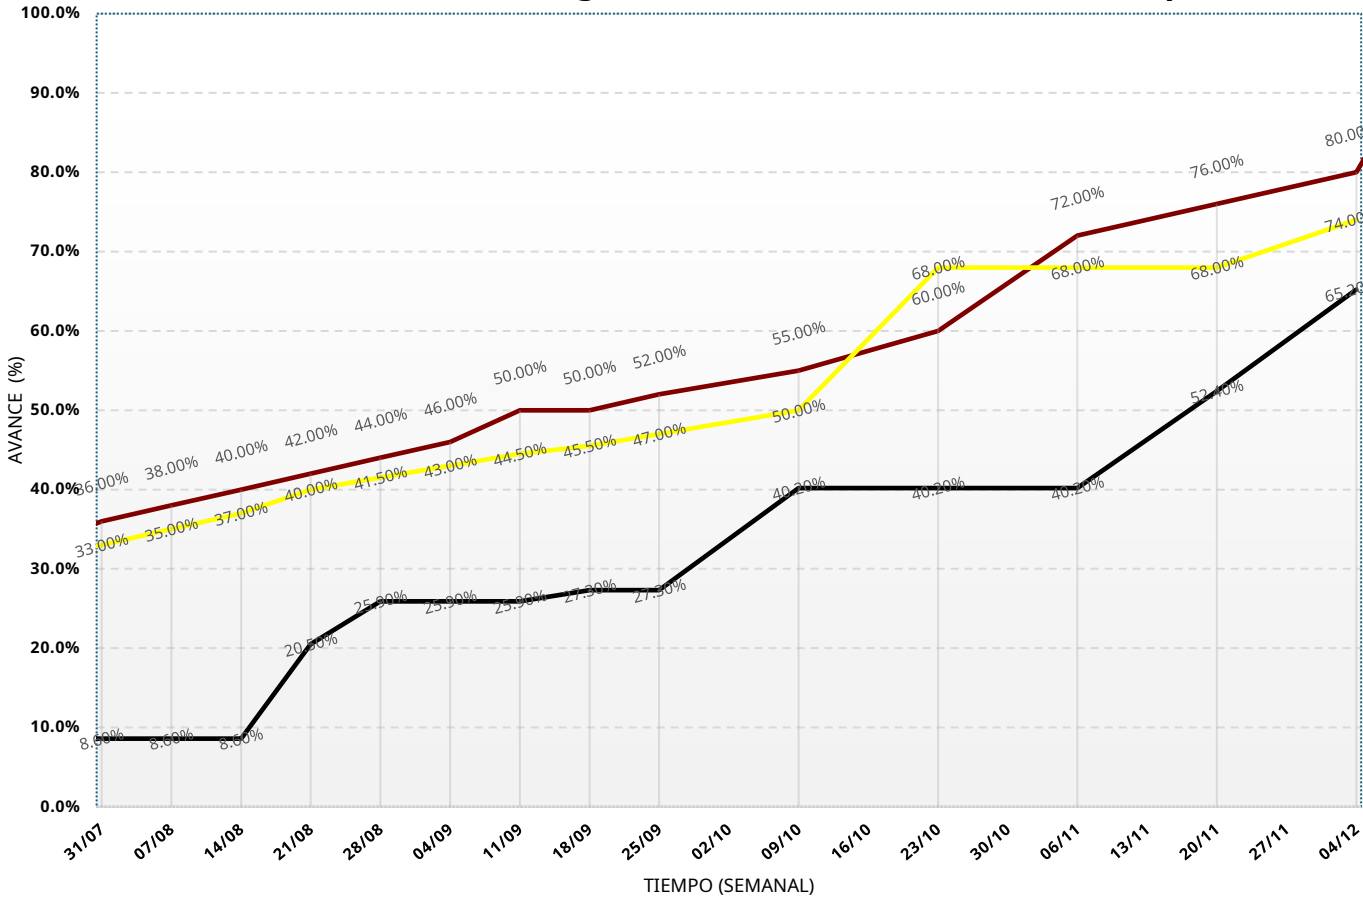

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	21 de noviembre al 27 de noviembre	28 de noviembre al 04 de diciembre
Fuerza de Trabajo (personas)	840	840
Maquinaria	444	448
Frentes de trabajo	93	92
