#### Guerrero - Puebla

### Eje Cuautla – Tlapa Ramal Igualapa - Chilixtlahuaca - Alacatlatzala



Avance global • Programado: 5.3%

• Real: 4.01%

1.- Edificaciones y Obras Civiles Romacal, S.A. de C.V. y Turboasfaltos, S.A. de C.V.

Meta: Km 35+340-km 41+000, incluve 1 puente Inversión: 110.6 MDP C/IVA

2.- Constructora ALICAT, S.A. de C.V., Constructora ERAGT Creación, S.A. de C.V., Construcciones Gracida y Asociados, S.A. de C.V. y CODEMAZATL, S.A. de C.V.

Meta: Km 41+000-km 46+600 km Inversión: 79.8 MDP C/IVA

> 3.- Construcción de Caminos y Proyectos Interestatales, S.A. de C.V.

Meta: Km 51+400-km 56+000 km Inversión: 71.7 MDP C/IVA

4.- Constructora ERAGT CREACIÓN, S.A. de C.V., Grupo Comercializador ELELVA, S.A. de C.V., DAHNA Constructores, S.A. de C.V. y Lizbeth Reyes Villa

Meta: Km 80+800 - km 85+800 Inversión: 82.11 MDP C/IVA

5.- Moisés Martínez Mendoza, Grupos CYRMA MART, S.A. de C.V.

Meta: Km 85+800 - km 90+800 Inversión: 76.41 MDP C/IVA

6.- Puentes e Ingeniería Especializada de Puebla, S.A. de C.V. PIEPSA y Grupo Tauro Ingeniería y Transportes, S.A. de C.V.

Meta: Km 90+800 - km 95+800 Inversión: 57.56 MDP C/IVA

#### S1.- Grupo CORPCIT, S.A. de C.V.

**Meta:** Km 35+340 – km 46+000 y Km 51+400 – Km

Inversión: 6.40 MDP C/IVA

• Semanal: 0.05%

Financiero: 1.93%

Avance 2025

Programado: 54.3%

Real: 47.30%

Semanal: 0.08%

Financiero: 25.95%





Meta total 2025-2029: 385km

Morelos: 25.60 km Puebla: 158.70 km

Guerrero: 201.16 km

**Meta 2025:** 33 km

Inversión total 2025-2029: 13.652 mdp.

- Morelos: 527 mdp

Puebla: 7,669 mdp

Guerrero: 5,456 mdp

Inicio: 16 de mayo 2025 Término: diciembre 2029 Termino meta 2025: diciembre



40,956 empleos generados




7,750 habitantes beneficiados



1 hora de ahorro en tiempo



Se beneficiará a una población de 7.750 habitantes de los municipios de Igualapa, Cochoapa el Grande, Metlatonoc y Malinaltepec, reduciendo tiempos de traslado.



Meta: Km 80+800 - km 95+800 Inversión: 5.95 MDP C/IVA

**Inversión 2025:** 960.0 mdp Guerrero: 810 mdp / 30.3 km Puebla: 150 mdp / 3 km

## **Guerrero - Puebla**


# Eje Cuautla – Tlapa Ramal Igualapa – Chilixtlahuaca - Alacatlatzala

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	19-09-25 al 25-09-25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	Observaciones
Trabajos preliminares (km)	30.90	0.00	0.0	0.0	0.0	Trabajos de topografía
Terracerías (km)	30.90	23.03	7.87	1.5	0.0	Desmonte -Despalme -Cortes Terraplenes
Obras de drenaje (Pza)	35	26	9	10	5	obras de drenaje
Pavimento (km)	30.9	0	30.9	0	0	-
Señalamient o (km)	30.9	0	30.9	0	0	-



#### Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

100.0%

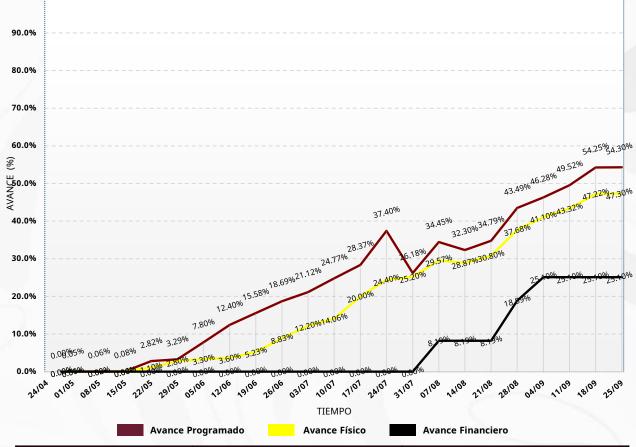

	12 al 18 de septiembre	19 al 25 de septiembre		
Fuerza de Trabajo (personas)	366	371		
Maquinaria	149	154		
