

Guerrero - Puebla

Eje Cuautla – Tlapa

Ramal Igualapa – Chilixtlahuaca - Alacatlatzala

Avance global

• Programado: 5.75%

• Real: 4.76%

Avance 2025

• Programado: 66.15%

• Real: 56.02%

• Semanal: 0.15%

• Financiero: 1.64%

• Semanal: 5.67%

• Financiero: 36.47%

1.- Edificaciones y Obras Civiles Romacal, S.A. de C.V. y Turboasfaltos, S.A. de C.V.
Meta: Km 35+340-km 41+000, incluye 1 puente Inversión: 110.6 MDP C/IVA
2.- Constructora ALICAT, S.A. de C.V., Constructora ERAGT Creación, S.A. de C.V., Construcciones Gracida y Asociados, S.A. de C.V. y CODEMAZATL, S.A. de C.V.
Meta: Km 41+000-km 46+600 km Inversión: 79.8 MDP C/IVA
3.- Construcción de Caminos y Proyectos Interestatales, S.A. de C.V.
Meta: Km 51+400-km 56+000 km Inversión: 71.7 MDP C/IVA
4.- Constructora ERAGT CREACIÓN, S.A. de C.V., Grupo Comercializador EELVA, S.A. de C.V., DAHNA Constructores, S.A. de C.V. y Lizbeth Reyes Villa
Meta: Km 80+800 – km 85+800 Inversión: 82.11 MDP C/IVA
5.- Moisés Martínez Mendoza, Grupos CYRMA MART, S.A. de C.V.
Meta: Km 85+800 – km 90+800 Inversión: 76.41 MDP C/IVA
6.- Puentes e Ingeniería Especializada de Puebla, S.A. de C.V. PIEPSA y Grupo Tauro Ingeniería y Transportes, S.A. de C.V.
Meta: Km 90+800 – km 95+800 Inversión: 57.56 MDP C/IVA
S1.- Grupo CORPCIT, S.A. de C.V.
Meta: Km 35+340 – km 46+000 y Km 51+400 – Km 56+000 Inversión: 6.40 MDP C/IVA





Meta total 2025-2029: 385km

- Morelos: 25.60 km

- Puebla: 158.70 km

- Guerrero: 201.16 km

Meta 2025: 33 km



Inversión total 2025-2029: 13.652 mdp.

- Morelos: 527 mdp

- Puebla: 7,669 mdp

- Guerrero: 5,456 mdp

Inversión 2025: 960.0 mdp

- Guerrero: 810 mdp / 30.3 km

- Puebla: 150 mdp / 3 km



Inicio: 16 de mayo 2025

Término: diciembre 2029

Termino meta 2025: diciembre



40,956 empleos generados



7,750 habitantes beneficiados



1 hora de ahorro en tiempo




Se beneficiará a una población de 7,750 habitantes de los municipios de Igualapa, Cochoapa el Grande, Metlatonoc y Malinaltepec, reduciendo tiempos de traslado.

Guerrero - Puebla

Eje Cuautla – Tlapa

Ramal Igualapa – Chilixtlahuaca - Alacatlalzala

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	10-10-25 al 16-10-25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Trabajos preliminares (km)	30.90	0.00	0.0	0.0	0.0	Trabajos de topografía
Terracerías (km)	30.90	23.09	7.81	1.0	0.2	Desmonte -Despalme -Cortes Terraplenes
Obras de drenaje (Pza)	35	27	8	3	1	obras de drenaje
Pavimento (km)	30.9	0	30.9	0	0	-
Señalamiento (km)	30.9	0	30.9	0	0	-

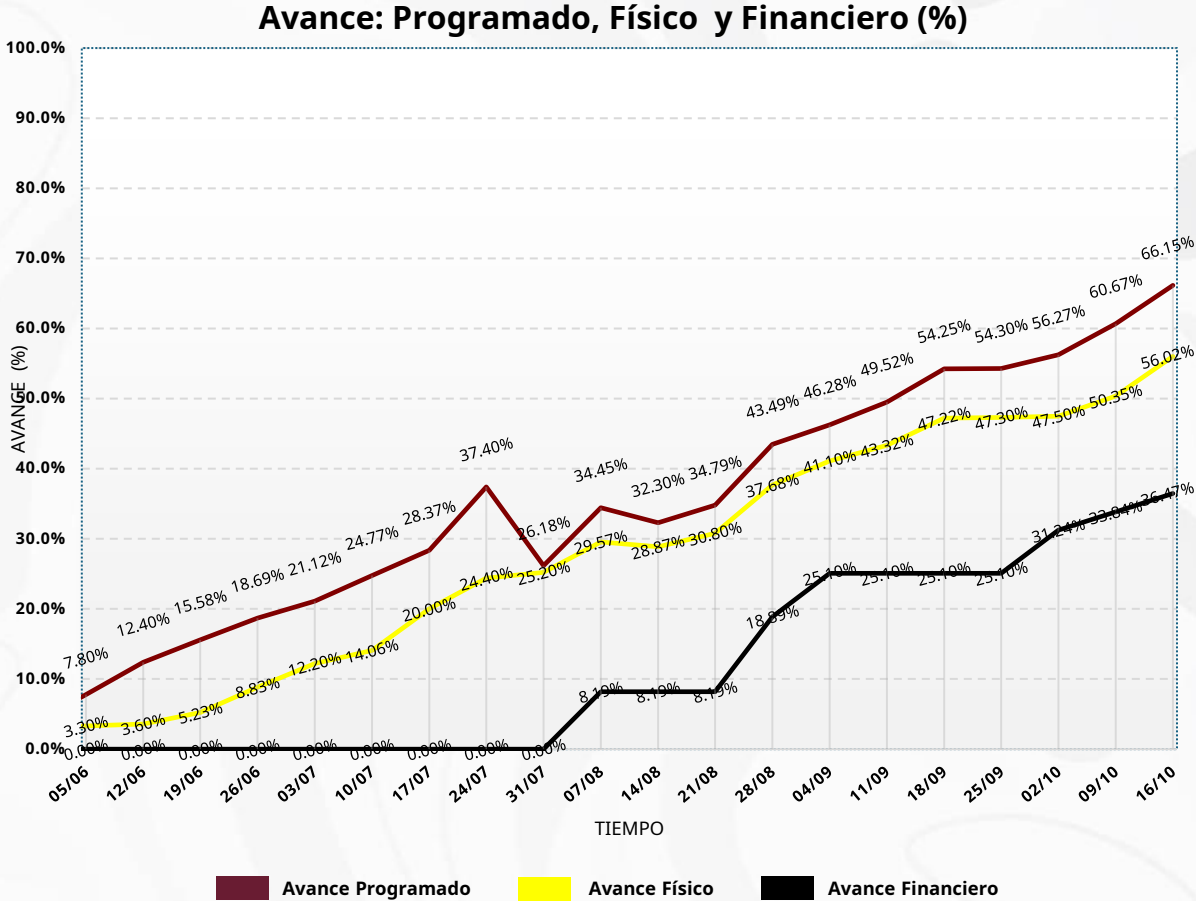

	03 al 09 de octubre	10 al 16 de octubre
Fuerza de Trabajo (personas)	352	348
Maquinaria	157	158
