

Sonora/Chihuahua

Camino Límite Estados Chihuahua/Sonora-Pancho Villa-E.C. (Janos-Monte Verde)



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

1.- Constructora URBATRAC, S.A. de C.V.

Meta: Km 0+000-km 11+000, incluye entronque km 0+000
Inversión: 324.6 MDP C/IVA

2.- ESMA Instalaciones, S.A. de C.V.

Meta: Km 11+000-km 18+093
Inversión: 306.2 MDP C/IVA

3.- INNOVACIONES INTELIGENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN,S.A DE C.V Y CMCO,S.A DE C.V

F. Km 6+900 Puente I, 122.0 m
G. Km 14+700 Puente II, 61.5 m

4.- CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PROYECTOS INTERESTATALES,S.A DE C.V

Por modernizar a nivel de pavimento a 7.0 m
Meta: Km 18+093 – km 29+093

5.- La CIMA Terraceros, S.A. de C.V. y Estructuras y Excavaciones JM, S.A. de C.V.

Meta: Km 29+093-KM 47+233
Inversión: 193.9 MDP C/IVA


6.- MERP Edificaciones y Terracerías, S.A. de C.V.

Meta: Km 47+233-Km 59+823 y Km 66+422-Km 66+829, incluye Boulevard y entronque a nivel.
Inversión: 179.4 MDP C/IVA

7.- Asfaltos y Triturados EL PUJAL, S.A. de C.V.

En proceso de construcción de 5 puentes:
A. Km 22+758 El Papalote, 30.0 m
B. Km 25+758 Los Pilares, 40.0 m
C. Km 33+832 Las Profesoras, 40.0 m
D. Km 36+682 La Enramada, 30.0 m
E. Km 38+362 La Pila, 120.0 m
Inversión: 122.5 MDP C/IVA

Avance físico • Programado: 72%
• Real: 68.0%
• Semanal: 0.0%
• Financiero: 40.2%

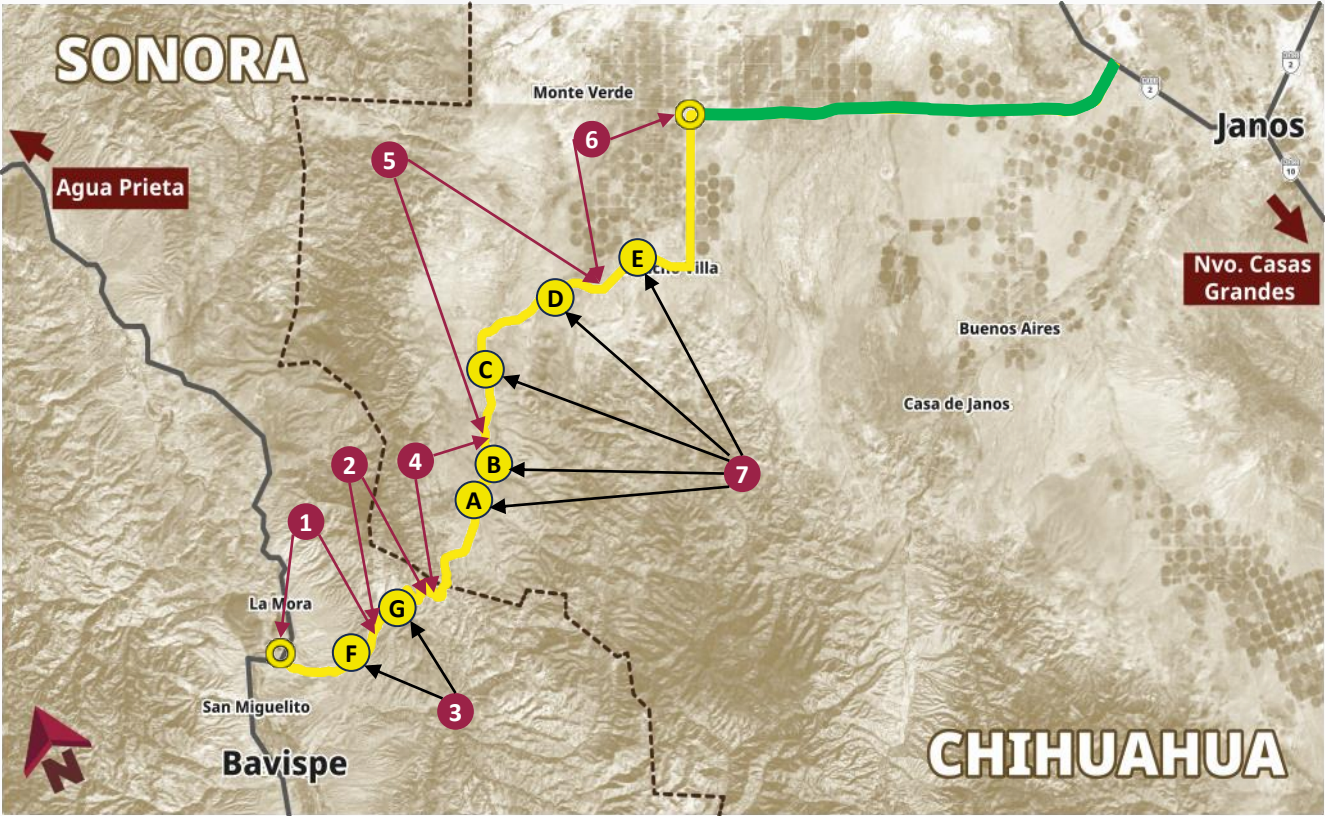

- Inversión total: 1,859 mdp**
Sonora: 774.5 mdp
Chihuahua: 1,084.5 mdp
- Inicio:** marzo, 2025
Término: 30 Enero de 2026
- Meta total:** 67 km y 7 puentes
• 6.6 km modernizados C, Chihuahua (se requiere trabajos complementarios)
- Meta pendiente:** 60.2 km y 7 puentes
Sonora
 - 18.1 km, ampliación C
 - 2 puentes (184 m)**Chihuahua**
 - 42.1 km, ampliación C
 - 5 puentes (320 m)
- 5,577** empleos generados
- 4,713** habitantes beneficiados
- 90 minutos** de ahorro en tiempo

S1.- CLAMI INGENIEROS, S.C	S2.- NEDOX, S.A DE C.V	S3.- JIDASA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V	S4.- GSM SUPERVISIÓN, PROYECTO E IMPACTO AMBIENTAL, S.A DE C.V	S5.- GRUPO SELOME, S.A. DE C.V	S6.- PROVEEDORA DE INGENIERIA, INSTALACION E INFRAESTRUCTURA, S.A DE C.V	S7.- GRUPO CORPOIIA, S.A. DE C.V.
Tramo: del km 0+000 al km 11+000, puente Sonora I en el km 6+900 Inversión: 6.1 MDP C/IVA	Tramo: del km 11+000 al km 18+093, puente Sonora II en el km 14+700 Inversión: 6.8 MDP C/IVA	Tramo: tramo del km 18+093 al km 29+093, 5 puentes Chihuahua Inversión: 7.5 MDP C/IVA	Tramo: tramo del km 29+093 al km 59+822, del km 66+422 al km 66+828 Inversión: 7.5 MDP C/IVA	Tramo: Manifestación de Impacto Ambiental y de Cambio de Uso de Suelo Forestal, Chihuahua Inversión: 6.7 MDP C/IVA	Tramo: implementación y ejecución de medidas de mitigación de la Manifestación de Impacto Ambiental, Sonora Inversión: 14.0 MDP C/IVA	Tramo: implementación y ejecución de medidas de mitigación de la Manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad regional, Sonora Inversión: 10.5 MDP C/IVA

Sonora/Chihuahua

E.C. (Agua Prieta-Bavispe)-Pancho Villa-E.C. (Janos-Monte Verde)


Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	31-10-25 al 06-11-25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Ampliación: Tramo Sonora	18	62.95%	37.05%	2.01%	2.85%	-
Ampliación: Tramo Chihuahua	42	59.53%	40.47%	2.35%	2.79%	• Aumentar turnos en las jornadas
Construcción Puentes (Chihuahua)	5	29.5%	70.5%	2.52%	1.27%	• Incrementar cuadrillas de trabajo y equipo para colado
Construcción Puentes (Sonora)	2	39.2%	60.8%	0.24%	2.5%	-



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

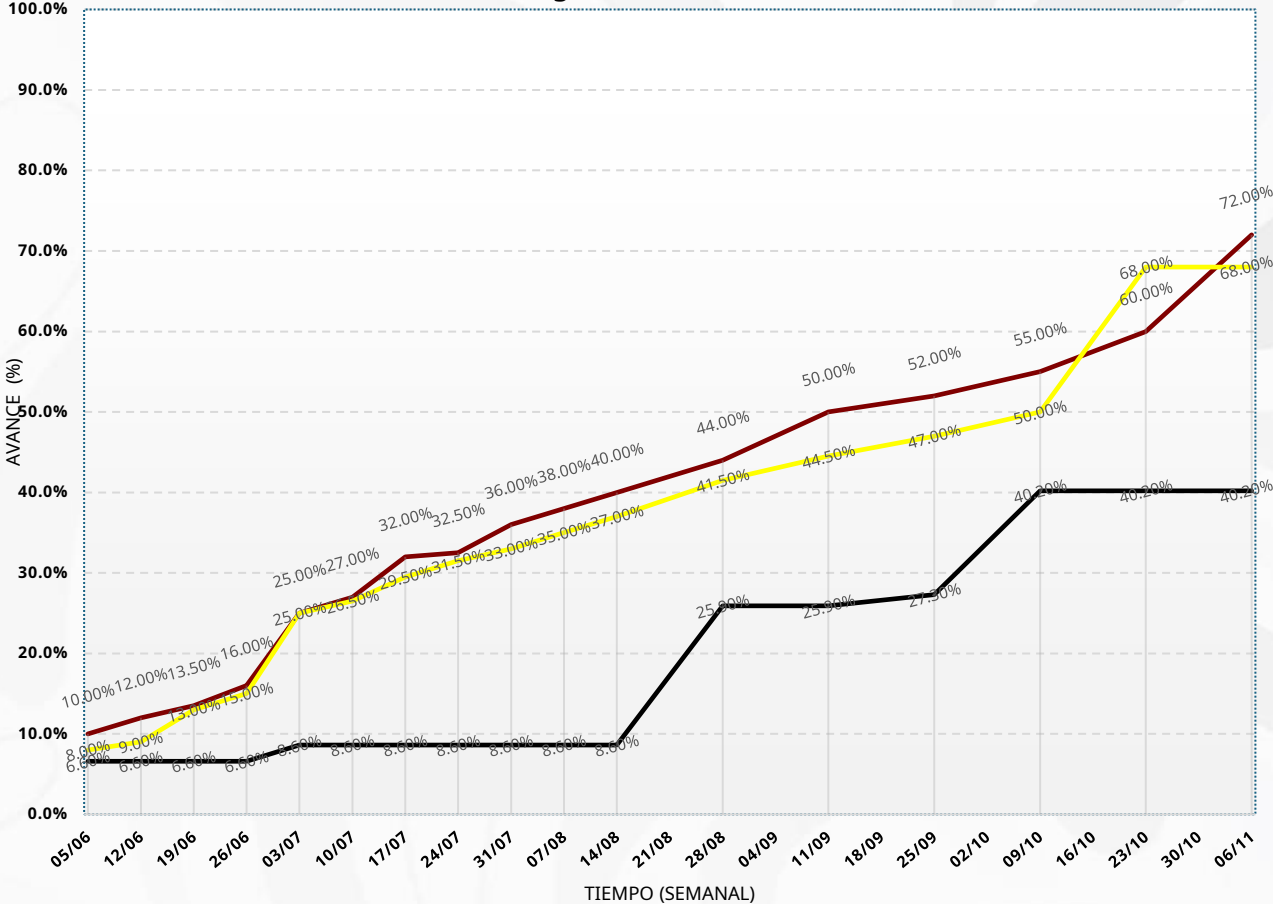

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	24 de octubre al 30 de octubre	31 de octubre al 06 de noviembre
Fuerza de Trabajo (personas)	783	785
Maquinaria	431	441
