

Guaymas – Esperanza – Yécora - Chihuahua



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance 2025

Avance Programado: 100.0 %
Avance Real: 96.65 %
Avance Financiero: 50.80 %

Avance 2026*

Avance Programado: 3.7 %
Avance Real: 1.91 %
Avance Financiero: 0.0 %

*Datos del contrato formalizado



Inversión total: 10,228 mdp

- Sonora: 5,935 mdp
- Chihuahua: 4,293 mdp

Meta total: 450 km

- Sonora: 252 km y 18 puentes
- Chihuahua: 198 km



Inversión 2025: 450 mdp

- Sonora: 450 mdp
- Meta 2025:** 10 km y 4 puentes
- Sonora: 10 km y 4 puentes



Inversión PEF 2026: 450.0 mdp (Son)

Meta 2026: 14.3 km (Son) (4.8 km contratados y 9.5 km en proceso de licitación)

Inversión VDG 2026: 3,550 mdp (Son)

Meta 2026: 87.5 km (Son)



Inicio : 20 de octubre de 2025

Termino: diciembre de 2029

2025

Inicio: 20 de octubre de 2025

Término: 15 de junio de 2026

2026*

Inicio: 01 de abril de 2026

Término: 29 de noviembre de 2026

*Datos del contrato formalizado



669,912 habitantes beneficiados

Beneficios:

- Derrama económica regional.
- Fortalecimiento de exportaciones.
- Impulso al crecimiento turístico.
- Mejora en los puntos de salida para la producción agropecuaria, manufacturera e industrial.



30,684 empleos generados




Guaymas – Esperanza – Yécora - Chihuahua

Km 17+300 al Km 27+200



Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	01-05-26 al 07-05-26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Trabajos preliminares (km)	9.97	9.97	-	-	-	-
Terracerías (km)	9.97	9.97	-	-	-	-
Obras de drenaje (Pza)	23	23	-	-	-	-
Pavimento (km)	9.97	8.17	1.80	0.0	0.0	-
Señalamiento (km)	9.97	8.0	1.97	0.0	0.0	-
Construcción Puente I (Canal alto)	100%	94.15%	5.85%	0.15%	0.15%	-
Construcción Puente II (Agua Caliente)	100%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-
Construcción Puente III (Chinitos I)	100%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-
Construcción Puente IV (Chinitos II)	100%	100.00%	0.00%	3.00%	0.00%	-

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

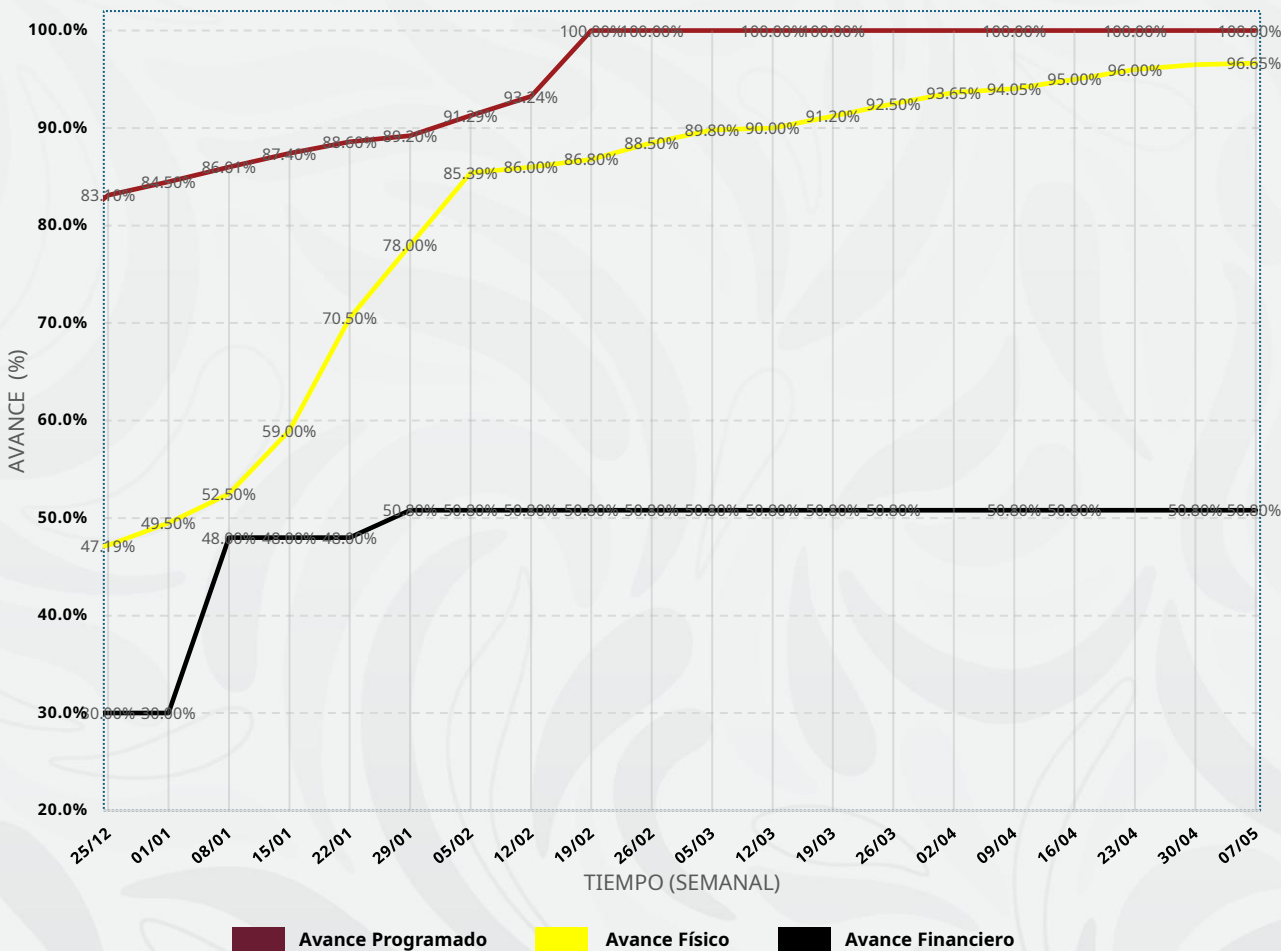

	24 de abril al 30 de abril 2026	01 de mayo al 07 de mayo 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	80	70
Maquinaria	20	10
Frentes de trabajo	6	4
