



Tabasco-Campeche

Macuspana-Escárcega (Carretera Federal 186)

Tramo Tabasco

Avance global

- Programado: 6.92%
- Real: 6.92%
- Semanal: 0.00%
- Financiero: 6.92%

Avance 2026

- Programado: 0.93%
- Real: 0.95% (1.0%)
- Semanal: 0.05%
- Financiero: 0.95%



Inversión total 2025-2028: 21,047 mdp

- **Tabasco:** 8,335 mdp
- **Campeche:** 11,483 mdp
- **Chiapas:** 1,229 mdp

Meta total 2025-2028: | 249 km |

Ampliación a 22 m (A4)

Tabasco • 92 km | Chiapas • 14 km | Campeche • 143 km



Inversión 2025: 1,429 MDP

- **Tabasco:** 1,145 mdp
- **Campeche:** 284 mdp

Meta 2025:

- **Tabasco:** 12 km y 2 puentes
- **Campeche:** 4 km y 2 entronques



Inversión 2026: 3,749 MDP

- **Tabasco:** 3,109 mdp
- **Campeche:** 640 mdp

Meta 2026:

- **Tabasco:** 26 km, 1 PSV y 2 puentes
- **Campeche:** 6 km



Inicio: 16 de marzo de 2025

Término: Diciembre 2029

Término meta 2025: 28 de febrero de 2026



63,141 empleos generados



760 mil habitantes beneficiados



40 minutos de ahorro en tiempo


Beneficios Incrementaría la capacidad de la vía, mejora el nivel de servicio, reduce los costos de operación vehicular y los tiempos de recorrido de los usuarios, así como el riesgo de accidentes.

Tabasco-Campeche

Macuspana-Escárcega (Carretera Federal 186)

Tramo Tabasco

Elemento	Unidad	Intervención total	Ejecutado	Faltante	17/04/2026 al 23/04/2026	
			acumulado		Programado	Ejecutado
Desmonte	ha	27.92	26.13	1.79	2.18	0.19
Despalme	m³	115,589.04	104,198.83	11,390.21	11,453.30	1,805.73
Escalones de Liga	m³	20,122.39	17,049.02	3,073.37	2,137.10	1,558.26
Cortes	m³	114,909.49	70,963.51	43,945.98	14,903.35	4,049.42
Pedraplén	m³	151,364.26	117,877.64	33,486.62	13,128.09	9,034.89
Geotextil	m²	159,125.66	85,488.06	73,637.60	10,279.43	10,015.60
Geomalla	m²	173,510.17	99,908.75	73,601.42	7,404.66	11,477.20
Terraplén	m³	320,776.23	139,899.26	180,876.97	6,447.77	15,956.00
Subyacente	m³	132,720.47	54,943.94	77,776.53	1,169.03	9,740.68
Subrasante	m³	67,539.93	12,467.88	55,072.05	227.30	6,323.98
Obras de drenaje	pza	95.00	27.00	68.00	17.00	6.00
Columnas de 1.20 m de diámetro	pza	66.00	26.00	40.00	3.80	4.00
Trabes Aashto IV de 1.35 m x 30.60 m (fabricación)	pza	102.00	20.00	82.00	3.50	4.00
Escamas de concreto en muros	m²	6,948.35	804.74	6,143.61	0.00	714.74

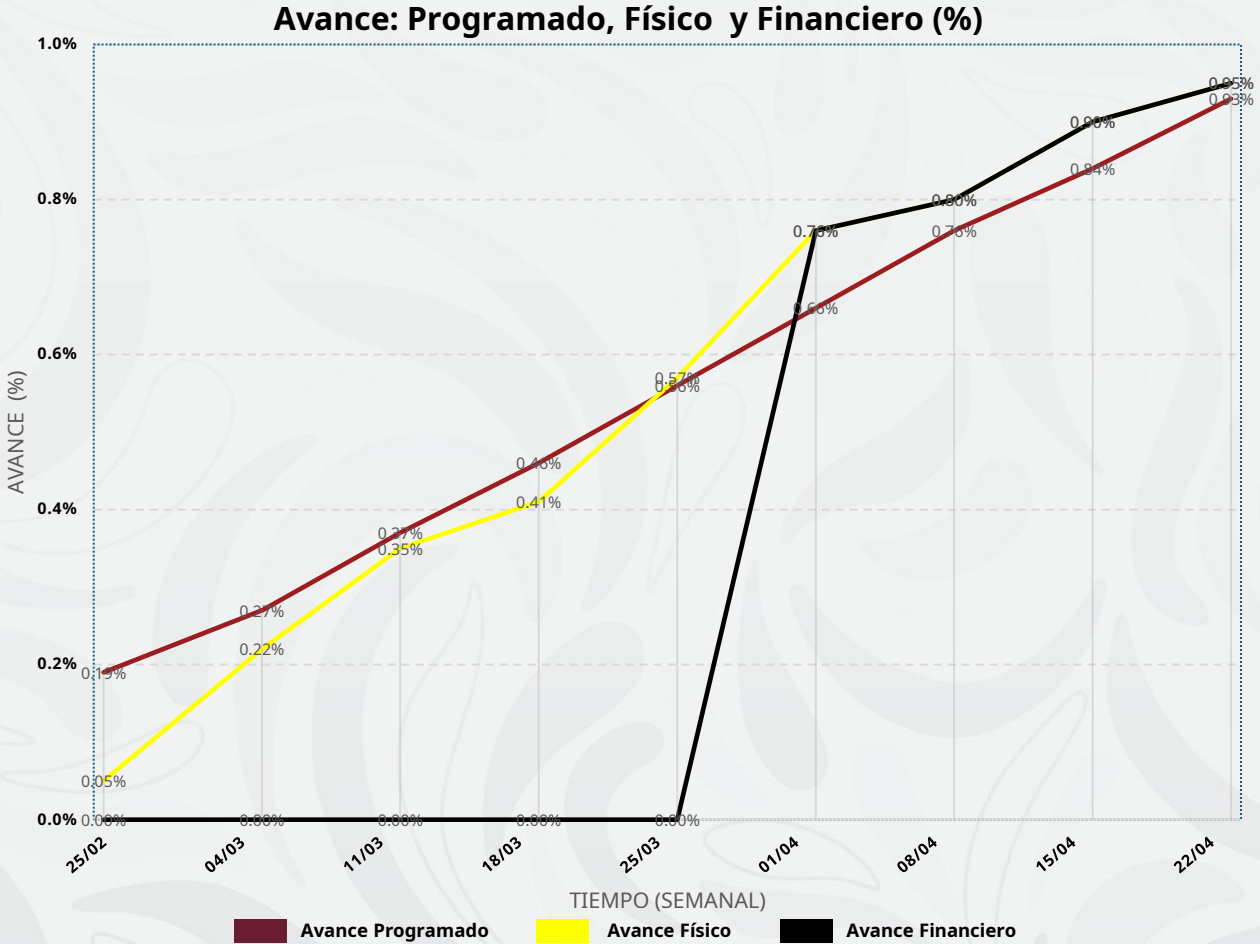

	10 de abril al 16 de abril	17 de abril al 23 de abril
Fuerza de Trabajo (personas)	460	475
Maquinaria	128	145
Frentes de trabajo	37	33
