

Tabasco-Campeche

Macuspana-Escárcega (Carretera Federal 186)

Del km 60+000 al km 86+000 y del km 287+000 al 293+000

ACTUALIZADA 16/06/2026



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance global

- Programado: 9.08%
- Real: 8.94%
- Semanal: 1.00%
- Financiero: 7.19%

Avance 2026

- Programado: 13.60%
- Real: 12.47%
- Semanal: 1.50%
- Financiero: 5.65%



Inversión total 2025-2030: 21,062.8 mdp

Tabasco: 4,618 mdp | Campeche: 11,517.8 mdp | Chiapas: 4,927 mdp

Meta total 2025-2030: 249 km

Tabasco • 44 km | Campeche • 143 km | Chiapas: 62 km



Inversión 2025: 1,429 MDP

Tabasco: 1,145 mdp | Campeche: 284 mdp

Meta 2025:

Tabasco: 12 km y 2 puentes | Campeche: 4 km y 2 entronques



Inversión total 2026: 5,254 MDP

Tabasco: 3,126 mdp | Campeche: 1,718 mdp | Chiapas: 410 mdp

Meta total 2026: 54 km

Tabasco: 28.5 km | Campeche: 20 km | Chiapas: 5.5 km

Inversión PEF 2026: 3,493 MDP

Tabasco: 2,939 mdp | Campeche: 554 mdp

Meta PEF 2026: 32 km

Tabasco: 26 km | Campeche: 6 km

Inversión VDG 2026: 1,761 MDP

Tabasco: 186 mdp | Campeche: 1,165 mdp | Chiapas: 410 mdp

Meta PEF 2026: 22 km

Tabasco: 2.5 km | Campeche: 14 km | Chiapas: 5.5 km



Inicio: 16 de marzo de 2025

Término: Diciembre 2030

Término meta 2026: 31 de diciembre de 2026



63,189 empleos generados



760 mil habitantes beneficiados



40 minutos de ahorro en tiempo

Beneficios Incrementaría la capacidad de la vía, mejora el nivel de servicio, reduce los costos de operación vehicular y los tiempos de recorrido de los usuarios, así como el riesgo de accidentes.

Tabasco-Campeche

Macuspana-Escárcega (Carretera Federal 186)

Del km 60+000 al km 68+000 y del km 287+000 al 293+000



Comunicaciones


Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

ACTUALIZADA 16/06/2026

Km 60+000 al km 86+000 y Km 287+000 al Km 293+000						
Elemento	Unidad	Intervención total	Ejecutado acumulado	Faltante	05/06/2026 al 11/06/2026 Programado	Ejecutado
Desmonte	ha	71.20	55.77	15.43	2.35	2.35
Despalme	m³	162,476.70	136,400.39	26,076.31	11,336.03	11,336.03
Escalones de liga	m³	32,005.29	13,430.75	18,574.54	70.11	70.11
Cortes	m³	414,403.47	274,022.04	140,381.43	64,549.90	64,549.90
Pedraplén	m³	322,585.30	215,360.45	107,224.85	51,473.54	51,473.54
Terraplén	m³	705,242.64	236,411.47	468,831.17	38,314.52	38,314.52
Subyacente	m³	349,477.94	123,460.20	226,017.74	9,370.12	9,370.12
Subrasante	m³	173,824.24	54,976.72	118,847.52	6,637.82	6,637.82
Base Hidráulica	m³	239,655.30	40,122.58	199,532.72	6,028.86	6,028.86
Base Asfáltica	m³	102,264.85	4,714.73	97,550.12	2,467.36	2,467.36
Carpeta Asfáltica	m³	83,172.17	0.00	83,172.17	0.00	0.00
Riego de sello	m²	673,185.24	0.00	673,185.24	0.00	0.00
Obras de drenaje	pzs	141.00	46.60	94.40	2.40	2.40
Obras complementarias	km	38.71	0.00	38.71	0.00	0.00
Barreras centrales	km	14.79	0.00	14.79	0.00	0.00
Señalamiento vertical y horizontal	km	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00

PSV “El Tortuguero” km 53+620, Puente “El Pechocho” y Puente “La Calzada”						
Elemento	Unidad	Intervención total	Ejecutado acumulado	Faltante	05/06/2026 al 11/06/2026 Programado	Ejecutado
Pilotes de 1.20 m de diámetro	pzs	107.00	44.00	63.00	7.00	7.00
Columnas de 1.20 m de diámetro	pzs	72.00	30.00	42.00	0.00	0.00
Cabezales	pzs	15.00	5.00	10.00	0.00	0.00
Fabricación de Trabes AASHTO III, IV y VI	pzs	108.00	56.00	52.00	0.00	0.00
Transporte y montaje de Trabes AASHTO III, IV y VI	pzs	108.00	56.00	52.00	14.00	14.00
Diafragmas	pzs	386.00	130.00	256.00	0.00	0.00
Losas de calzada	Claros	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00
Guarnición	m	277.37	0.00	277.37	0.00	0.00
Parapeto metálico	m	470.66	0.00	470.66	0.00	0.00

NOTA: Se ajustaron y unificaron los volúmenes de acuerdo a los nuevo tramos en ejecución en Tabasco y Campeche

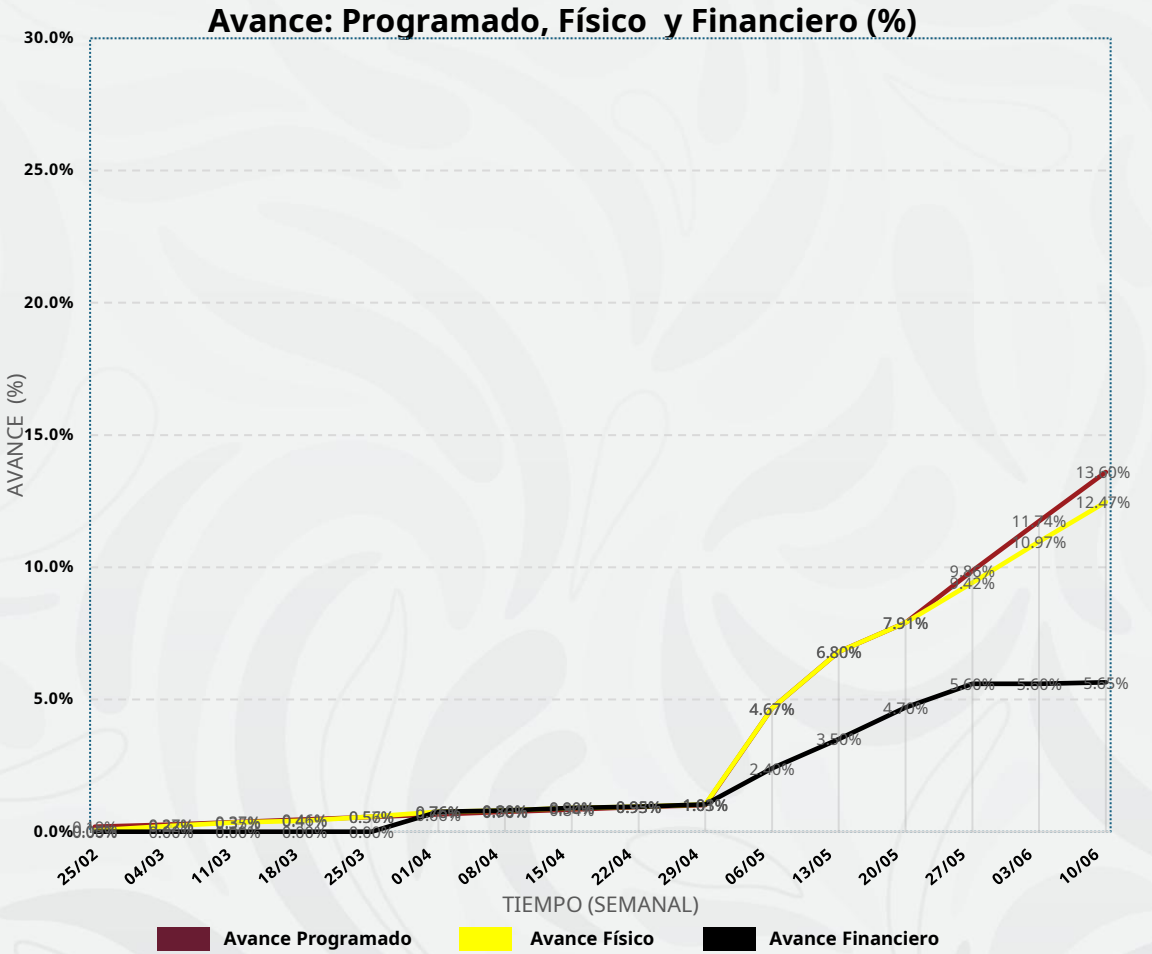

	29 de mayo al 04 de junio	05 al 11 de junio
Fuerza de Trabajo (personas)	627	706
Maquinaria	256	279
Frentes de trabajo	51	51
